

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

4 RUE DE LA FONTAINE LGT 0

0

77780 BOURRON MARLOTTE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

|                      |                      |                |                                                      |
|----------------------|----------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| Nature du bâtiment : | LOGEMENTS COLLECTIFS | Adresse :      | 4 RUE DE LA FONTAINE LGT 0<br>77780 BOURRON MARLOTTE |
| Cat. Du bâtiment :   |                      | Bâtiment :     |                                                      |
| Etage :              |                      | Porte :        | 0                                                    |
| Ref Cadastrale :     | NC                   | Propriété de : | OPH77<br>10 AVENUE CHARLES PEGUY<br>77000 MELUN      |

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

|           |                                        |                            |  |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------|--|
| Nom :     | OPH77                                  | Documents remis :          |  |
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY<br>77000 MELUN | Moyens mis à disposition : |  |

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

|                         |                                                           |                                         |                                                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAPPORT N° :            | 130PAA0000                                                | Laboratoire d'Analyses :                | ITGA                                                                                       |
| Repérage réalisé le :   | 14/12/2017                                                | Adresse laboratoire :                   | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537<br>35065 RENNES CEDEX                               |
| Accompagnateur :        |                                                           | Numéro d'accréditation :                | 1-5967                                                                                     |
| Par :                   | Alain LEITE LOPES                                         | Organisme d'assurance professionnelle : | ALLIANZ                                                                                    |
| N° certificat :         | C023-SE04-2017                                            | Adresse assurance :                     | Direction Opérations Entreprises<br>5C Esplanade Charles de Gaulle<br>33081 BORDEAUX CEDEX |
| Date d'obtention :      | 24/08/2017                                                | N° de contrat d'assurance :             | 55897385                                                                                   |
| Organisme certificateur | QUALIT'COMPETENCES<br>16 rue Willars - 52100<br>THONVILLE | Date de validité :                      | 31/12/2017                                                                                 |

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 23/12/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Alain LEITE LOPES**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

|                                                                                                   |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| A \ INFORMATIONS GENERALES .....                                                                  | 2                           |
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....                                                               | 2                           |
| A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....                                                        | 2                           |
| A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....                                                                | 2                           |
| B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....                                                                | 2                           |
| C\ SOMMAIRE .....                                                                                 | 3                           |
| D\ CONCLUSIONS .....                                                                              | 4                           |
| E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....                                                                   | 4                           |
| F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....                                                   | 6                           |
| G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....                                                                      | Erreur ! Signet non défini. |
| H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....                                                         | 6                           |
| ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES .....                                  | 9                           |
| ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....                                           | Erreur ! Signet non défini. |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....                                                         | 11                          |
| ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....                                             | Erreur ! Signet non défini. |
| 1. Informations générales .....                                                                   | Erreur ! Signet non défini. |
| a) Dangereusité de l'amiante .....                                                                | Erreur ! Signet non défini. |
| b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....             | Erreur ! Signet non défini. |
| 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail .....                | Erreur ! Signet non défini. |
| 3. Recommandations générales de sécurité .....                                                    | Erreur ! Signet non défini. |
| 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante .....                                               | Erreur ! Signet non défini. |
| a. Conditionnement des déchets .....                                                              | Erreur ! Signet non défini. |
| b. Apport en déchèterie .....                                                                     | Erreur ! Signet non défini. |
| c. Filières d'élimination des déchets .....                                                       | Erreur ! Signet non défini. |
| d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante ..... | Erreur ! Signet non défini. |
| e. Traçabilité.....                                                                               | Erreur ! Signet non défini. |
| ATTESTATION(S) .....                                                                              | Erreur ! Signet non défini. |
| CERTIFICAT DE QUALIFICATION .....                                                                 | 13                          |

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante**

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF<br>LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|---------------------------|----------|-------------|---------|------|----------|
| NEANT |       |          |                           |          |             |         |      |          |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

| PIECE | ETAGE | STATUT DE VISITE |
|-------|-------|------------------|
| NEANT |       |                  |

*Liste des éléments non inspectés et justification*

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | REPERAGE | RESULTAT |
|-------|-------|----------|----------|----------|
| NEANT |       |          |          |          |

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

| PIECES<br>CONCERNEES | PERIMETRE<br>DU<br>REPERAGE | REPERAGE | TRAVAUX  | ELEMENTS | Echantillonnage | REMARQUES<br>PARTICULIERES |
|----------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------------------------|
|                      | LOGEMENTS<br>COLLECTIFS     |          | Selon BT |          |                 |                            |

| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                          |                                    | PAGE N° 1             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b><br>OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77<br>AGENCE DE NEMOURS<br>5 Square Beauregard<br>77140 NEMOURS<br>Tél : 01.64.28.41.57 Fax : 01.64.28.42.02<br>Siret : 277 700 019 00015 |                                                                                                         | <b>BON DE TRAVAUX</b> N° 2017 28472                                                                      |                                    |                       |
| <b>Réf. fournisseur</b> F / 5149<br><b>Marché n°</b> 2017 4478 1<br><b>Provenance</b> NEMOURS<br><b>Objet</b> ENTRETIEN                                                                                       |                                                                                                         | <b>EXPERT HABITAT INGENIERIE</b><br>21 RUE D'ALBERT<br>62450 AVESNES LES BAPAUME<br>Téléphone 0321734144 |                                    |                       |
| <b>SERVICE</b> NEMOURS Techniciens                                                                                                                                                                            |                                                                                                         | <b>ÉMETTEUR</b> TAHIRI FATIHA                                                                            |                                    |                       |
| <b>LOCALISATION</b> Programme 130 BOURRON MARLOTTE - FONTAINE SEGRETZ<br>Tranche 1 Ensemble A005 Escalier AA Étage 00 Logement 0 Module 130PAA0000<br>Retrait des clés CHEZ LE LOCATAIRE                      |                                                                                                         |                                                                                                          |                                    |                       |
| <b>ADRESSE</b> M OU MME BARNIER JEAN PIERRE ET MADELINE<br>4 RUE DE LA FONTAINE SEGRETZ 77730 BOURRON MARLOTTE Tél. personnel 0154457624                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                          |                                    |                       |
| <b>DÉLAI D'EXECUTION</b> 15 JOURS <b>PÉRIODE DU</b> 05/12/2017 <b>AU</b> 22/12/2017                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                          |                                    |                       |
| <b>ARTICLE</b>                                                                                                                                                                                                | <b>DÉSIGNATION</b>                                                                                      | <b>QUANTITÉ</b>                                                                                          | <b>PRIX UNITAIRE H.T.</b>          | <b>TOTAL H.T.</b>     |
| AMIS2                                                                                                                                                                                                         | REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX<br>D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS + DE<br>LOCATAIRE 01.64.45.78.24 | 1,00                                                                                                     | 5,00                               | 5,00                  |
| AMIS3                                                                                                                                                                                                         | ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MOLF<br>ANALYSE DE 11 A 60 PRELEVEMENTS ISSUS<br>SOL CHAMBRE           | 1,00                                                                                                     | 25,00                              | 25,00                 |
| <b>TOTAL H.T.</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                          |                                    | 30,00                 |
| <b>H.T. ACTUALISE</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                          |                                    |                       |
| <b>COEFFICIENT REGIONAL</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                          |                                    |                       |
| <b>RABAIS</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                          |                                    |                       |
| <b>TOTAL H.T.</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                          |                                    |                       |
| <b>T.V.A.</b> 20,00 %                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                          |                                    | 6,00                  |
| <b>TOTAL T.T.C.</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                          |                                    | 36,00                 |
| <b>AFFECTATION BUDGETAIRE</b> <b>CODES STRUCTURE ET SCHEMA :</b> ENTLOX                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                          |                                    |                       |
| <b>CODE BUDGET</b>                                                                                                                                                                                            | <b>RUBRIQUE</b>                                                                                         | <b>INSTANCES</b>                                                                                         | <b>LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE</b> | <b>MONTANT T.T.C.</b> |
| 1 HONAMIA                                                                                                                                                                                                     | A760                                                                                                    | NEM SN                                                                                                   | HONORAIRES DIAG AMIANTE            | 36,00                 |
| <b>AFFECTATION ANALYTIQUE</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                          |                                    |                       |
| <b>CODE BUDGET</b>                                                                                                                                                                                            | <b>RÉFÉRENCES PATRIMOINE</b>                                                                            | <b>RÉFÉRENCES OCCUPANT</b>                                                                               | <b>MONTANT T.T.C.</b>              |                       |
| 1 HONAMIA                                                                                                                                                                                                     | ESG 1 A000 AA 130PAA0000                                                                                | L7000237 BARNIER JEAN PIERRE ET MADE                                                                     | 36,00                              |                       |
| Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2017 28472                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                          |                                    |                       |
| ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                          |                                    |                       |

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 130PAA0000 14/12/2017

Date d'édition : 23/12/2017

5/15

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

| PIECE       | ETAGE | JUSTIFICATION | VISITE | TRAVAUX   |
|-------------|-------|---------------|--------|-----------|
| Cuisine     |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Salle d'eau |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| WC          |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Séjour      |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Chambre 1   |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Chambre 2   |       |               | OUI    | CONCERNEE |

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| PIECE       | MUR1     | MUR2     | MUR3 | MUR4 | PLANCHER BAS | PLANCHER HAUT     | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|-------------|----------|----------|------|------|--------------|-------------------|--------|----------|----------|
| Cuisine     | Béton    | Mâchefer |      |      | Carrelage    | Peinture          |        |          |          |
| Salle d'eau | Béton    | Mâchefer |      |      | Carrelage    | Peinture          |        |          |          |
| WC          | Mâchefer | Béton    |      |      | Carrelage    | Peinture          |        |          |          |
| Séjour      | Béton    | Mâchefer |      |      | Carrelage    | Peinture          |        |          |          |
| Chambre 1   | Béton    | Mâchefer |      |      | Sol souple   | Peinture          |        |          |          |
| Chambre 2   | Béton    | Mâchefer |      |      | Sol souple   | Dalle Polystyrène |        |          |          |

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------|-------|----------|------------------------|-------------|----------|------|----------|---------|
| NEANT |       |          |                        |             |          |      |          |         |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|------------------------|-------------|----------|------|----------|
| NEANT |       |          |                        |             |          |      |          |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

| PIECE     | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF LABORATOIRE   | Echantillon    | REPERAGE | ETAT                  | RESULTAT    | METHODE          |
|-----------|-------|-------------------|--------------------------|----------------|----------|-----------------------|-------------|------------------|
| Chambre 1 |       | Revêtement souple | Revêtement souple marron | 130PAA0000P001 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non | RESULTAT ANALYSE |

Rapport N° : 130PAA0000 14/12/2017

7/15

Date d'édition : 23/12/2017

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

| PIECE     | ETAGE | ELEMENTS          | DESCRIPTIF<br>LABORATOIRE                | Echantillon    | REPERAGE | ETAT                  | RESULTAT           | METHODE          |
|-----------|-------|-------------------|------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------|--------------------|------------------|
|           |       |                   | + peinture                               |                |          |                       | déecté             |                  |
| Chambre 2 |       | Revêtement souple | Revêtement souple marron avec poussières | 130PAA0000P002 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non déecté | RESULTAT ANALYSE |
| Chambre 1 |       | Revêtement souple | Revêtement souple marron + peinture      | 130PAA0000P001 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non déecté | ZSO              |
| Chambre 2 |       | Revêtement souple | Revêtement souple marron avec poussières | 130PAA0000P002 | Sol      | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non déecté | ZSO              |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage



## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


| PRELEVEMENT : 130PAA0000P001 |                                     |                     |                    |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER                   | PIECE OU LOCAL      |                    |
| OPH77                        | 130PAA0000 14/12/2017               | Chambre 1           |                    |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE           | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple            | Revêtement souple marron + peinture | 14/12/2017          | LEITE LOPES Alain  |
| LOCALISATION                 |                                     | RESULTAT            |                    |
| Sol                          |                                     | Amiante non détecté |                    |

### EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 130PAA0000P002 |                                          |                     |                    |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                | NUMERO DU DOSSIER                        | PIECE OU LOCAL      |                    |
| OPH77                        | 130PAA0000 14/12/2017                    | Chambre 2           |                    |
| ELEMENT                      | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple            | Revêtement souple marron avec poussières | 14/12/2017          | LEITE LOPES Alain  |
| LOCALISATION                 |                                          | RESULTAT            |                    |
| Sol                          |                                          | Amiante non détecté |                    |

### EMPLACEMENT

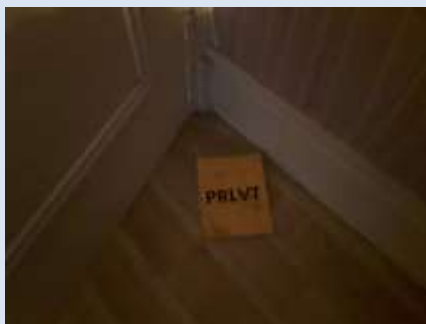



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

**itga** Ingénierie de Terrain **cofrac** **ESSAIS**

1 rue Elbert - Bât. R - Rue de la Terre Habite - CS 07 46662  
57500 VAILLY-ORCOURRE C2200K  
Tél : 03 21 73 41 44  
Fax : 03 21 73 41 43  
www.igp.fr

Accréditation n° 1-1947  
Date des essais et pertes  
d'échantillons sur www.cofrac.fr

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-35376 EN DATE DU 22/12/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport illustre les constatés par les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**  
AGENCE EHP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
N° : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
58900 LES ALLUETS-LE-ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-123177  
Echantillon ITGA : IT071712-35376  
Réçu au laboratoire le : 19/12/2017

**Réf. Client :**

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 130PAA0000-01                                                            |
| Opérateur client | 130PAA0000-01 - 4 RUE DE LA FONTAINE LGT 0 77780 BOURRON MARLOTTE        |
| Echantillon      | 130PAA000002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 sol Revêtement usé |
| Description ITGA | Revêtement souple marbre / Plâtre                                        |

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (MET) : image numérique, récupération de  
paramètres sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 065 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-059)

**Résultat :**

| Précision Analytique              | Technique analytique<br>et date d'analyse | Résultat             | Type<br>d'analyse | N° de<br>prélèvement |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Revêtement souple marbre + plâtre | META le 22/12/2017                        | Absence non détectée | ---               | 1                    |

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

Ce rapport illustre les constatés par les échantillons soumis à l'analyse. Ce rapport ne peut être utilisé pour d'autres constatés que ceux qui sont mentionnés dans ce rapport. Les échantillons analysés sont ceux qui sont mentionnés dans ce rapport. Les échantillons analysés sont ceux qui sont mentionnés dans ce rapport. Les échantillons analysés sont ceux qui sont mentionnés dans ce rapport.

Page 1/1

**itga** Ingénierie de Terrain **cofrac** **ESSAIS**

1 rue Elbert - Bât. R - Rue de la Terre Habite - CS 07 46662  
57500 VAILLY-ORCOURRE C2200K  
Tél : 03 21 73 41 44  
Fax : 03 21 73 41 43  
www.igp.fr

Accréditation n° 1-1947  
Date des essais et pertes  
d'échantillons sur www.cofrac.fr

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-35377 EN DATE DU 22/12/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport illustre les constatés par les échantillons soumis à l'analyse.

**Client :**  
AGENCE EHP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
N° : RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
58900 LES ALLUETS-LE-ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0717-123177  
Echantillon ITGA : IT071712-35377  
Réçu au laboratoire le : 19/12/2017

**Réf. Client :**

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Commande         | 130PAA0000-01                                                            |
| Opérateur client | 130PAA0000-01 - 4 RUE DE LA FONTAINE LGT 0 77780 BOURRON MARLOTTE        |
| Echantillon      | 130PAA000002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 sol Revêtement usé |
| Description ITGA | Revêtement souple marbre avec poissillons                                |

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (MET) : image numérique, récupération de  
paramètres sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 065 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-059)

**Résultat :**

| Précision Analytique                      | Technique analytique<br>et date d'analyse | Résultat             | Type<br>d'analyse | N° de<br>prélèvement |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Revêtement souple marbre avec poissillons | META le 22/12/2017                        | Absence non détectée | ---               | 1                    |

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

Ce rapport illustre les constatés par les échantillons soumis à l'analyse. Ce rapport ne peut être utilisé pour d'autres constatés que ceux qui sont mentionnés dans ce rapport. Les échantillons analysés sont ceux qui sont mentionnés dans ce rapport. Les échantillons analysés sont ceux qui sont mentionnés dans ce rapport. Les échantillons analysés sont ceux qui sont mentionnés dans ce rapport.

Page 1/1

## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Boulevard D'Alsace - Emplacement  
Cité, avenue 4 M 30  
35 Boulevard D'Alsace - Emplacement  
3581 BORDEAUX CEDEX

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°05897383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2005 - 1114 du 5 septembre 2005, codifiés aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes ultérieurs.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le conseil des Risques d'explosion au plomb
  - Repérage d'impact avant transaction, contrôle périodique
  - Dossier technique amont
  - Diagnostic amont parties privatives
  - Présence de termites et autres insectes xylophages
  - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
  - Repérage d'impact avant / après travaux et démolition
  - Repérage d'impact sur surfaces libérées ou similaires
  - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie applicables au souscripteur se trouvent également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la compagnie

ALLIANZ IARD  
Boulevard D'Alsace - Emplacement  
Cité, avenue 4 M 30  
35 Boulevard D'Alsace - Emplacement  
3581 BORDEAUX CEDEX

# CERTIFICAT DE COMPETENCES

## CERTIFICATION DE DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER



Décerné à :

**M. LEITE LOPES Alain** sous le numéro : **C021-SE04-2017**

| DOMAINE(S) CONCERNE(S)                                                                                          | VALIDITE                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)                                                            | X                              |
| DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ                                                       | Du 22/06/2017<br>Au 21/06/2022 |
| DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION                           | X                              |
| DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB                                                            | Du 22/06/2017<br>Au 21/06/2022 |
| DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION) | Du 24/06/2017<br>Au 23/06/2022 |
| DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLIS)                                      | X                              |

Le présent certificat est délivré en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que les articles d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certifiée. Ce certificat est valide à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient positivement satisfaisants.

Le présent certificat est délivré en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que les articles d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certifiée. Ce certificat est valide à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient positivement satisfaisants.

Déclaré à Thionville, le 24/06/2017  
Pour QUALIT'COMPETENCES  
LAROUEZ Soufian, Responsable Certification



Seul l'expert agréé est habilité à délivrer ce certificat. Toute réclamation doit être adressée à l'organisme certificateur. Le présent certificat est valide à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient positivement satisfaisants.

QUALIT'COMPETENCES CERTIFICATIONS  
100 - 101, rue de la République - 54100 THIONVILLE  
Tél : 03 83 33 33 33 - Fax : 03 83 33 33 33 - Email : contact@qualitcompetences.com  
SAS au capital de 55 000 Euros - RCS de Thionville 506 275 101 - N° de gérance 452 8 13 (SIREN 452 8 13)



|  |                                                            |
|--|------------------------------------------------------------|
|  | Murs périphériques / Plaques de plâtre                     |
|  | Murs Bois                                                  |
|  | Murs Brique                                                |
|  | Murs Béton brut                                            |
|  | Cloisons Plaques de plâtre                                 |
|  | Murs carreaux de plâtre                                    |
|  | Murs Béton / Enduit                                        |
|  | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre      |
|  | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
|  | Torchis                                                    |
|  | Murs Amiantés                                              |
|  | Murs Brique / Enduit                                       |

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés

Murs Brique plâtrière
