

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

28 SQUARE BEAUREGARD

LOGEMENT 1
77140 NEMOURS



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	28 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	LOGEMENT 1
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	20LAG0201	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	26/09/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Lyes IZABACHENE	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	1378	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	03/09/2015	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	CEBTP ZAC La Clef Saint Pierre - 12 Avenue Gay Lussac - 78990 ELANCOURT	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 04/10/2019

Cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Lyes IZABACHENE**



SOCOTEC DIAGNOSTIC
479 076 838 RCS Paris
21, route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
Tél : 03 21 73 41 44
www.socotec.fr

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	17
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	22
ATTESTATION(S).....	24
CERTIFICAT DE COMPETENCES	25

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Séjour	R+2	Revêtement souple	Dalle dure cassante marron	Sol	20LAG0201P001	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+2	Revêtement souple	Dalle dure cassante marron	Sol	20LAG0201P001	ZPSO	BON ETAT	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 2	R+2	Revêtement souple	Dalle dure cassante marron	Sol	20LAG0201P001	ZPSO	BON ETAT	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)
Entrée	R+2	Revêtement souple	Dalle dure cassante marron	Sol	20LAG0201P001	ZPSO	BON ETAT	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 1	R+2	Revêtement souple	Dalle dure cassante marron	Sol	20LAG0201P001	ZPSO	BON ETAT	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)
Placard 2	R+2	Revêtement souple	Dalle dure cassante marron	Sol	20LAG0201P001	ZPSO	BON ETAT	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. GATINAIS SEINE & LOING 4 SQUARE COUPERIN CS 40070 Champagne sur 77811 MORET SUR LOING CEDEX Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		BON DE TRAVAUX 2019 13375 EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4476 1 Provenance GATINAIS SEINE LOING Objet ENTRETIEN	ÉMETTEUR TAHIRI FATIHA	
SERVICE SCE GATINAIS S&L	LOCALISATION Programme 20 NEMOURS - BEAUREGARD Tranche 1 Ensemble C000 Escalier AG Étage 02 Logement 1 Module 20LAG0201 Retrait des clés CHEZ LE LOCATAIRE	
ADRESSE MME DE OLIVEIRA MELANY 28 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS		

DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS **PÉRIODE DU** 07-08-2019 AU 21-08-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI60	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS -	1,00	5,00	5,00
AMI70	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MOLP ANALYSE DE 11 A 50 PRELEVEMENTS ISSUS SOL CUISINE+SEJOUR+ MUR CHAM+SEJOUR	4,00	25,00	100,00
TOTAL H.T.				105,00
H.T. ACTUALISE				
COEFFICIENT REGIONAL				
RABAIS				
TOTAL H.T.				21,00
T.V.A. 20,00 %				
TOTAL T.T.C.				126,00

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : ENTLOG			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	ASUD SUD	HONORAIRES DIAG AMIANTE		126,00

AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET				
1 HONAMIA	20 1	C000 AG 20LAG0201	L 9902534 DE OLIVEIRA MELANY	126,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 13375

EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Plinthes carrelage/

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Séjour	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+2		OUI	CONCERNEE
Placard 1	R+2		OUI	CONCERNEE
Placard 2	R+2		OUI	CONCERNEE
Entrée	R+2		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+2		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+2		OUI	CONCERNEE
WC	R+2		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 1	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+2		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 2	R+2		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER		PORTES	FENETRE1	FENETRE2
						BAS	HAUT			
Séjour	R+2	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit			
Chambre 1	R+2	Brique / Enduit				Sol souple	Enduit			
Placard 1	R+2	Brique / Enduit				Sol souple	Enduit			
Placard 2	R+2	Brique / Enduit				Sol souple	Enduit			
Entrée	R+2	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit			
Cuisine	R+2					Sol souple				
Salle de bains	R+2					Sol souple				
WC	R+2					Sol souple				
Gaine technique 1	R+2									
Chambre 2	R+2	Brique / Enduit	Béton			Sol souple	Enduit			
Gaine technique 2	R+2									

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+2	Revêtement souple	Dalle dure cassante marron	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+2	Revêtement souple	Dalle dure cassante marron	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Entrée	R+2	Revêtement souple	Dalle dure cassante marron	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 1	R+2	Revêtement souple	Dalle dure cassante marron	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Placard 2	R+2	Revêtement souple	Dalle dure cassante marron	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Séjour	R+2	Revêtement souple	Dalle dure cassante marron	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple marron	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	R+2	Revêtement souple	Peinture	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple marron	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Revêtement souple	Peinture	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple marron	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Revêtement souple	Peinture	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple marron	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Revêtement souple	Peinture	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple marron	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Revêtement souple	Peinture	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+2	Revêtement souple	Revêtement souple marron	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+2	Revêtement souple	Peinture	20LAG0201P001	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Revêtement souple	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige avec poussières	20LAG0201P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Revêtement souple	Ragréage gris	20LAG0201P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable	20LAG0201P002	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+2	Revêtement souple	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige avec poussières	20LAG0201P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Revêtement souple	Ragréage gris	20LAG0201P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable	20LAG0201P002	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Revêtement souple	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige avec poussières	20LAG0201P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Revêtement souple	Ragréage gris	20LAG0201P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+2	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable	20LAG0201P002	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	20LAG0201P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac + enduit gris en faible quantité non séparable	20LAG0201P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac + enduit gris en faible quantité non séparable	20LAG0201P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac + enduit gris en faible quantité non séparable	20LAG0201P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	R+2	Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac + enduit gris en faible quantité non séparable	20LAG0201P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	R+2	Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac + enduit gris en faible quantité non séparable	20LAG0201P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac + enduit gris en faible quantité non séparable	20LAG0201P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO


PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	R+2	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit compact gris hétérogène	20LAG0201P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit compact gris hétérogène	20LAG0201P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit compact gris hétérogène	20LAG0201P005	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+2	Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit compact gris hétérogène	20LAG0201P005	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


PRELEVEMENT : 20LAG0201P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAG0201 26/09/2019	Séjour (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron	26/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

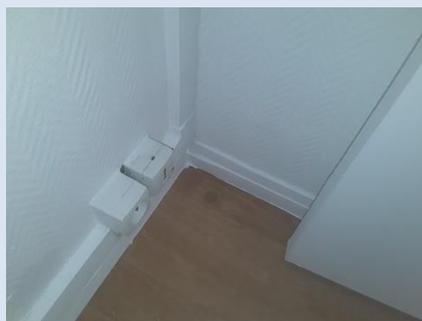

PRELEVEMENT : 20LAG0201P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAG0201 26/09/2019	Séjour (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	26/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	


EMPLACEMENT

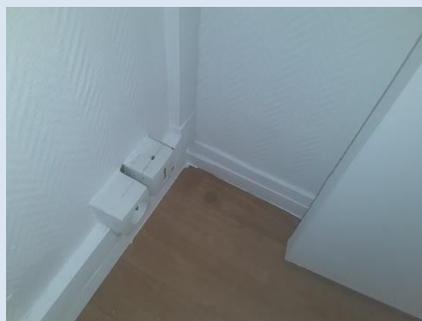

PRELEVEMENT : 20LAG0201P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	20LAG0201 26/09/2019		Séjour (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Peinture	26/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 20LAG0201P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	20LAG0201 26/09/2019		Séjour (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Dalle dure cassante marron	26/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)	

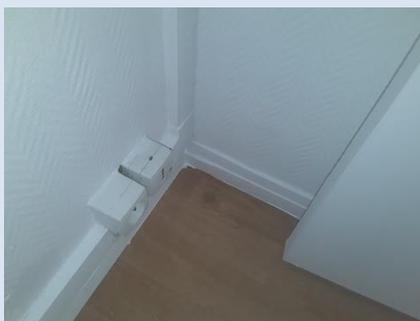EMPLACEMENT


PRELEVEMENT : 20LAG0201P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAG0201 26/09/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige avec poussières	26/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 20LAG0201P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAG0201 26/09/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Ragréage gris	26/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 20LAG0201P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAG0201 26/09/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable	26/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 20LAG0201P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAG0201 26/09/2019	Chambre 1 (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	26/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

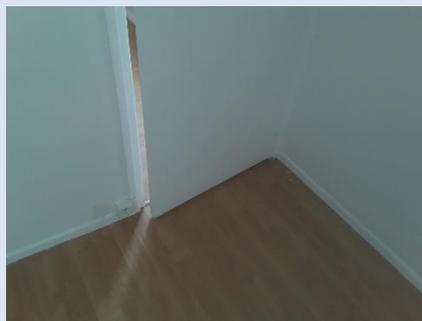


PRELEVEMENT : 20LAG0201P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	20LAG0201 26/09/2019		Chambre 2 (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peinture en vrac + enduit gris en faible quantité non séparable	26/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

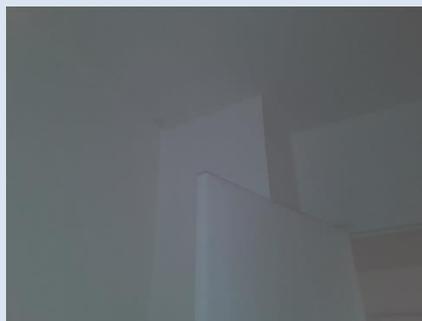

PRELEVEMENT : 20LAG0201P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	20LAG0201 26/09/2019		Séjour (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit compact gris hétérogène	26/09/2019	IZABACHENE Lyes
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

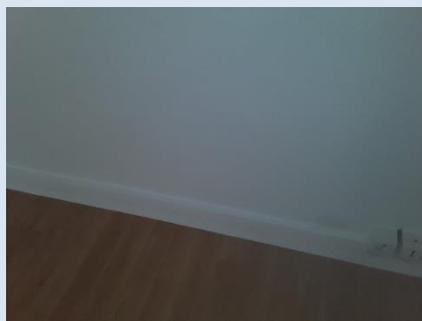

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-87322 EN DATE DU 04/10/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE POISSY 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-87322 Réf. Commande Client : 20LAG0201-01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 30/09/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 20LAG0201-01 - 28 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS				Réf échantillon ITGA : IT071910-726
Réf échantillon client : 20LAG0201P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Sol Revêtement souple				Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture / Dalle dure cassante marron
* Revêtement souple marron	META (1)	1	03/10/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	03/10/2019	Amiante non détecté / -
* Peinture	META (1)	1	03/10/2019	Amiante non détecté / -
* Dalle dure cassante marron	META (2)	1	03/10/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 20LAG0201-01 - 28 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS				Réf échantillon ITGA : IT071910-727
Réf échantillon client : 20LAG0201P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple				Description ITGA : Peinture en faible quantité @ / Revêtement souple beige avec poussières / Colle polymère jaune / Ragréage gris
* Peinture en faible quantité non séparable + revêtement souple beige avec poussières	META (1)	1	03/10/2019	Amiante non détecté / -
* Ragréage gris	META (1)	1	03/10/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable	META (2)	4	04/10/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-87322 EN DATE DU 04/10/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 20LAG0201-01 - 28 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS				
Réf échantillon client : 20LAG0201P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1. Mur A Enduit Peinture				
Réf échantillon ITGA : IT071910-728				
Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit gris en vrac hétérogène				
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	META (1)	1	03/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 20LAG0201-01 - 28 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS				
Réf échantillon client : 20LAG0201P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2. Plafond Enduit Peinture béton				
Réf échantillon ITGA : IT071910-729				
Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en faible quantité				
* Peinture en vrac + enduit gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	03/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 20LAG0201-01 - 28 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS				
Réf échantillon client : 20LAG0201P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur C Enduit Peinture béton				
Réf échantillon ITGA : IT071910-730				
Description ITGA : Peintures multiples avec couche en toile / Enduit compact gris hétérogène				
* Peintures multiples avec couche en toile non séparable + enduit compact gris hétérogène	META (1)	1	03/10/2019	Amiante non détecté / -

(*) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour l'analyse

Validé par : Estelle RUBAUD - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/2

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC, 1 rue des Dardanelles 75017 Paris

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018. Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p>AMIANTE : ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE) CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE) REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES</p> <p>PLOMB : DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP) RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION</p> <p>ETAT PARASITAIRE : ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS) INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)</p> <p>MESURES : MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.</p> <p>AUTRES : ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT) DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p>ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE. ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012. DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF ETAT DES LIEUX LOCATIFS DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE CERTIFICAT DE DECEANCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS. DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES- LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS. DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CENTRE DE FORMATION MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGIS DE LEVAGE ET DE CHANTIER DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS</p>
---	--

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par an année d'assurance.

La présente attestation est valable du 6 SEPTEMBRE 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Le Bouscat, le 06/09/2019
 Pour la compagnie

VD ASSOCIES
 P.O. 81, Bd Pierre Pionnier
 33110 LE BOUSCAT
 RCS - 794 672 238 0845 - 03 56 10 22 00
 TEL - 05 56 70 95 75

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat

Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par GINGER CATED à :

IZABACHENE Lyes sous le numéro 1378

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

	Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Date d'effet	Date d'expiration	
<input checked="" type="checkbox"/>	Amiante Missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	03/09/2015	02/09/2020	c
<input checked="" type="checkbox"/>	Plomb Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	03/09/2015	02/09/2020	c
	<input type="checkbox"/> Mention Plomb: Diagnostic du risque d'inhalation par le plomb des peintures (CRIPP) Contrôle après travaux en présence de plomb (CTPP)			
<input checked="" type="checkbox"/>	Termites <input checked="" type="checkbox"/> France <input type="checkbox"/> Outremer:	10/09/2015	09/09/2020	c
<input type="checkbox"/>	DPE Diagnostic de performance énergétique			
	<input type="checkbox"/> Mention DPE: Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments			
<input checked="" type="checkbox"/>	GAZ Etat des installations intérieures de gaz	07/08/2015	06/08/2020	c
<input checked="" type="checkbox"/>	Electricité Etat des installations intérieures d'électricité	28/09/2015	27/09/2020	c

Légende: C-Certification - R-Recertification - T-Transfert

Le mercredi 30 septembre 2015

Le Directeur Ginger Cated
Michel KHATIB



E20 - v12 du 14/10/2013
Ref: 30137819CC2015







GINGER CATED – ZAC La Clef Saint Pierre - 12 avenue Gay Lussac – 78 990 ELANCOURT
Téléphone : 01 30 85 24 60 – Email : certificated.contact@gingergroupe.com - Site : www.cated.fr

page 1 sur 2

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : R+2	Vue de dessus
Auteur : IZABACHENE Lyes	Bien : 20LAG0201 - LOGEMENT 1 28 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien



	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	

	Murs amiantés
	Prélèvements de sol amianté
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafond amiantés
	Prélèvements de plafond non amiantés
	Prélèvements de mur amiantés
	Prélèvements de mur non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sols amiantés
	Plafonds amiantés
	Sols et plafonds amiantés
	Conduits amiantés
	Conduits non amiantés
