

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

30 SQUARE BEAUREGARD

77140 NEMOURS



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	30 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	R+2	Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	20LAH0203	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	30/01/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Alain LEITE LOPES	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	CPDI4715	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	17/01/2018	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	I.Cert Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire	Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 12/02/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Alain LEITE LOPES**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES.....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION .....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C \ SOMMAIRE.....	3
D \ CONCLUSIONS.....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	7
G \ RAPPORTS PRECEDENTS .....	7
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	8
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES .....	19
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES .....	23
ATTESTATION(S).....	25
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	26

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	R+2	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	20LAH0203P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	R+2	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	20LAH0203P003	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Séjour	R+2	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	20LAH0203P003	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Chambre 1	R+2	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	20LAH0203P003	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Chambre 2	R+2	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	Sol	20LAH0203P003	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

*Liste des éléments non inspectés et justification*

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 ANT. GATINAIS SEINE & LOING 4 SQUARE COUPERIN CS 40070 Champagne sur 77811 MORET SUR LOING CEDEX Tél: 01 64 14 11 11 Siret: 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 941
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4476 1 <b>Provenance</b> GATINAIS SEINE LOING <b>Objet</b> ENTRETIEN		<b>EXPERT HABITAT INGENIERIE</b> 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY
<b>SERVICE</b> SCE GATINAIS S&L <b>LOCALISATION</b> Programme 20 NEMOURS - BEAUREGARD Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AH Étage 02 Logement 3 Module 20LAH0203 Retrait des clés A L'ANTENNE		<b>ÉMETTEUR</b> TAHIRI FATIHA <b>Téléphone</b> 0321734144
<b>ADRESSE</b> 30 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS		

**DÉLAI D'EXÉCUTION** 15 JOURS **PÉRIODE DU** 29-01-2019 **AU** 12-02-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AM10	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS URGENTS - CL2 ANTENNE	1,00	5,00	5,00
AM170	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MOLP ANALYSE DE 11 A 50 PRELEVEMENTS ISSUS SOL CUISINE+CHAMBRE+ MUR SALIN+MUR SUB1 CHAMBRE	5,00	25,00	125,00
<b>TOTAL H.T.</b>				130,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				26,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				156,00

AFFECTATION BUDGETAIRE				CODES STRUCTURE ET SCHEMA : ENTLOG		MONTANT I.T.C.	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES		LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE			
1	HONAMIA A760	ASUD	SUD	HONORAIRES DIAG AMIANTE			156,00

AFFECTATION ANALYTIQUE				MONTANT T.T.C.	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT	
1	HONAMIA	20 1	A000 AH 20LAH0203	L 4000593	156,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 941

ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

Rapport N° : 20LAH0203 30/01/2019

Version : 12/02/2019

6/28

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
WC	R+2		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+2		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+2		OUI	CONCERNEE
Gaine technique	R+2		OUI	CONCERNEE
Entrée	R+2		OUI	CONCERNEE
Séjour	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+2		OUI	CONCERNEE
Placard 1	R+2		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+2		OUI	CONCERNEE
Placard 2	R+2		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER		PORTES	FENETRE1	FENETRE2
						BAS	HAUT			
WC	R+2					Dalle béton	Dalle béton			
Salle de bains	R+2	Béton				Dalle béton	Dalle béton			
Cuisine	R+2					Dalle béton	Dalle béton			
Gaine technique	R+2									
Entrée	R+2									
Séjour	R+2	Béton				Dalle béton	Dalle béton			
Chambre 1	R+2	Béton				Dalle béton	Dalle béton			
Placard 1	R+2									
Chambre 2	R+2	Béton				Dalle béton	Dalle béton			
Placard 2	R+2									

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
-------	-------	----------	------------------------	-------------	----------	------	----------	---------



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+2	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	20LAH0203P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Séjour	R+2	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	20LAH0203P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 1	R+2	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	20LAH0203P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Chambre 2	R+2	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	20LAH0203P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Cuisine	R+2	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	20LAH0203P003	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Rapport N° : 20LAH0203 30/01/2019

Version : 12/02/2019

9/28

## LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+2	Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	20LAH0203P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	20LAH0203P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	20LAH0203P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+2	Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	20LAH0203P003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	20LAH0203P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	20LAH0203P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	20LAH0203P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	20LAH0203P002	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	20LAH0203P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+2	Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	20LAH0203P003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	20LAH0203P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	20LAH0203P003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	20LAH0203P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+2	Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	20LAH0203P003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	20LAH0203P003	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	20LAH0203P003	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	20LAH0203P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	20LAH0203P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+2	Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	20LAH0203P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+2	Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	20LAH0203P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	20LAH0203P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	20LAH0203P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	20LAH0203P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	R+2	Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	20LAH0203P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+2	Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	20LAH0203P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	20LAH0203P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	20LAH0203P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	20LAH0203P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	20LAH0203P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+2	Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	20LAH0203P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+2	Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	20LAH0203P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	20LAH0203P001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	20LAH0203P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	20LAH0203P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	20LAH0203P001	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+2	Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	20LAH0203P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage









## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 20LAH0203P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	20LAH0203 30/01/2019		Chambre 1 (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Béton	Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	30/01/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 20LAH0203P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	20LAH0203 30/01/2019		Salle de bains (R+2)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	30/01/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



**PRELEVEMENT : 20LAH0203P003**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAH0203 30/01/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Dalle dure cassante grise	30/01/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



**PRELEVEMENT : 20LAH0203P003**

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAH0203 30/01/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire	30/01/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 20LAH0203P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAH0203 30/01/2019	Cuisine (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	30/01/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 20LAH0203P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	20LAH0203 30/01/2019	WC (R+2)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Conduit Metal		30/01/2019	LEITE LOPES Alain
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Conclusion impossible	

EMPLACEMENT






## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02 99 35 41 41  
Fax : 02 99 35 41 42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-8934 EN DATE DU 06/02/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-8934 Réf. Commande Client : 20LAH0203--01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 04/02/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscope
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscope (méthode interne : IT286)

- Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
- Analytiques(s) : - La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
  - La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 20LAH0203--01 - 30 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS Réf échantillon client : 20LAH0203P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur E Béton				Réf échantillon ITGA : IT071902-5859 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture en faible quantité / Papier peint
* Matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable + papier peint non séparable	META (1)	1	05/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 20LAH0203--01 - 30 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS Réf échantillon client : 20LAH0203P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071902-5860 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Peintures multiples en vrac
* Matériau gris en faible quantité non séparable + peintures multiples en vrac	META (1)	1	05/02/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 07

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-8934 EN DATE DU 06/02/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)


Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 20LAH0203--01 - 30 SQUARE BEAUREGARD 77140 NEMOURS Réf échantillon client : 20LAH0203P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - / Cuisine Sol Dalle de sol		Réf échantillon ITGA : IT071902-5861 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune / Colle bitumeuse noire / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Matériau gris en faible quantité hétérogène		
1 Dalle dure cassante grise	META (2)	1	06/02/2019	Amiante non détecté / -
1 Colle polymère jaune non séparable + colle polymère jaune non séparable + colle bitumeuse noire	MOLP	1	05/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
1 Revêtement bicouche souple beige et rouge + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	META (1)	2	06/02/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Gwénoél HELIAS - Analyste





ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

**EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE**  
**21 ROUTE D ALBERT**  
**62450 AVESNES LES BAPAUME**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
 Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p><b>ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE</b>  <b>DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE</b>  <b>DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES</b>  <b>CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )</b>  <b>CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )</b>  <b>REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION</b>  <b>REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES</b>  <b>DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU</b>  <b>CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP)</b>  <b>DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )</b>  <b>RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION</b>  <b>ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES</b>  <b>ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETES, LYCTUS )</b>  <b>INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALLUR )</b>  <b>MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN</b>  <b>CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.</b>  <b>ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ</b>  <b>ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNM )</b>  <b>DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE</b>  <b>DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</b></p>	<p><b>ETAT DES LIEUX LOCATIFS</b>  <b>DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE</b>  <b>CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION</b>  <b>DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO</b>  <b>INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES</b>  <b>THERMOGRAPHIE INFRAROUGE</b>  <b>DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.</b>  <b>DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE</b>  <b>DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION</b>  <b>DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL</b>  <b>DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG ) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.</b>  <b>DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES</b>  <b>EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )</b>  <b>ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION</b>  <b>CENTRE DE FORMATION</b>  <b>MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE</b>  <b>DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR</b>  <b>VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES</b></p>
--	---

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1<sup>er</sup> JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.


Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
 A défaut la garantie n'est pas acquise.


Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018  
 Pour la compagnie



## CERTIFICAT DE COMPETENCES



### Certificat de compétences Diagnosticneur Immobilier

N° CPDI4715 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur LEITE LOPES Alain**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention*</b> <b>Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 23/08/2022</b>
<b>Gaz</b>	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> <b>Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 21/06/2022</b>
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> <b>Date d'effet : 17/01/2018 - Date d'expiration : 21/06/2022</b>

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 15/01/2018.

\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.  
\*\*Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1, 3, 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Annexé du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'infiltration par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant du formaldéhyde, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Annexé du 3 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.




Certification de personnes  
Diagnosticneur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire






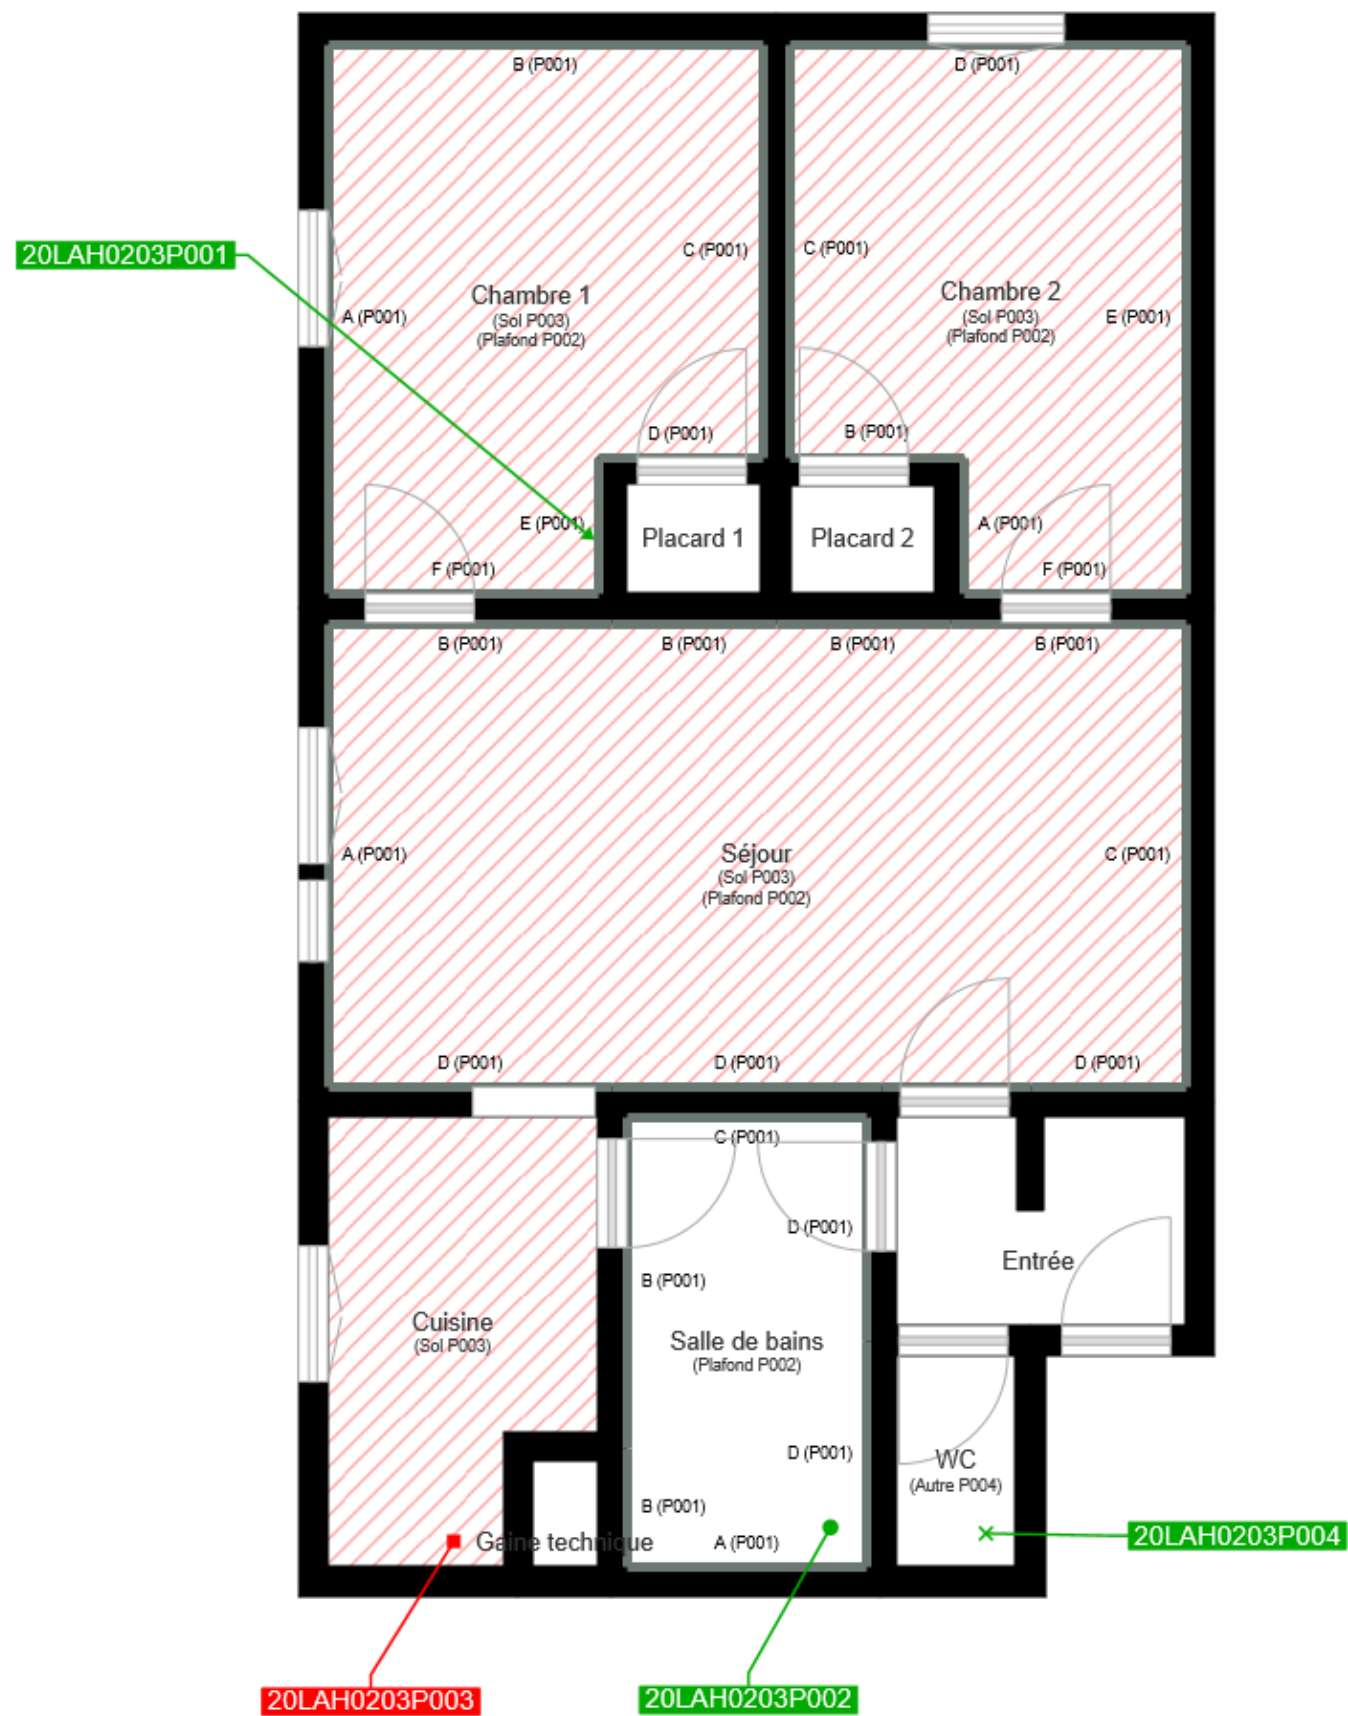






CPE DIFR 11 rev13



	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

21

-  Murs amiantés
-  Prélèvements de sol amianté
-  Prélèvements de sol non amiantés
-  Prélèvements de plafond amiantés
-  Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés
-  Conduits amiantés
-  Conduits non amiantés
