

Modèle de rapport de repérage amiante avant travaux D.AMI-03 version 0.3

Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2407135391 Rapport édité le : 25/08/2024

DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE - LUTGEN MARC 77002 MELUN

OPERATEUR DE REPERAGE

PLOZNER thomas

Certification n°: CPDI7207 Décernée par: ICERT

PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE 10 Avenue Charles Péguy 77000 Melun

LIEU D'INTERVENTION

1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) 77430 Champagne-sur-Seine

Lot numéro 309LAD0303,

Bat. N/A; Etage 03; Porte 517





Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : PLOZNER thomas



TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Révision	Date	Objet
Version initiale	01/08/2024	Établissement du Dossier Technique



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page 2 sur 52

Rapport du : 25/08/2024



Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'annexe I de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE - LUTGEN MARC	10 AVENUE CHARLES PEGUY BP 114 77002 MELUN
Propriétaire	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	10 Avenue Charles Péguy 77000 Melun
Accompagnateur	Sans accompagnateur	

OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.

NOM	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
PLOZNER thomas	I.Cert	CPD17207	25/03/2024	24/03/2031

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

	COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
AXA	Axa	3912280604	01/01/2025

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx goupe



LABORATOIRE	°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASYLAB	50503704400706	4 rue Maryse Bastié 44700 ORVAULT

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page 3 sur 52 Rapport du : 25/08/2024



> SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	7
5.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	14
6.	PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	16
7.	RAPPORTS D'ANALYSES	38
8.	ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	52

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :

BÂTIMENT

ENVIRONNEMENT

NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES

















INDUSTRIE









FORMATION





1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page 4 sur 52

Rapport du: 25/08/2024



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) Adresse du bien : Numéro de mission : MA2407135391

77430 Champagne-sur-Seine

Référence client : Références cadastrales :

PC / date de construction : Date du permis de construire non connue

01/08/2024

Bat. N/A; Etage 03; Porte 517, Lot numéro 309LAD0303 Numéro de lot :

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non
Autres documents relatifs à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non

Observations:

Absence de plaque anti-vibratile sous évier



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **5** sur **52** Rapport du : 25/08/2024



3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Entrée, Cuisine, Cellier, Séjour, Dégagement, Chambre 1, Chambre 2, WC,

3ème étage 517 : Salle de bain

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
3ème étage 517	Entrée	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Séjour	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Dégagement	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	WC	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Salle de bain	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Entrée	Mur de refend
	Cuisine	Mur de refend
	Cellier	Mur de refend
	Séjour	Mur de refend
	Dégagement	Mur de refend
	Chambre 1	Mur de refend
	Chambre 2	Mur de refend
	WC	Mur de refend
	Salle de bain	Mur de refend
	Cuisine	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Séjour	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 1	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Chambre 2	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	Entrée	Plafond
	Cuisine	Plafond
	Cellier	Plafond
	Séjour	Plafond
	Dégagement	Plafond
	Chambre 1	Plafond
	Chambre 2	Plafond
	WC	Plafond
	Salle de bain	Plafond
	Séjour	Sol
	Chambre 1	Sol
	Chambre 2	Sol
	Salle de bain	Sol
	Entrée	Sol
	Cuisine	Sol
	Dégagement	Sol
	WC	Sol
	Cuisine	Faïences
	Salle de bain	Faïences
	Entrée	Plinthes / menuiseries
	Cuisine	Plinthes / menuiseries
	Séjour Dégagement	Plinthes / menuiseries
	Dégagement	Plinthes / menuiseries
	Chambre 1	Plinthes / menuiseries
	Chambre 2	Plinthes / menuiseries
	WC	Plinthes / menuiseries
	Salle de bain	Plinthes / menuiseries

Descriptif des travaux :

Réfection complète du logement



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page 6 sur 52 Rapport du : 25/08/2024



Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visitées

Localisation	Description
Néant	-

<u>Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :</u>

Localisation	Parties du local	Raison	
Néant	-		



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **7** sur **52** Rapport du : 25/08/2024



4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la règlementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO001	3ème étage 517	Entrée; Séjour; Dégagement; Chambre 1; Chambre 2; WC; Salle de bain	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Analyse: P001 - Phase 1 Matériau fibreux de type papier peint (beige); matériau semi-dur (beige); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (Absence d'amiante) Analyse: P002 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs); matériau de type système d'enduit peinture (orange); matériau souple fibreux de type papier, carton (beige); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (Absence d'amiante) - Phase 5 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (Absence d'amiante)	72m2
ZPSO002	3ème étage 517	Entrée; Cuisine; Cellier; Séjour; Dégagement; Chambre 1; Chambre 2; WC; Salle de bain	Mur de refend	Analyse: P003 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse: P004 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (marron); matériau de type système d'enduit peinture (beige); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante)	106.25m2
ZPSO003	3ème étage 517	Cuisine; Séjour; Chambre 1; Chambre 2	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Analyse: P005 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (marron); matériau de type peinture (grís); matériau souple fibreux de type papier, carton (beige); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur de type papier, carton (marron); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante) - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (Absence d'amiante) - Phase 5 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse: P006 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (orange); matériau de type peinture (blanc); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau de type plâtre (blanc); matériau semi-dur de type plâtre (blanc); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante) - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (Absence d'amiante) - Phase 5 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (Absence d'amiante)	41.25m2
ZPSO004	3ème étage 517	Entrée; Cuisine; Cellier; Séjour; Dégagement; Chambre 1; Chambre 2; WC; Salle de bain	Plafond	Analyse : P007 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P008 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) (Présence d'amiante)	66,5m2



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **8** sur **52** Rapport du : 25/08/2024




ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO005	3ème étage 517	Séjour; Chambre 1; Chambre 2; Salle de bain	Sol	Analyse: P009 - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir); matériau semi-dur de type ragréage (gris); matériau semi-dur (blanc) (Présence d'amiante) Analyse: P101 - Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Présence d'amiante)	37m2
ZPSO006	3ème étage 517	Entrée; Cuisine; Dégagement; WC	Sol	Analyse: P011 - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Présence d'amiante) - Phase 4 Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir); matériau semi-dur (gris) (Présence d'amiante) Analyse: P012 - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Présence d'amiante) - Phase 4 Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir); matériau semi-dur (gris); matériau semi-dur (blanc) (Présence d'amiante)	24,5m2
ZPSO008	3ème étage 517	Entrée; Cuisine; Séjour; Dégagement; Chambre 1; Chambre 2; WC; Salle de bain	Plinthes / menuiseries	Analyse: P014 - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc); matériau de type peinture (rose); matériau dur de type ciment-colle (gris) (Présence d'amiante)	85ml



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page 9 sur 52 Rapport du : 25/08/2024



a dx	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés				
Affaire	MA2407135391				
Opération	PLOZNER thomas				
Site	1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303)				
Site	77430				
	Champagne-sur-Seine				
Date de réalisation	25/08/2024				
Matériaux et p	roduits contenant de l'amiante				
	Surface amianté				
	Linéaire / paroi amianté (type 1)				
	Linéaire / paroi amianté (type 2)				
	Conduit amianté				
Sondages dest	ructifs / Prélèvements				
Px	Prélèvement Positif				
Px	Prélèvement négatif				
S	Sondage destructif				
Types de murs					
	Mur Porteur				
	Mur Cloison (type 1)				
	Mur Cloison (type 2)				
\boxtimes	Gaine technique				
Eléments ou pièces non visités					
LOCAL NON VESTÉ	Local non visité				
	Elément non visité				

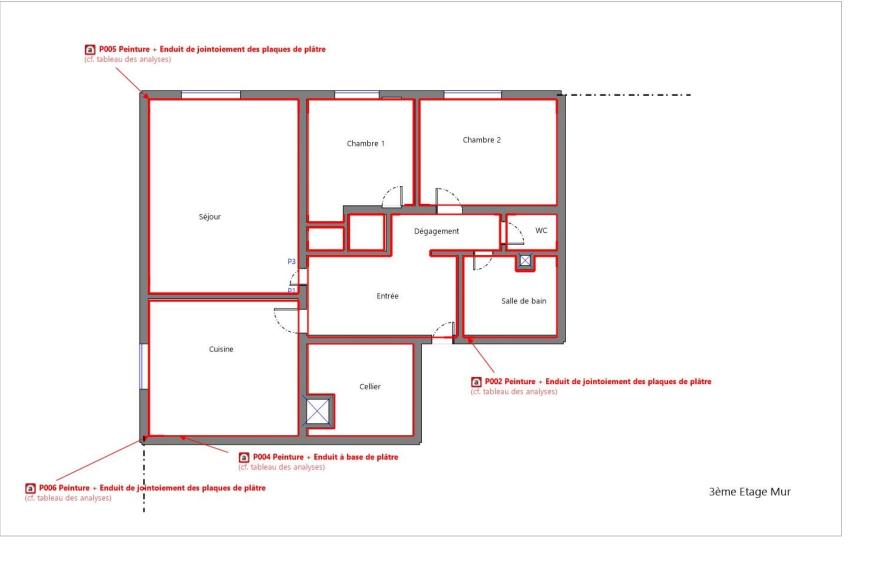



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **10** sur **52** Rapport du : 25/08/2024




X Grape	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2407135391
Opération	PLOZNER thomas
	1 Rue du Docteur Calmette
Site	(309LAD0303)
Site	77430 Champagne-sur-Seine
Date de réalisation	25/08/2024
	roduits contenant de l'amiante
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages desti	ructifs / Prélèvements
Px	Prélèvement Positif
 Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
,,,	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
\boxtimes	Gaine technique
Eléments ou pi	èces non visités
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ELÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **11** sur **52** Rapport du : 25/08/2024



(a d xg	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés			
Affaire	MA2407135391			
Opération	PLOZNER thomas			
C''	1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303)			
Site	77430			
	Champagne-sur-Seine			
Date de réalisation	25/08/2024			
Matériaux et p	roduits contenant de l'amiante			
	Surface amianté			
	Linéaire / paroi amianté (type 1)			
	Linéaire / paroi amianté (type 2)			
\bigcirc	Conduit amianté			
Sondages destr	ructifs / Prélèvements			
Px	Prélèvement Positif			
Px	Prélèvement négatif			
S	Sondage destructif			
Types de murs				
	Mur Porteur			
	Mur Cloison (type 1)			
	Mur Cloison (type 2)			
\boxtimes	Gaine technique			
Eléments ou pi	èces non visités			
LOCAL NON VESTÉ	Local non visité			
ELEMENT,	Elément non visité			

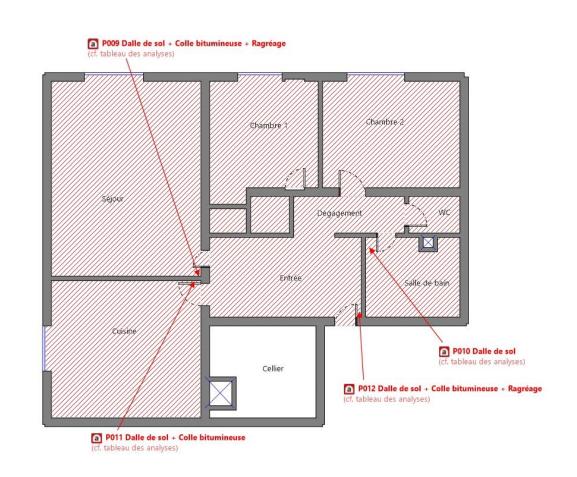




1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **12** sur **52** Rapport du : 25/08/2024



adx x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés				
Affaire	MA2407135391				
Opération	PLOZNER thomas				
Site	1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) 77430				
	Champagne-sur-Seine				
Date de réalisation	25/08/2024				
Matériaux et p	roduits contenant de l'amiante				
	Surface amianté				
	Linéaire / paroi amianté (type 1)				
	Linéaire / paroi amianté (type 2)				
\bigcirc	Conduit amianté				
Sondages dest	ructifs / Prélèvements				
Px	Prélèvement Positif				
Px	Prélèvement négatif				
S	Sondage destructif				
Types de murs					
	Mur Porteur				
	Mur Cloison (type 1)				
	Mur Cloison (type 2)				
\boxtimes	Gaine technique				
Eléments ou pièces non visités					
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité				
	Elément non visité				

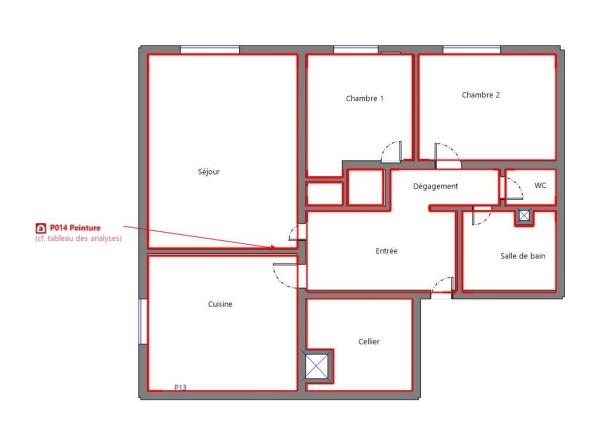



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page 13 sur 52 Rapport du : 25/08/2024



Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	- Phase 1 Matériau fibreux de type papier peint (beige); matériau semi-dur (beige); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	Identifiant: ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs); matériau de type système d'enduit peinture (orange); matériau souple fibreux de type papier, carton (beige); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P003	Identifiant: ZPS0002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	Identifiant: ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (marron); matériau de type peinture (gris); matériau souple fibreux de type papier, carton (beige); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P006	Identifiant: ZPS0003 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (orange); matériau de type peinture (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (beige); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau de type polystyrène (blanc); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPS0004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P008	Identifiant: ZPS0004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P009	Identifiant: ZPSO005 Description: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P010	Identifiant: ZPSO005 Description: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P011	Identifiant: ZPS0006 Description: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage	- Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 4 Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P012	Identifiant: ZPS0006 Description: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage	- Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 4 Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir); matériau semi-dur (gris); matériau semi-dur (blanc) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P013	Identifiant: ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,)	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page 14 sur 52

Rapport du : 25/08/2024



CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterré

Sondages:

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations);
 - Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront-être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.





1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page 15 sur 52

Rapport du: 25/08/2024



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Synthèse des ZPSO Incohérente

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO001	3ème étage 517	Entrée; Séjour; Dégagement; Chambre 1; Chambre 2; WC; Salle de bain	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Analyse: P001 - Phase 1 Matériau fibreux de type papier peint (beige); matériau semi-dur (beige); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (Absence d'amiante) Analyse: P002 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs); matériau de type système d'enduit peinture (orange); matériau souple fibreux de type papier, carton (beige); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante) - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (Absence d'amiante) - Phase 5 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante)
ZPSO002	3ème étage 517	Entrée; Cuisine; Cellier; Séjour; Dégagement; Chambre 1; Chambre 2; WC; Salle de bain	Mur de refend	Analyse: P003 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse: P004 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (marron); matériau de type système d'enduit peinture (beige); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante)

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ou des ZPSO notifiées ci-dessus peuvent s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :

- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité.

Les écarts suivants sont à signaler :

Suite à la notification du donneur d'ordre, il n'y a pas de distinction entre les pièces sèches et pièces humides.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			Х



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **16** sur **52** Rapport du : 25/08/2024



6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

Sans objet

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO001 : Couche:	ZPSO001 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre									
Niveau : 3ème éta	Niveau : 3ème étage 517									
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo			
Entrée	Discontinue	1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2407135391/P001, réf. labo.: 24RB024331-001 MA2407135391/P002, réf. labo.: 24RB024331-002 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Quantité estimée: 4 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002			



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **17** sur **52** Rapport du : 25/08/2024 RAAT
REPÉRAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

Séjour	Discontinue	2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 3ème étage 517 - Séjour : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2407135391/P001, réf. labo.: 24RB024331-001 MA2407135391/P002, réf. labo.: 24RB024331-002 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Quantité estimée: 4 m Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau fibreux de type papier peint (beige); matériau semi-dur (beige); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	
Dégagement	Discontinue	3	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2407135391/P001, réf. labo.: 24RB024331-001 MA2407135391/P002, réf. labo.: 24RB024331-002 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Quantité estimée: 6 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **18** sur **52** Rapport du : 25/08/2024 RAAT
REPÉRAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

Chambre 1	Discontinue	4	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2407135391/P001, réf. labo.: 24RB024331-001 MA2407135391/P002, réf. labo.: 24RB024331-002 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Quantité estimée: 5 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001, P002	ldem photo : P001; P002
Chambre 2	Discontinue	5	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2407135391/P001, réf. labo.: 24RB024331-001 MA2407135391/P002, réf. labo.: 24RB024331-002 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Quantité estimée: 3 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001, P002	Idem photo : P001; P002



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **19** sur **52** Rapport du : 25/08/2024

RAAT
REPÉRACE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

wc	Discontinue	6	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2407135391/P001, réf. labo.: 24RB024331-001 MA2407135391/P002, réf. labo.: 24RB024331-002 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Quantité estimée: 2 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002	Idem photo : P001; P002
Salle de bain	Discontinue	7	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 3ème étage 517 - Salle de bain : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2407135391/P001, réf. labo.: 24RB024331-001 MA2407135391/P002, réf. labo.: 24RB024331-002 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Quantité estimée: 5 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P002 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs); matériau de type système d'enduit peinture (orange); matériau souple fibreux de type papier, carton (beige); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi- dur de type plâtre (blanc) en traces Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **20** sur **52** Rapport du : 25/08/2024

RAAT
REPÉRACE AMIANTE
AVANT TOAVALIX

ZPSO002 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 3ème étage 517

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Entrée	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2407135391/P003, réf. labo.: 24RB024331-003 MA2407135391/P004, réf. labo.: 24RB024331-004 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Quantité estimée: 5 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	ldem photo : P004; P003
Cuisine	Discontinue	2	Mur de refend	Oui 3ème étage 517 - Cuisine : Mur de refend	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2407135391/P003, réf. labo.: 24RB024331-003 MA2407135391/P004, réf. labo.: 24RB024331-004 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Quantité estimée: 7 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P004 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (marron); matériau de type système d'enduit peinture (beige); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante	



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **21** sur **52** Rapport du : 25/08/2024



Cellier	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2407135391/P003, réf. labo.: 24RB024331-003 MA2407135391/P004, réf. labo.: 24RB024331-004 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Quantité estimée: 7 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P004; P003
Séjour	Discontinue	4	Mur de refend	Oui 3ème étage 517 - Séjour : Mur de refend	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2407135391/P003, réf. labo.: 24RB024331-003 MA2407135391/P004, réf. labo.: 24RB024331-004 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Quantité estimée: 4.5 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P003 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
Dégagement	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2407135391/P003, réf. labo.: 24RB024331-003 MA2407135391/P004, réf. labo.: 24RB024331-004 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Quantité estimée: 3 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P004; P003



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **22** sur **52** Rapport du : 25/08/2024

RAAT
REPÉRAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

Chambre 1	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2407135391/P003, réf. labo.: 24RB024331-003 MA2407135391/P004, réf. labo.: 24RB024331-004 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Quantité estimée: 5 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P004; P003
Chambre 2	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2407135391/P003, réf. labo.: 24RB024331-003 MA2407135391/P004, réf. labo.: 24RB024331-004 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Quantité estimée: 6 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	ldem photo : P004; P003
wc	Discontinue	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2407135391/P003, réf. labo.: 24RB024331-003 MA2407135391/P004, réf. labo.: 24RB024331-004 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Quantité estimée: 1 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004	Idem photo : P004; P003



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **23** sur **52**

Rapport du : 25/08/2024



Quantité estimée: 4 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **24** sur **52** Rapport du : 25/08/2024 RAAT
REPÉRACE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

ZPSO003 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre

A12		2 }	4	F47
Niveau	:	зете	etage	51/

Wiveau . Seille eta	Niveau : 3eme etage 517										
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo				
Cuisine	Discontinue	1	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 3ème étage 517 - Cuisine : Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2407135391/P005, réf. labo.: 24RB024331-005 MA2407135391/P006, réf. labo.: 24RB024331-006 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Quantité estimée: 3 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P006 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (orange); matériau de type peinture (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (beige); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau de type polystyrène (blanc); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante					
Séjour	Discontinue	2	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 3ème étage 517 - Séjour : Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2407135391/P005, réf. labo.: 24RB024331-005 MA2407135391/P006, réf. labo.: 24RB024331-006 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Quantité estimée: 8 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (marron); matériau de type peinture (gris); matériau souple fibreux de type papier, carton (beige); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi- dur de type plâtre (blanc) en traces Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante - Phase 5 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante					



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **25** sur **52** Rapport du : 25/08/2024 RAAT
REPÉRACE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

Chambre 1	Discontinue	3	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2407135391/P005, réf. labo.: 24RB024331-005 MA2407135391/P006, réf. labo.: 24RB024331-006 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Quantité estimée: 2.5 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006	ldem photo : P006; P005
Chambre 2	Discontinue	4	Doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2407135391/P005, réf. labo.: 24RB024331-005 MA2407135391/P006, réf. labo.: 24RB024331-006 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre Quantité estimée: 3 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006	Idem photo : P006; P005



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **26** sur **52** Rapport du : 25/08/2024



ZPSO007 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence

Niveau: 3ème étage 517

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine	Discontinue	1	Faïences	Oui 3ème étage 517 - Cuisine : Faïences	Identifiant: ZPSO007 Réf. échantillon: MA2407135391/P013 Réf. laboratoire: 24RB024331-013 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P013 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) Absence d'amiante	
Salle de bain	Discontinue	2	Faïences	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013	Identifiant: ZPSO007 Réf. échantillon: MA2407135391/P013 Réf. laboratoire: 24RB024331-013 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Couche1: Colle de faïence + Couche2: Joint de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P013	Idem photo : P013



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page 27 sur 52 Rapport du : 25/08/2024

ZPSO008: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Niveau : 3ème étage 517										
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo			
Entrée	Discontinue	1	Plinthes / menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014	Identifiant: ZPSO008 Réf. échantillon: MA2407135391/P014 Réf. laboratoire: 24RB024331-014 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Quantité estimée: 10 ml Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014	Idem photo : P014			
Cuisine	Discontinue	2	Plinthes / menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014	Identifiant: ZPSO008 Réf. échantillon: MA2407135391/P014 Réf. laboratoire: 24RB024331-014 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Quantité estimée: 14 ml Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014	Idem photo : P014			
Séjour	Discontinue	3	Plinthes / menuiseries	Oui 3ème étage 517 - Séjour : Plinthes / menuiseries	Identifiant: ZPSO008 Réf. échantillon: MA2407135391/P014 Réf. laboratoire: 24RB024331-014 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Quantité estimée: 18 ml Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P014 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc); matériau de type peinture (rose); matériau dur de type ciment-colle (gris): Présence d'amiante				



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **28** sur **52**

Rapport du : 25/08/2024



Dégagement	Discontinue	4	Plinthes / menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014	Identifiant: ZPSO008 Réf. échantillon: MA2407135391/P014 Réf. laboratoire: 24RB024331-014 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Quantité estimée: 6 ml Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P014	Idem photo : P014
Chambre 1	Discontinue	5	Plinthes / menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014	Identifiant: ZPS0008 Réf. échantillon: MA2407135391/P014 Réf. laboratoire: 24RB024331-014 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Quantité estimée: 14 ml Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P014	Idem photo : P014
Chambre 2	Discontinue	6	Plinthes / menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014	Identifiant: ZPSO008 Réf. échantillon: MA2407135391/P014 Réf. laboratoire: 24RB024331-014 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Quantité estimée: 12 ml Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014	Idem photo : P014
wc	Discontinue	7	Plinthes / menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014	Identifiant: ZPSO008 Réf. échantillon: MA2407135391/P014 Réf. laboratoire: 24RB024331-014 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Quantité estimée: 3 ml Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014	Idem photo : P014



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **29** sur **52** Rapport du : 25/08/2024



Salle de bain	Discontinue	8	Plinthes / menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014	Identifiant: ZPSO008 Réf. échantillon: MA2407135391/P014 Réf. laboratoire: 24R8024331-014 Description: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) Quantité estimée: 8 ml Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014	ldem photo : P014
---------------	-------------	---	---------------------------	---	---	-------------------------	-------------------

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO004 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché											
Niveau : 3ème étage 517											
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo				
Entrée	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2407135391/P007, réf. labo.: 24RB024331-007 MA2407135391/P008, réf. labo.: 24RB024331-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Quantité estimée: 7 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P008; P007				



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **30** sur **52** Rapport du : 25/08/2024 RAAT
REPÉRAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

		_					
Cuisine	Discontinue	2	Plafond	Oui 3ème étage 517 - Cuisine : Plafond	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2407135391/P007, réf. labo.: 24RB024331-007 MA2407135391/P008, réf. labo.: 24RB024331-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Quantité estimée: 13.5 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P008 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) : Présence d'amiante	
Cellier	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2407135391/P007, réf. labo.: 24RB024331-007 MA2407135391/P008, réf. labo.: 24RB024331-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Quantité estimée: 5 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	ldem photo : P008; P007
Séjour	Discontinue	4	Plafond	Oui 3ème étage 517 - Séjour : Plafond	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2407135391/P007, réf. labo.: 24RB024331-007 MA2407135391/P008, réf. labo.: 24RB024331-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Quantité estimée: 18 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) : Présence d'amiante	



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **31** sur **52** Rapport du : 25/08/2024 RAAT
REPÉRAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

Dégagement	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2407135391/P007, réf. labo.: 24RB024331-007 MA2407135391/P008, réf. labo.: 24RB024331-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Quantité estimée: 3 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P008; P007
Chambre 1	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2407135391/P007, réf. labo.: 24RB024331-007 MA2407135391/P008, réf. labo.: 24RB024331-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Quantité estimée: 7 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	ldem photo : P008; P007
Chambre 2	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2407135391/P007, réf. labo.: 24RB024331-007 MA2407135391/P008, réf. labo.: 24RB024331-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Quantité estimée: 8 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	ldem photo : P008; P007



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **32** sur **52** Rapport du : 25/08/2024

RAAT
REPÉRAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

wc	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2407135391/P007, réf. labo.: 24RB024331-007 MA2407135391/P008, réf. labo.: 24RB024331-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Quantité estimée: 1 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P008; P007
Salle de bain	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2407135391/P007, réf. labo.: 24RB024331-007 MA2407135391/P008, réf. labo.: 24RB024331-008 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Quantité estimée: 4 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008	Idem photo : P008; P007

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO005 : Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage								
Niveau : 3ème étage 517								
Localisation Continuité / Discontinuité sondage Continuité / Discontinuité sondage Continuité / Discontinuité sondage Continuité Sondage et extension Echantillon Analyse Photo								



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **33** sur **52** Rapport du : 25/08/2024 RAAT
REPÉRAGE AMIANTE
AVANT TRAVAUX

Séjour	Discontinue	1	Sol	Oui 3ème étage 517 - Séjour : Sol	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2407135391/P009, réf. labo.: 24RB024331-009 MA2407135391/P010, réf. labo.: 24RB024331-010 Description: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Quantité estimée: 18 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P009 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) Présence d'amiante	
Chambre 1	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2407135391/P009, réf. labo.: 24RB024331-009 MA2407135391/P010, réf. labo.: 24RB024331-010 Description: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Quantité estimée: 7 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Chambre 2	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2407135391/P009, réf. labo.: 24RB024331-009 MA2407135391/P010, réf. labo.: 24RB024331-010 Description: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Quantité estimée: 8 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Salle de bain	Discontinue	4	Sol	Oui 3ème étage 517 - Salle de bain : Sol	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2407135391/P009, réf. labo.: 24RB024331-009 MA2407135391/P010, réf. labo.: 24RB024331-010 Description: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage Quantité estimée: 4 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) : Présence d'amiante	



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **34** sur **52**

Rapport du : 25/08/2024



ZPSO006: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage

Niveau : 3ème éta	Niveau : 3ème étage 517									
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo			
Entrée	Discontinue	1	Sol	Oui 3ème étage 517 - Entrée : Sol	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: MA2407135391/P011, réf. labo.: 24RB024331-011 MA2407135391/P012, réf. labo.: 24RB024331-012 Description: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage Quantité estimée: 7 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P012 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 4 Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) Présence d'amiante				
Cuisine	Discontinue	2	Sol	Oui 3ème étage 517 - Cuisine : Sol	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: MA2407135391/P011, réf. labo.: 24RB024331-011 MA2407135391/P012, réf. labo.: 24RB024331-012 Description: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage Quantité estimée: 13.5 m2	Analyse: P011 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Présence d'amiante - Phase 4 Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir); matériau semi-dur (gris) Présence d'amiante				

Justificatif: Après analyse en laboratoire



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **35** sur **52** Rapport du : 25/08/2024



Dégagement	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: MA2407135391/P011, réf. labo.: 24RB024331-011 MA2407135391/P012, réf. labo.: 24RB024331-012 Description: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage Quantité estimée: 3 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P012	ldem photo : P012; P011
wc	Discontinue	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P012	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: MA2407135391/P011, réf. labo.: 24RB024331-011 MA2407135391/P012, réf. labo.: 24RB024331-012 Description: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragréage Quantité estimée: 1 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P012	Idem photo : P012; P011

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **36** sur **52** Rapport du : 25/08/2024



Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

<u>Légende</u>: « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **37** sur **52** Rapport du : 25/08/2024



OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du prérapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.



1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **38** sur **52** Rapport du : 25/08/2024



7. RAPPORTS D'ANALYSES



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



ADX GROUPE Thomas Plozner

Parc Saint Fiacre 53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-028356-01 Date d'émission de rapport : 13/08/2024 12:18

Référence dossier Client:66abcb9002156Dossier: MA2407135391

Référence dossier N° : 24UV063029 Référence laboratoire N° : 24RB024331 Reçu par MyEasyLab le : 07/08/2024 13:58 Reçu par le laboratoire le : 07/08/2024 Date d'analyse : 08/08/2024

Indice n°	Référence	Description visuelle	Technique	Pro	éparation	Résultats
	client		utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	
001-01	P001 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - 3eme etage 517 - Sejour	Matériau fibreux de type papier peint (beige); matériau semi-dur (beige); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PUU9	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traîtement)	Fibres d'amiante non détectées
001-02	P001 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - 3eme etage 517 - Sejour	papier, carton (marron)	MOLP / DH8S	2/2	8	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **39** sur **52** Rapport du : 25/08/2024





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-028356-01

Indice n°	Référence	Description visuelle	Technique	Pr	éparation	
	client		utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats
002-01	P002 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - 3eme etage 517 - Salle de bain	Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs); matériau de type système d'enduit peinture (orange); matériau souple fibreux de type papier, carton (beige); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP / JGHP	2/2		Analyse réalisée non conclusive
002-02	P002 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - 3eme etage 517 - Salle de bain	Matériau fibreux de type papier peint (de différentes couleurs); matériau de type système d'enduit peinture (orange); matériau souple fibreux de type papier, carton (beige); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / CH9R	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
002-03	P002 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - 3eme etage 517 - Salle de bain	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / VWSU	2/2	TEXT STATE OF THE PERSON OF TH	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **40** sur **52** Rapport du : 25/08/2024





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-028356-01

Indice n°	Référence	Description visuelle	Technique	Pr	éparation	
maioc n	client	occupation visuality	utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats
002-04	P002 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de Jointoiement des plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de Jointoiement des plaques de platre - Seme etage 517 - Salle de bain	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / VWSU	2/2		Fibres d'amiante non détectées
002-05	P002 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - 3eme etage 517 - Salle de bain	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CH9R	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **41** sur **52** Rapport du : 25/08/2024





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-028356-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats
003-01	P003 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage 517 - Sejour	Matériau fibreux de type papier peint (beige); matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / VW8U	2/2		Analyse réalisée non conclusive
003-02	P003 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage 517 - Sejour	Matériau fibreux de type papier peint (beige); matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CH9R	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **42** sur **52** Rapport du : 25/08/2024





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-028356-01

Indice n°	Référence	Description visuelle	Technique	Préparation		
	client	,	utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats
004-01	P004 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage 517 - Cuisine	Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / JGHP	2/2	8	Analyse réalisée non conclusive
004-02	P004 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage 517 - Cuisine	Matériau fibreux de type papier peint (marron) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CH9R	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **43** sur **52** Rapport du : 25/08/2024





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-028356-01

Indice n°	Référence	Description visuelle	Technique	Pr	éparation	
	client	5556 (\$150.7555)	utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats
005-01	P005 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - Couche 1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - 3eme etage 517 - Sejour	Matériau fibreux de type papier peint (marron); matériau de type peinture (gris); matériau souple fibreux de type papier, carton (beige); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP / VWSU	2/2	8	Analyse réalisée non conclusive
005-02	P005 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - 3eme etage 517 - Sejour	Matériau fibreux de type papier peint (marron); matériau de type peinture (gris); matériau souple fibreux de type papier, carton (beige); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / CH9R	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
005-03	P005 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - 3eme etage 517 - Sejour	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / VWSU	2/2	TEX	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **44** sur **52** Rapport du : 25/08/2024





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-028356-01

Indice n°	Référence	Description visuelle	Technique	Préparation		
	client	55501 ,p .1501 7552515	utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats
005-04	P005 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - 3eme etage 517 - Sejour	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / VWSU	2/2		Fibres d'amiante non détectées
005-05	P005 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - 3eme etage 517 - Sejour	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CH9R	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **45** sur **52** Rapport du : 25/08/2024





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-028356-01

Indice n°	Référence	Description visuelle	Technique	Pr	éparation	
	client		utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats
006-01	P006 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - 3eme etage 517 - Cuisine	Matériau fibreux de type papier peint (orange); matériau de type peinture (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (beige); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau de type polystyrène (blanc); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP / VWSU	2/2	6	Analyse réalisée non conclusive
006-02	P006 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - 3eme etage 517 - Cuisine	Matériau fibreux de type papier peint (orange); matériau de type peinture (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (beige); matériau semi-dur de type enduit (blanc); matériau souple fibreux de type papier, carton (marron); matériau de type polystyrène (blanc); matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / CH9R	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
006-03	P006 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - 3eme etage 517 - Cuisine	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / VWSU	2/2	TEX	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **46** sur **52** Rapport du : 25/08/2024





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-028356-01

		N° de rapport d'analyse : AR-24-l	KB-U28336	-01		
Indice n°	Référence	Description visuelle	Technique	Pr	éparation	
	client		utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats
006-04	P006 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - 3eme etage 517 - Cuisine	papier, carton (marron)	MOLP / VWSU	2/2	100	Fibres d'amiante non détectées
006-05	P006 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre - 3eme etage 517 - Cuisine	(blanc)	MET / CH9R	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P007 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage 517 - Sejour	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / CH9R	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
008-01	P008 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage 517 - Cuisine	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / CH9R	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **47** sur **52** Rapport du : 25/08/2024





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-028356-01

Indice n°	Référence	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Pro	éparation	Résultats
	client			Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	
009-01	P009 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragreage - 3eme etage 517 - Sejour	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / CH9R	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
009-02 (i)	P009 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragreage - 3eme etage 517 - Sejour	Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)(i)	MOLP / JGHP	2/2	,	Fibres d'amiante de type chrysotile
010-01	P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragreage - 3eme etage 517 - Salle de bain	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / CH9R	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **48** sur **52** Rapport du : 25/08/2024





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-028356-01

Indice n°	Référence	Description visuelle	Technique	Pr	éparation	Résultats
	client		utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	
011-01 (2)	P011 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - 3eme etage 517 - Culsine	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	MOLP / JGHP	2/2		Analyse réalisée non conclusive
011-02 (2)	P011 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - 3eme etage 517 - Cuisine	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	MET / CH9R	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-03 (2)	P011 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - 3eme etage 517 - Cuisine	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / CH9R	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **49** sur **52** Rapport du : 25/08/2024





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-028356-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique	Pré	paration	Résultats
			utilisée / Analyste	Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	
011-04	P011 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - 3eme etage 517 - Cuisine	Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris)(i)	MOLP / JGHP	2/2		Fibres d'amiante de type chrysotile

.a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **50** sur **52** Rapport du : 25/08/2024





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-028356-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats
012-01 (2)	P012 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - 3eme etage 517 - Entree	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron)	MOLP / JGHP	2/2		Analyse réalisée non conclusive
012-02 (2)	P012 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - 3eme etage 517 - Entree	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (marron)	MET / CH9R	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traîtement)	Fibres d'amiante non détectées
012-03 (2)	P012 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - 3eme etage 517 - Entree	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / CH9R	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **51** sur **52** Rapport du : 25/08/2024





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-028356-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Туре	Résultats
012-04 (2)(1)	P012 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - Couche1: Revetement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle bitumineuse + Couche5: Ragreage - 3eme etage 517 - Entree	Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc)(i)	MOLP / J6HP	2/2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
013-01	P013 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faience + Couche2: Joint de faience - Couche1: Colle de faience + Couche2: Joint de faience - 3eme etage 517 - Cuisine	Matériau de type peinture (blanc); matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MOLP / VW8U	2/2	127	Analyse réalisée non conclusive
013-02 (3)	P013 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faience + Couche2: Joint de faience - Couche1: Colle de faience + Couche2: Joint de faience - 3eme etage 517 - Cuisine	Matériau de type peinture (blanc); matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / PUU9	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-01	P014 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 3eme etage 517 - Sejour	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / PUU9	1/2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

37 analyses au laboratoire dont 19 par la technique identifiée sous le terme MET et 18 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.





1 Rue du Docteur Calmette (309LAD0303) N° de dossier : MA2407135391 Repérage amiante travaux - Page **52** sur **52** Rapport du : 25/08/2024





Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-028356-01

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un matériau de type colle (bitumineux) (noir); matériau souple (blanc); matériau semi-dur (marron) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- Un matériau souple (blanc) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (3) Description client non-cohérente avec l'échantillon physiquement présent.

Autre(s) observation(s)

(i) .es fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme: NFX 43-050: Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed. 1.2/08.05.2023.

Notes

1. Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire. - 2. Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantilloin transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et Jou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "l'ibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n' Li 1229 et est disponible sur hittps://www.renar.ro/ -7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2019-264 du 20 octobre 2019 texten° 1.81 modifié par l'Arrêté du 25 juillet 2022 (IORR n°0238 du 13 octobre 2029

Validé et autorisé par :

Andreea Cojocaru Team leader CRO007

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.







Votre interlocuteur CBT CNA
178 BOULEVARD PEREIRE 75017 PARIS

Portefeuille : 0114921220

1 01 40 68 02 02 **2 3** 01 40 68 05 00

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

Vos références

Contrat **3912280604** Référence client **0626460020**

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que:

SAS ADX GROUPE
Parc Saint Fiacre - 53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

- HYPERION Développement
- SAS EXPERTAM
- SAS GALENA
- ADX Formation
- BCTI

le contrat d'assurance Responsabilité Civile **1ère ligne n° 3912280604** et un contrat Responsabilité Civile **2ème ligne n° 3912431104**, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR



Repérage de polluants:

AMIANTE:

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les males matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

Contrôle du bâti:

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine



Energetique:

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment.

 Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)
- Assistance à la maitrise d'ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

Eau:

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



Garanties au contrat 1ère Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2ème Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ciaprès)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont:	
Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle	par expert
(tous dommages confondus)	300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés	150.000 € par sinistre
(selon extension aux conditions particulières)	200000 0 pa. 0
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité**Civile Professionnelle :

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.



Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2024 au 01/01/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **22/12/2023**

Pour la société :



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI7207 Version 002

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur PLOZNER Thomas

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Am	iante avec mention	Amiante Avec Mention (1)		
		Date d'effet : 25/03/2024 - Date d'expiration : 24/03/2031		
Am	iante sans mention	Amiante Sans Mention (1)		
		Date d'effet : 25/03/2024 - Date d'expiration : 24/03/2031		
Ene	rgie avec mention	Energie avec mention (1)		
		Date d'effet : 22/05/2024 - Date d'expiration : 21/05/2031		
Ene	rgie sans mention	Energie sans mention (1)		
		Date d'effet : 22/05/2024 - Date d'expiration : 21/05/2031		

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 22/05/2024.

Etrome lary

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTEE
DISPONIBLE SUR
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

Certification de personnes Diagnostiqueur Portée disponible sur www.icert.fr
