

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

22 SQUARE PAUL ELUARD

2

77610 FONTENAY TRESIGNY



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	22 SQUARE PAUL ELUARD 77610 FONTENAY TRESIGNY
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	RC	Porte :	2
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	31LCA0002	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	06/05/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Serge TAVARES	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	DTI3472	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	20/08/2018	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur		Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 21/05/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Serge TAVARES**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	19
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	28
ATTESTATION(S).....	31
CERTIFICAT DE COMPETENCES	32

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains et WC	Rez de chaussée	Revêtement souple	Peinture non séparable + dalle dure cassante beige	Sol	31LCA0002P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement souple	Peinture non séparable + dalle dure cassante blanche	Sol	31LCA0002P010	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Salle de bains et WC	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 1	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 2	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Placard 3	RC		OUI	CONCERNEE
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Salle de bains et WC	RC	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Périphérique s / Plaques de plâtre			Sol souple	Peinture			
Placard 1	RC	Périphérique s / Plaques de plâtre	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Peinture			
Chambre 1	RC	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Périphérique s / Plaques de plâtre			Sol souple	Peinture			
Placard 2	RC	Périphérique s / Plaques de plâtre	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Peinture			
Séjour	RC	Périphérique s / Plaques de plâtre	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Peinture			
Cuisine	RC	Périphérique s / Plaques de plâtre	Périphérique s / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Peinture			

PIECE	ETAG E	MUR1	MUR2	MUR 3	MUR 4	PLANCHE R BAS	PLANCHE R HAUT	PORTE S	FENETRE 1	FENETRE 2
Placard 3	RC	Périphériques / Plaques de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Peinture			
Entrée	RC	Périphériques / Plaques de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Sol souple	Peinture			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Salle de bains et WC	Rez de chaussée	Revêtement souple	Peinture non séparable + dalle dure cassante beige	31LCA0002P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement souple	Peinture non séparable + dalle dure cassante blanche	31LCA0002P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains et WC	Rez de chaussée	Revêtement souple	Revêtement souple vert	31LCA0002P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiant e non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains et WC	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + matériau rose non séparable	31LCA0002P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiant e non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains et WC	Rez de chaussée	Revêtement souple	Ragréage rose	31LCA0002P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiant e non détecté	RESULTAT ANALYSE

Rapport N° : 31LCA0002 06/05/2019

8/34

Version : 21/05/2019

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Revêtement souple marron	31LCA0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	31LCA0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Matériau compact beige hétérogène	31LCA0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Revêtement souple marron	31LCA0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	31LCA0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Matériau compact beige hétérogène	31LCA0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Revêtement souple marron	31LCA0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	31LCA0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Matériau compact beige hétérogène	31LCA0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Revêtement souple marron	31LCA0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	31LCA0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Matériau compact beige hétérogène	31LCA0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Revêtement souple marron	31LCA0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	31LCA0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 3	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Matériau compact beige hétérogène	31LCA0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Revêtement souple marron	31LCA0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	31LCA0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Matériau compact beige hétérogène	31LCA0002P002	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains et WC	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit beige + peinture non séparable	31LCA0002P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit beige + peinture non séparable	31LCA0002P003	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P004	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P004	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P004	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIR E	Echantillon	REPERAG E	ETAT	RESULTAT	METHOD E
Placard 1	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P00 4	Mur B	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P00 4	Mur B	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P00 4	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P00 4	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P00 4	Mur D	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P00 4	Mur C	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P00 4	Mur E	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P00 5	Mur A	DEGRADATIO N PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	Rez de chaussée	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P005	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P005	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P005	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 1	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P005	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P005	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P005	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P005	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P005	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P005	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	31LCA0002P005	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	31LCA0002P006	Sous évier	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	31LCA0002P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	31LCA0002P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	31LCA0002P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	31LCA0002P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	31LCA0002P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 3	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	31LCA0002P007	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable	31LCA0002P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable	31LCA0002P008	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable	31LCA0002P008	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable	31LCA0002P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains et WC	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable	31LCA0002P008	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains et WC	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable	31LCA0002P008	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	31LCA0002P009	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Revêtement souple beige	31LCA0002P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussé e	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	31LCA0002P010	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 31LCA0002P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LCA0002 06/05/2019	Salle de bains et WC (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple vert	06/05/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LCA0002P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LCA0002 06/05/2019	Salle de bains et WC (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + matériau rose non séparable	06/05/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LCA0002P001

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LCA0002 06/05/2019	Salle de bains et WC (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Ragréage rose	06/05/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LCA0002P001

NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LCA0002 06/05/2019	Salle de bains et WC (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Peinture non séparable + dalle dure cassante beige	06/05/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LCA0002P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LCA0002 06/05/2019	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple marron	06/05/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LCA0002P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LCA0002 06/05/2019	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	06/05/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LCA0002P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LCA0002 06/05/2019	Entrée (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Matériau compact beige hétérogène	06/05/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LCA0002P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LCA0002 06/05/2019	Salle de bains et WC (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit beige + peinture non séparable	06/05/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LCA0002P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LCA0002 06/05/2019	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	06/05/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LCA0002P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LCA0002 06/05/2019	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	06/05/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LCA0002P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LCA0002 06/05/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement bitumineux	Matériau bitumineux noir	06/05/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sous évier		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 31LCA0002P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LCA0002 06/05/2019	Séjour (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	06/05/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 31LCA0002P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LCA0002 06/05/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable	06/05/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 31LCA0002P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LCA0002 06/05/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Fibre de verre	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	06/05/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

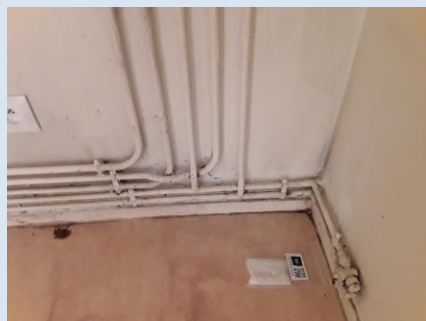

PRELEVEMENT : 31LCA0002P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LCA0002 06/05/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Revêtement souple beige	06/05/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

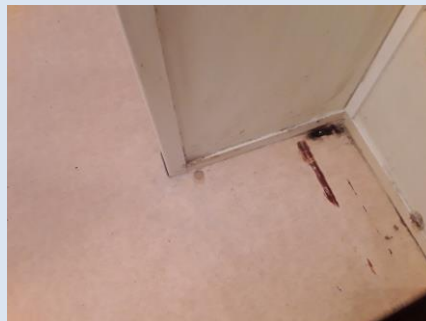

PRELEVEMENT : 31LCA0002P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LCA0002 06/05/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	06/05/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 31LCA0002P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	31LCA0002 06/05/2019	Cuisine (RC)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement souple	Peinture non séparable + dalle dure cassante blanche	06/05/2019	TAVARES Serge
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-44928 EN DATE DU 20/05/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-44928 Réf. Commande Client : 31LCA0002--01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/05/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
 - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou : - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 31LCA0002--01 - 22 SQUARE PAULELUARD 77610 FONTENAY TRESIGNY				Réf échantillon ITGA : IT071905-24947
Réf échantillon client : 31LCA0002P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains et WC. Sol Revêtement souple		Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Matériau rose / Ragréage rose / Peinture / Dalle dure cassante beige		
* Revêtement souple vert	META (1)	1	20/05/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + matériau rose non séparable	META (1)	1	20/05/2019	Amiante non détecté / -
* Ragréage rose	META (1)	1	20/05/2019	Amiante non détecté / -
* Peinture non séparable + dalle dure cassante beige	META (2)	1	18/05/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 31LCA0002--01 - 22 SQUARE PAULELUARD 77610 FONTENAY TRESIGNY				Réf échantillon ITGA : IT071905-24948
Réf échantillon client : 31LCA0002P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée. Sol Revêtement souple		Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau compact beige hétérogène		
* Revêtement souple marron	META (1)	1	18/05/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1)	1	18/05/2019	Amiante non détecté / -
* Matériau compact beige hétérogène	META (1)	1	18/05/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-44928 EN DATE DU 20/05/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 31LCA0002-01 - 22 SQUARE PAUL ELUARD 77610 FONTENAY TRESIGNY Réf échantillon client : 31LCA0002P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains et WC Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071905-24949 Description ITGA : Enduit beige / Peinture
* Enduit beige + peinture non séparable	META (1)	1	18/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 31LCA0002-01 - 22 SQUARE PAUL ELUARD 77610 FONTENAY TRESIGNY Réf échantillon client : 31LCA0002P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur D Fibre de verre				Réf échantillon ITGA : IT071905-24950 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton
* Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	META (1)	1	20/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 31LCA0002-01 - 22 SQUARE PAUL ELUARD 77610 FONTENAY TRESIGNY Réf échantillon client : 31LCA0002P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur A Fibre de verre				Réf échantillon ITGA : IT071905-24951 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton
* Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	META (1)	1	20/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 31LCA0002-01 - 22 SQUARE PAUL ELUARD 77610 FONTENAY TRESIGNY Réf échantillon client : 31LCA0002P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux				Réf échantillon ITGA : IT071905-24952 Description ITGA : Matériau bitumineux noir
* Matériau bitumineux noir	META (2)	1	17/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 31LCA0002-01 - 22 SQUARE PAUL ELUARD 77610 FONTENAY TRESIGNY Réf échantillon client : 31LCA0002P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit Peinture béton				Réf échantillon ITGA : IT071905-24953 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture
* Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META (1)	1	18/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 31LCA0002-01 - 22 SQUARE PAUL ELUARD 77610 FONTENAY TRESIGNY Réf échantillon client : 31LCA0002P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Fibre de verre				Réf échantillon ITGA : IT071905-24954 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Carton
* Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable	META (1)	2	20/05/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 31LCA0002-01 - 22 SQUARE PAUL ELUARD 77610 FONTENAY TRESIGNY Réf échantillon client : 31LCA0002P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Fibre de verre				Réf échantillon ITGA : IT071905-24955 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples / Carton / Toile fibreuse blanche
* Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable + carton non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META (1)	3	20/05/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-44928 EN DATE DU 20/05/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 31LCA0002-01 - 22 SQUARE PAUL ELUARD 77610 FONTENAY TRESIGNY		Réf échantillon ITGA : IT071905-24956		
Réf échantillon client : 31LCA0002P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture / Dalle dure cassante blanche		
* Revêtement souple beige	META (1)	1	18/05/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	META (1)	1	18/05/2019	Amiante non détecté / -
* Peinture non séparable + dalle dure cassante blanche	META (2)	1	18/05/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Flavien HOUIS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/3

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PEFC 10-31-1489 / Certifié PEFC
N° 10000109 2008-202

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.
La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
A défaut la garantie n'est pas acquise.


Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).


Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



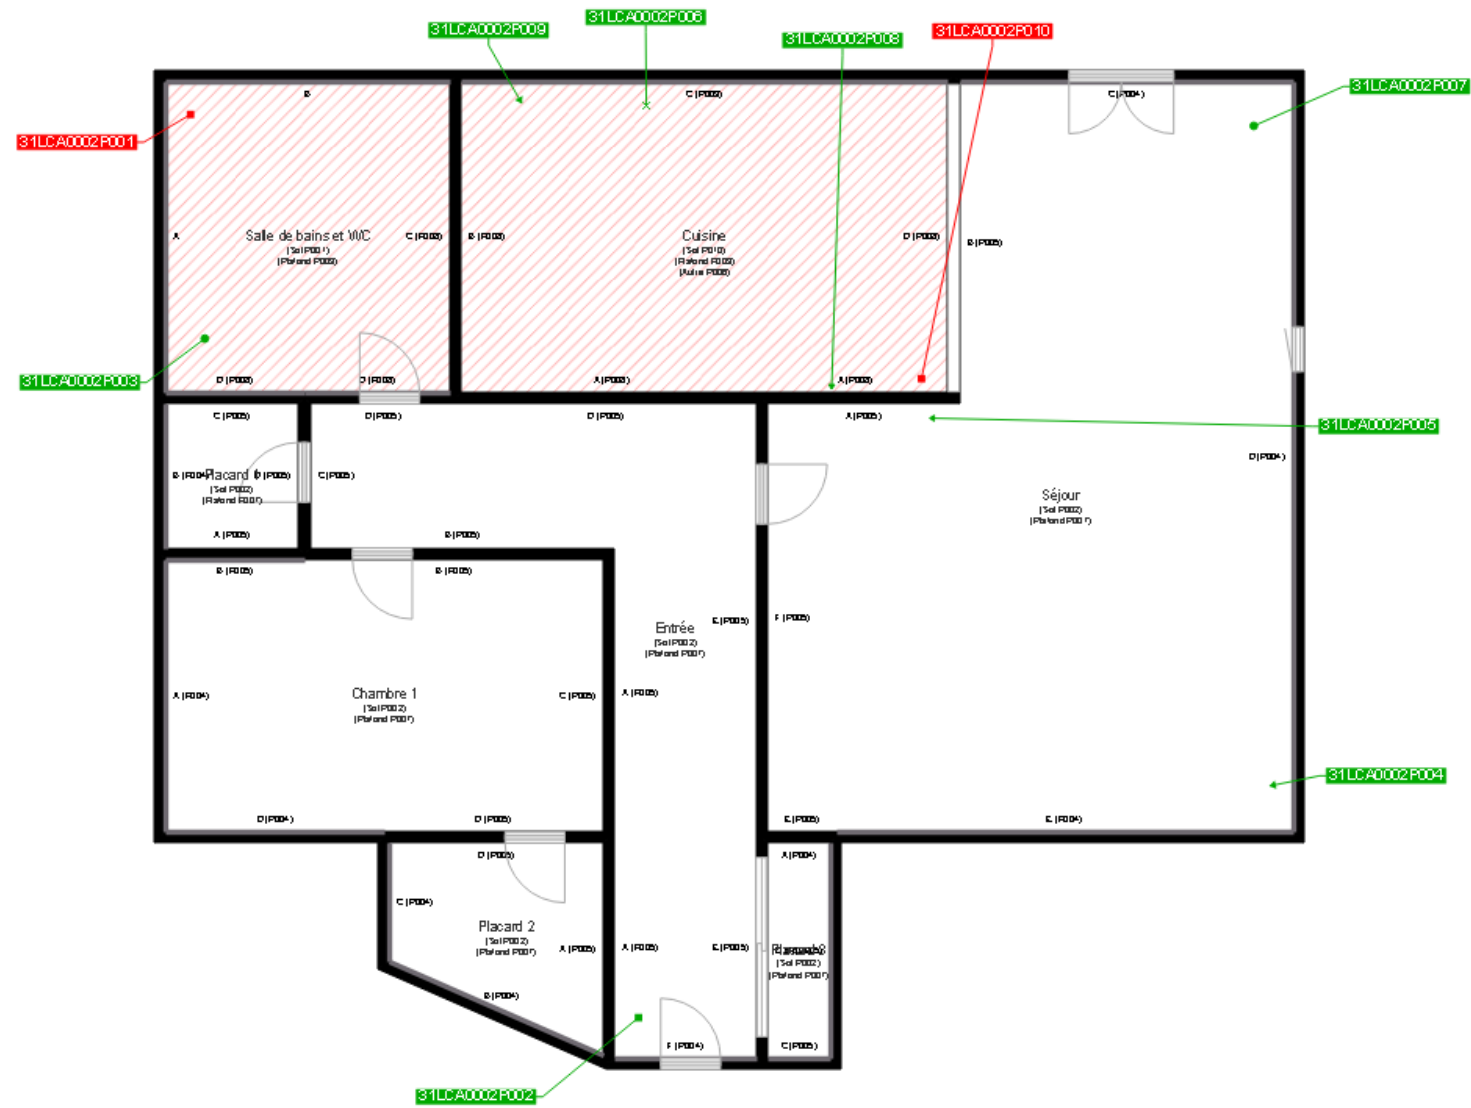

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

-  Murs amiantés
-  Prélèvements de sol amianté
-  Prélèvements de sol non amiantés
-  Prélèvements de plafond amiantés
-  Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés
-  Conduits amiantés
-  Conduits non amiantés
