

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

38 AV DU GENERAL MAUNOURY

4

77165 SAINT SOUPPLETS



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	38 AV DU GENERAL MAUNOURY 77165 SAINT SOUPPLETS
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	R+1	Porte :	4
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	411LAB0101	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	22/10/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Vincent GONZALES	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	C067-SE09-2017	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	13/11/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	Qaulit'compétences 16 rue villars - 57100 THONVILLE	Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 01/11/2019**

Cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC

Nom du responsable : **DELATTRE Olivier**

Nom du diagnostiqueur : **Vincent GONZALES**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	17
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	22
ATTESTATION(S).....	25
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	26

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

### Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. GONDOIRE PAYS FRANCE 24 COURS DES DEUX PARCS 77420 CHAMPS SUR MARNE Tél : 01 64 14 11 11 Siret : 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 24244  <b>EXPERT HABITAT INGENIERIE</b>  33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144
Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4475 1 Provenance GONDOIRE Objet DIVERS	<b>SERVICE</b> SCE GONDOIRE PDF <b>ÉMETTEUR</b> DECOSTER OLIVIER	
<b>LOCALISATION</b> Programme 411 SAINT SOUPLÈTS-RUE DU GAL DE MAUNOURY-2 Tranche 1 Ensemble B00 Escalier B Étage 01 Logement 4 Module 411LAB0101 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	<b>ADRESSE</b> 38 RUE DU GENERAL MAUNOURY 77165 ST SOUPLÈTS	

**DÉLAI D'EXÉCUTION** 30 JOURS **PÉRIODE DU** 16-10-2019 **AU** 14-11-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1A			
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET	10,00	48,00	480,00
	ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS			
<b>TOTAL H.T.</b>				485,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				97,00
<b>TOTAL T.T.C.</b>				582,00

16-10-2019 Tel gardien Monsieur IKONG: 06.86.40.91.00

AFFECTATION BUDGÉTAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : ENTLOG			
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	ANOR NOR	HONORAIRES DIAG AMIANTE		582,00

AFFECTATION ANALYTIQUE				
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT		MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	411 1 B00 B 411LAB0101 L	39715		582,00

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 24244

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre 1	R+1		OUI	CONCERNEE
Séjour / Salon	R+1		OUI	CONCERNEE
	R+1		OUI	CONCERNEE
Chambre 2	R+1		OUI	CONCERNEE
Salle de bains	R+1		OUI	CONCERNEE
	R+1		OUI	CONCERNEE
WC	R+1		OUI	CONCERNEE
Cuisine	R+1		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER		PORTES	FENETRE1	FENETRE2
						BAS	HAUT			
Entrée	R+1	Plaque de plâtre				Sol souple	Peinture			
Chambre 1	R+1	Plaque de plâtre	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre			Sol souple	Peinture			
Séjour / Salon	R+1	Plaque de plâtre	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre	Carreaux de plâtre		Carrelage	Peinture			
	R+1									
Chambre 2	R+1	Plaque de plâtre	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre			Sol souple	Peinture			
Salle de bains	R+1	Plaque de plâtre	Carreaux de plâtre	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre		Carrelage	Peinture			

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	R+1									
WC	R+1	Plaque de plâtre	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre			Carrelage	Peinture			
Cuisine	R+1	Plaque de plâtre	Porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre			Carrelage	Peinture			

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P001	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P001	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	411LAB0101P002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	411LAB0101P002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	R+1	Papier peint	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Papier peint	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Papier peint	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	R+1	Peinture	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	R+1	Peinture	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	R+1	Peinture	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour / Salon	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour / Salon	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P005	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc	411LAB0101P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc	411LAB0101P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc	411LAB0101P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc	411LAB0101P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc	411LAB0101P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc	411LAB0101P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc	411LAB0101P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc	411LAB0101P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc	411LAB0101P006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc	411LAB0101P006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc	411LAB0101P006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc	411LAB0101P006	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc	411LAB0101P006	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	R+1	Peinture	Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Peinture	Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Peinture	Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Peinture	Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	411LAB0101P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	R+1	Revêtement de sols	Revêtement souple gris	411LAB0101P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 2	R+1	Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau gris non séparable + matériau blanc non séparable	411LAB0101P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	R+1	Revêtement de sols	Revêtement souple gris	411LAB0101P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	R+1	Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau gris non séparable + matériau blanc non séparable	411LAB0101P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Revêtement de sols	Revêtement souple gris	411LAB0101P009	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	R+1	Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau gris non séparable + matériau blanc non séparable	411LAB0101P009	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage



## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 411LAB0101P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	411LAB0101 22/10/2019		Salle de bains (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	22/10/2019	GONZALES Vincent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 411LAB0101P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	411LAB0101 22/10/2019		Salle de bains (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	22/10/2019	GONZALES Vincent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 411LAB0101P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	411LAB0101 22/10/2019		Salle de bains (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Papier peint	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	22/10/2019	GONZALES Vincent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 411LAB0101P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	411LAB0101 22/10/2019		Salle de bains (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	22/10/2019	GONZALES Vincent
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



PRELEVEMENT : 411LAB0101P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	411LAB0101 22/10/2019		Séjour / Salon (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	22/10/2019	GONZALES Vincent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 411LAB0101P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	411LAB0101 22/10/2019		Séjour / Salon (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc	22/10/2019	GONZALES Vincent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 411LAB0101P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	411LAB0101 22/10/2019		Séjour / Salon (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Papier peint	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	22/10/2019	GONZALES Vincent
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**




PRELEVEMENT : 411LAB0101P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	411LAB0101 22/10/2019		Séjour / Salon (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac	22/10/2019	GONZALES Vincent
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**




PRELEVEMENT : 411LAB0101P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	411LAB0101 22/10/2019		Chambre 2 (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Revêtement souple gris	22/10/2019	GONZALES Vincent
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 411LAB0101P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	411LAB0101 22/10/2019		Chambre 2 (R+1)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Revêtement de sols	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau gris non séparable + matériau blanc non séparable	22/10/2019	GONZALES Vincent
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tel : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-97121 EN DATE DU 31/10/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
 Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE POISSY 33 bis boulevard Gambetta 3ème étage 78300 POISSY	Réf. Commande ITGA : IT0719-97121 Réf. Commande Client : 411LAB0101-01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 28/10/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 411LAB0101-01 - 38 AV DU GENERAL MAUNOURY 77165 SAINT SOUPLETS Réf échantillon client : 411LAB0101P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur A Papier peint				
	Réf échantillon ITGA : IT071910-61121 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac			
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	31/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 411LAB0101-01 - 38 AV DU GENERAL MAUNOURY 77165 SAINT SOUPLETS Réf échantillon client : 411LAB0101P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur B Papier peint				
	Réf échantillon ITGA : IT071910-61122 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité			
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	31/10/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 08

Page 1/3

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-97121 EN DATE DU 31/10/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : 411LAB0101-01 - 38 AV DU GENERAL MAUNOURY 77165 SAINT SOUPLETS Réf échantillon client : 411LAB0101P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur E Papier peint				Réf échantillon ITGA : IT071910-61123 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Carton / Matériau plâtré blanc en vrac
* Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtré blanc en vrac	META (1)	1	31/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 411LAB0101-01 - 38 AV DU GENERAL MAUNOURY 77165 SAINT SOUPLETS Réf échantillon client : 411LAB0101P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071910-61124 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtré blanc en vrac
* Peintures multiples non séparable + matériau plâtré blanc en vrac	META (1)	1	30/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 411LAB0101-01 - 38 AV DU GENERAL MAUNOURY 77165 SAINT SOUPLETS Réf échantillon client : 411LAB0101P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Salon Mur D Papier peint				Réf échantillon ITGA : IT071910-61125 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Matériau plâtré blanc en vrac
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtré blanc en vrac	META (1)	1	30/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 411LAB0101-01 - 38 AV DU GENERAL MAUNOURY 77165 SAINT SOUPLETS Réf échantillon client : 411LAB0101P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Salon Mur C Papier peint				Réf échantillon ITGA : IT071910-61126 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Carton / Matériau plâtré blanc
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtré blanc	META (1)	1	30/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 411LAB0101-01 - 38 AV DU GENERAL MAUNOURY 77165 SAINT SOUPLETS Réf échantillon client : 411LAB0101P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Salon Mur B Papier peint				Réf échantillon ITGA : IT071910-61127 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Carton / Matériau plâtré blanc en vrac
* Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau plâtré blanc en vrac	META (1)	1	31/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 411LAB0101-01 - 38 AV DU GENERAL MAUNOURY 77165 SAINT SOUPLETS Réf échantillon client : 411LAB0101P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Salon Plafond Peinture				Réf échantillon ITGA : IT071910-61128 Description ITGA : Peinture / Carton / Matériau plâtré blanc en vrac
* Peinture non séparable + carton non séparable + matériau plâtré blanc en vrac	META (1)	1	31/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 411LAB0101-01 - 38 AV DU GENERAL MAUNOURY 77165 SAINT SOUPLETS Réf échantillon client : 411LAB0101P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Revêtement de sols				Réf échantillon ITGA : IT071910-61129 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris / Matériau blanc
* Revêtement souple gris	META (1)	1	31/10/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau gris non séparable + matériau blanc non séparable	META (1)	1	31/10/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164-01 rev 08

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-97121 EN DATE DU 31/10/2019  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
-------------------	--	---------------------------	-------------------	-----------------------------

Validé par : Estelle RUBAUD - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA164-01 rev 08

Page 3/3



# ATTESTATION(S)



## Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :  
**SOCOTEC DIAGNOSTIC, 1 rue des Dardanelles 75017 Paris**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018. Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p><b>AMIANTE :</b>            ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE            DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE            DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES            CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )            CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )            REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION            REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES</p> <p><b>PLOMB :</b>            DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU            CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )            DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )            RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION</p> <p><b>ETAT PARASITAIRE :</b>            ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES            ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETES, LYCTUS )            INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALUR )</p> <p><b>MESURES :</b>            MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN            CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.</p> <p><b>AUTRES :</b>            ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ            ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )            DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE            DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p><b>ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.</b>            ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.            DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF            DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF            ETAT DES LIEUX LOCATIFS            DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE            CERTIFICAT DE DECEANCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION            DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO            INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES            THERMOGRAPHIE INFRAROUGE            DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.            DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE            DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION            DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL            DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES- LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.            DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES            EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )            ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION            CENTRE DE FORMATION            MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE            DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR            VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES            VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ            VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGIS DE LEVAGE ET DE CHANTIER            DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE            CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX            RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS</p>
---	--

**La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.**

La présente attestation est valable du 6 SEPTEMBRE 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Le Bouscat, le 06/09/2019  
 Pour la compagnie

VD ASSOCIES  
 P.O. 81, Bd Pierre Pionnier  
 33110 LE BOUSCAT  
 RCS - 794 672 238 0845 - 03 01 02 20  
 TEL - 05 56 50 95 75 -

# CERTIFICAT DE COMPETENCES

## CERTIFICATION DE DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER



Décerné à : **GONZALES Vincent** sous le numéro : **C067-SE09-2017**

DOMAINE (S) CONCERNE (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 21/12/2017 Au 20/12/2022
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 21/12/2017 Au 20/12/2022
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 13/11/2017 Au 12/11/2022
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 13/11/2017 Au 12/11/2022
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

\* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des constats de risque d'exposition au plomb ou agées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 25 Juin 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et l'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification. Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 18 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 05 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009, 2 décembre 2011 et 10 Août 2015.

Délicivré à Thionville, le 21/12/2017  
Pour la société Saint Honoré audit qui délivre la  
marque Qualit'Compétences  
LAROZ Soufian, Responsable Certification




Saint Honoré Audit représenté par sa marque  
Qualit'Compétences est accrédité sous le numéro 4-0569  
Portée disponible sur [www.sofrac.fr](http://www.sofrac.fr)



SAINT HONORE AUDIT - 16, rue Villars - 57 100 THIONVILLE  
Tél : 01 85 09 01 40 - mail : [contact@qualit-competeues.com](mailto:contact@qualit-competeues.com)  
SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville T1 788 573 543 - N° de gestion 2015 B 12- Code NAF : 8559A

<b>PLANCHE DE REPÉRAGE</b>	Zone : R+1	Vue de dessus
Auteur : GONZALES Vincent	Bien : 411LAB0101 - 4 38 AV DU GENERAL MAUNOURY 77165 SAINT SOUPPLETS	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

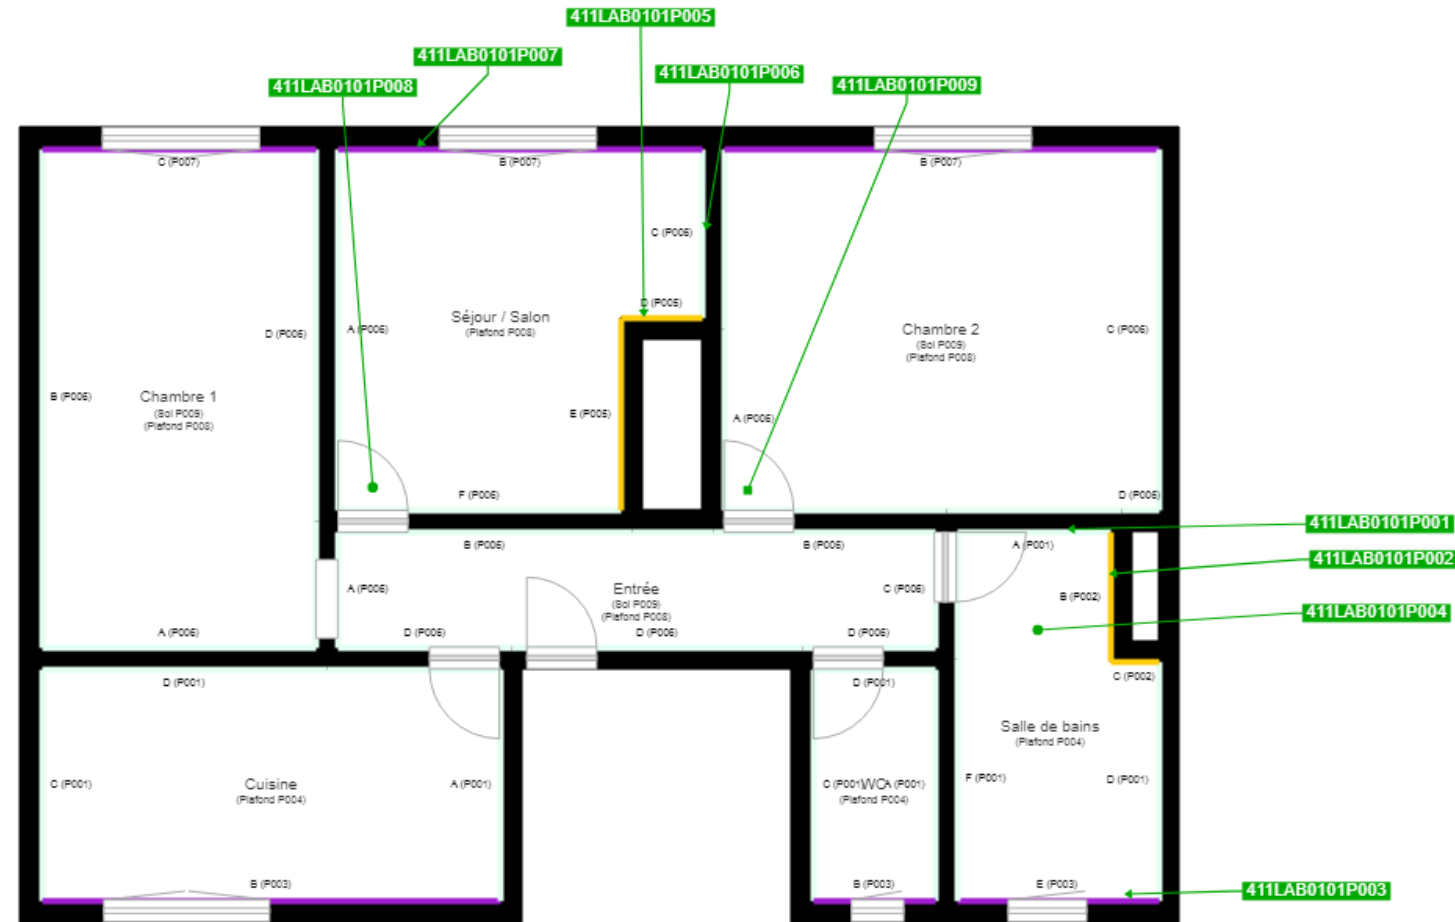

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	

	Murs amiantés
	Prélèvements de sol amianté
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafond amiantés
	Prélèvements de plafond non amiantés
	Prélèvements de mur amiantés
	Prélèvements de mur non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sols amiantés
	Plafonds amiantés
	Sols et plafonds amiantés
	Conduits amiantés
	Conduits non amiantés
