

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

19 RUE P. ET M. CURIE

77720 MORMANT



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------|---|
| Nature du bâtiment : | LOGEMENTS COLLECTIFS | Adresse : | 19 RUE P. ET M. CURIE 77720 MORMANT |
| Cat. Du bâtiment : | | Bâtiment : | |
| Etage : | | Porte : | |
| Ref Cadastrale : | NC | Propriété de : | OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN |

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

| | | | |
|-----------|--|----------------------------|--|
| Nom : | OPH77 | Documents remis : | |
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN | Moyens mis à disposition : | |

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| RAPPORT N° : | 48LAN0201 | Laboratoire d'Analyses : | ITGA |
| Repérage réalisé le : | 21/02/2018 | Adresse laboratoire : | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX |
| Accompagnateur : | | Numéro d'accréditation : | 1-5967 |
| Par : | Mickaël JULIEN | Organisme d'assurance professionnelle : | AXA France |
| N° certificat : | CPDI 4129 | Adresse assurance : | 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX |
| Date d'obtention : | 01/01/2017 | N° de contrat d'assurance : | 10063271004 |
| Organisme certificateur | I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE | Date de validité : | 31/12/2018 |

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 05/03/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : 48LAN0201 21/02/2018

Version : 05/03/2018

2/33

C\ SOMMAIRE

Table des matières

| | |
|---|----|
| A \ INFORMATIONS GENERALES | 2 |
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT | 2 |
| A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE | 2 |
| A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION..... | 2 |
| B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR | 2 |
| C \ SOMMAIRE | 3 |
| D \ CONCLUSIONS | 4 |
| E \ PROGRAMME DE REPERAGE | 4 |
| F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 7 |
| G \ RAPPORTS PRECEDENTS..... | 7 |
| H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE | 8 |
| ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES..... | 18 |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES..... | 27 |
| ATTESTATION(S)..... | 31 |
| CERTIFICAT DE COMPETENCES | 32 |

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-----------|-------|--------------|---|----------|---------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Chambre 2 | | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable | Sol | 48LAN0201P001 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée | | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire | Sol | 48LAN0201P004 | RESULTAT ANALYSE | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Chambre 2 | | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable | Sol | 48LAN0201P001 | ZSO | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée | | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire | Sol | 48LAN0201P004 | ZSO | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

| PIECE | ETAGE | STATUT DE VISITE |
|-------|-------|------------------|
| NEANT | | |

Liste des éléments non inspectés et justification

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | REPERAGE | RESULTAT |
|-------|-------|----------|----------|----------|
| NEANT | | | | |

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

| PIECES CONCERNEES | PERIMETRE DU REPERAGE | REPERAGE | TRAVAUX | ELEMENTS | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES |
|-------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------------|
| | LOGEMENTS COLLECTIFS | | Selon BT | | | |

| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 | | PAGE N° 1 |
|---|---|---|
| NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE SENART Les Arcades - 2 rue Haute 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Tél : 01 64 19 19 90 Fax : 01 60 63 55 26 Siret : 27770001900015 | | BON DE TRAVAUX N° 2018 2494 EXPERT HABITAT INGENIERIE 21 RUE D'ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME Téléphone 0321734144 |
| Réf. fournisseur F / 5149 Marché n° 2017 4474 1 Provenance MELUN SENART Objet DIVERS | SERVICE SENART Techniciens EMETTEUR ERNST ERIC | |
| LOCALISATION Programme 48 MORMANT - R. P ET M. CURIE Tranche 1 Ensemble D000 Escalier AN Étage 02 Logement 1 Module 48LAN0201 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN | ADRESSE 19 RUE P. ET M. CURIE 77720 MORMANT | |

DELAI D'EXECUTION 15 JOURS **PERIODE DU** 07-02-2018 AU 21-02-2018

| ARTICLE | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE H.T. | TOTAL H.T. |
|-----------------------------|---|----------|--------------------|------------|
| AM45 | REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| AM75 | D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS PEINTURE+SOL DANS CUISINE+CH2+ENTRÉE + CHANGEMENT D'EVIER+FAIENCE CUISINE TEL GARDIEN POUR CLÉ MR HAVRET 0689409197 | 1,00 | 48,00 | 192,00 |
| TOTAL H.T. | | | | 197,00 |
| H.T. ACTUALISE | | | | |
| COEFFICIENT REGIONAL | | | | |
| RABAIS | | | | |
| TOTAL H.T. | | | | |
| T.V.A. 20,00 % | | | | 39,40 |
| TOTAL T.T.C. | | | | 236,40 |



| AFFECTATION BUDGÉTAIRE | | CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI | | | |
|------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| CODE BUDGET | RUBRIQUE | INSTANCES | LIBELLE DU POSTE BUDGÉTAIRE | | MONTANT T.T.C. |
| 1 HONAMIA | A760 | SENT | SNTA | HONORAIRES DIAG AMIANTE | 236,40 |

| AFFECTATION ANALYTIQUE | | | | |
|------------------------|----------|-----------------------|---------------------|----------------|
| CODE BUDGET | RUBRIQUE | RÉFÉRENCES PATRIMOINE | RÉFÉRENCES OCCUPANT | MONTANT T.T.C. |
| 1 HONAMIA | 48 1 | D000 AN 48LAN0201 | L 9927471 | 236,40 |

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 2494

EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Plinthes carrelage/,Sol sous meuble d'evier/

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

| PIECE | ETAGE | JUSTIFICATION | VISITE | TRAVAUX |
|-----------------|-------|---------------|--------|-----------|
| Placard 1 | | | OUI | CONCERNEE |
| Débarras | | | OUI | CONCERNEE |
| Entrée | | | OUI | CONCERNEE |
| Chambre 1 | | | OUI | CONCERNEE |
| Placard 2 | | | OUI | CONCERNEE |
| WC | | | OUI | CONCERNEE |
| Gaine technique | | | OUI | CONCERNEE |
| Chambre 2 | | | OUI | CONCERNEE |
| Salle de bains | | | OUI | CONCERNEE |
| Cuisine | | | OUI | CONCERNEE |
| Séjour | | | OUI | CONCERNEE |

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| PIECE | MUR1 | MUR2 | MUR3 | MUR4 | PLANCHER BAS | PLANCHER HAUT | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|--------------|---------------|------------|----------|----------|
| Placard 1 | Brique / Enduit | Béton | | | Dalle de sol | Enduit | BOIS | | |
| Débarras | Béton | Brique / Enduit | | | Dalle de sol | Enduit | BOIS | | |
| Entrée | Brique / Enduit | Béton | | | Dalle de sol | Bois | METALLIQUE | | |
| Chambre 1 | Béton | Brique / Enduit | | | Dalle de sol | Enduit | BOIS | PVC | |
| Placard 2 | Béton | Brique / Enduit | | | Dalle de sol | Enduit | PVC | | |
| WC | Béton | Brique / Enduit | | | Sol souple | Enduit | BOIS | | |
| Gaine technique | | | | | | | | | |
| Chambre 2 | Brique / Enduit | Béton | | | Dalle de sol | Enduit | | PVC | |
| Salle de bains | Brique / Enduit | Béton | | | Sol souple | Enduit | BOIS | | |
| Cuisine | Béton | Bois | Brique / Enduit | | Dalle de sol | Enduit | BOIS | PVC | |
| Séjour | Brique / Enduit | Béton | | | Dalle de sol | Enduit | BOIS | PVC | |

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

Rapport N° : 48LAN0201 21/02/2018

Version : 05/03/2018

8/33

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|--------------|---|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|---------|
| Chambre 2 | | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable | 48LAN0201P001 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |
| Entrée | | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire | 48LAN0201P004 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | ZSO |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT |
|-----------|-------|--------------|---|---------------|----------|-----------------------|----------------------------------|
| Chambre 2 | | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable | 48LAN0201P001 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |
| Entrée | | Dalle de sol | Colle bitumineuse noire | 48LAN0201P004 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|--------------|---|---------------|----------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Chambre 2 | | Dalle de sol | Revêtement cassant beige + matériau compact gris hétérogène | 48LAN0201P001 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Chambre 2 | | Enduit | Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable | 48LAN0201P002 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Chambre 2 | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 48LAN0201P003 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Entrée | | Dalle de sol | Dalle dure cassante grise | 48LAN0201P004 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

| PIECE | ETAG E | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIR E | Echantillon | REPERAG E | ETAT | RESULTAT | METHOD E |
|---------|--------|--------------|---|---------------|-----------|------------------------|--------------------------|------------------|
| Entrée | | Dalle de sol | Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable | 48LAN0201P004 | Sol | DEGRADATIO N PARTIELLE | Fr3:Amiant e non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Entrée | | Dalle de sol | Matériau compact gris hétérogène | 48LAN0201P004 | Sol | DEGRADATIO N PARTIELLE | Fr4:Amiant e non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Entrée | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable | 48LAN0201P005 | Mur F | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine | | Dalle de sol | Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable + matériau compact gris hétérogène | 48LAN0201P006 | Sol | DEGRADATIO N PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 48LAN0201P007 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|-----------------------|---|---------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Cuisine | | Enduit | Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable | 48LAN0201P008 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable | 48LAN0201P009 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine | | Revêtement bitumineux | Tampon bitumineux noir | 48LAN0201P011 | Sous évier | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine | | Faïence 1 | Colle beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + couche plâtreuse blanche + joint cassant blanc + carrelage | 48LAN0201P010 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Chambre 2 | | Dalle de sol | Revêtement cassant beige + matériau compact gris hétérogène | 48LAN0201P001 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 2 | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 48LAN0201P003 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Dalle de sol | Dalle dure cassante grise | 48LAN0201P004 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Fr1:Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Dalle de sol | Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable | 48LAN0201P004 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Fr3:Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|--------------|---|---------------|----------|-----------------------|-------------------------|---------|
| Entrée | | Dalle de sol | Matériau compact gris hétérogène | 48LAN0201P004 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Fr4:Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Dalle de sol | Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable + matériau compact gris hétérogène | 48LAN0201P006 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 48LAN0201P007 | Plafond | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit | Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable | 48LAN0201P002 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit | Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable | 48LAN0201P002 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit | Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable | 48LAN0201P002 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 2 | | Enduit | Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable | 48LAN0201P002 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|--------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Chambre 2 | | Enduit | Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable | 48LAN0201P002 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable | 48LAN0201P005 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable | 48LAN0201P005 | Mur E | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Entrée | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable | 48LAN0201P005 | Mur F | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-----------|-------|--------------|--|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Chambre 2 | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable | 48LAN0201P005 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Chambre 2 | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable | 48LAN0201P005 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit | Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable | 48LAN0201P008 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable | 48LAN0201P009 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable | 48LAN0201P009 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|---------|-------|-----------|---|---------------|----------|----------|---------------------|---------|
| Cuisine | | Faïence 1 | Colle beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + couche plâtreuse blanche + joint cassant blanc + carrelage | 48LAN0201P010 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Faïence 1 | Colle beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + couche plâtreuse blanche + joint cassant blanc + carrelage | 48LAN0201P010 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

| PRELEVEMENT : 48LAN0201P001 | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 48LAN0201 21/02/2018 | | Chambre 2 |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol | Revêtement cassant beige + matériau compact gris hétérogène | 21/02/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Fr1:Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 48LAN0201P001 | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 48LAN0201 21/02/2018 | | Chambre 2 |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol | Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable | 21/02/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | |

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 48LAN0201P002

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|---------------|---|---------------------|--------------------|
| OPH77 | 48LAN0201 21/02/2018 | Chambre 2 | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit | Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable | 21/02/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur A | | Amiante non détecté | |


EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 48LAN0201P003

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|---------------|--|---------------------|--------------------|
| OPH77 | 48LAN0201 21/02/2018 | Chambre 2 | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 21/02/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafond | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT

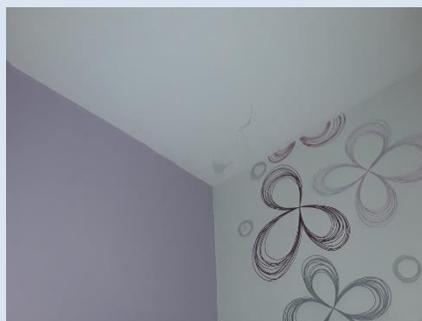

| PRELEVEMENT : 48LAN0201P004 | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 48LAN0201 21/02/2018 | Entrée | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol | Dalle dure cassante grise | 21/02/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Fr1:Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 48LAN0201P004 | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 48LAN0201 21/02/2018 | Entrée | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol | Colle bitumineuse noire | 21/02/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Fr2:Amiante détecté (Chrysotile) | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 48LAN0201P004 | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 48LAN0201 21/02/2018 | Entrée | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol | Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable | 21/02/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Fr3:Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 48LAN0201P004 | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 48LAN0201 21/02/2018 | Entrée | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol | Matériau compact gris hétérogène | 21/02/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Fr4:Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 48LAN0201P005 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 48LAN0201 21/02/2018 | Entrée | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable | 21/02/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur F | | Amiante non détecté | |
| EMPLACEMENT | | | |




| PRELEVEMENT : 48LAN0201P006 | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 48LAN0201 21/02/2018 | Cuisine | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Dalle de sol | Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable + matériau compact gris hétérogène | 21/02/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 48LAN0201P007 | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 48LAN0201 21/02/2018 | Cuisine | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 21/02/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Plafond | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT

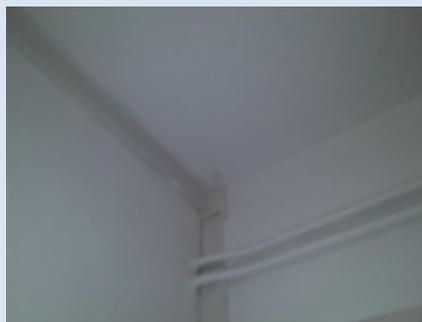

PRELEVEMENT : 48LAN0201P008

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|---------------|--|---------------------|--------------------|
| OPH77 | 48LAN0201 21/02/2018 | Cuisine | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit | Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable | 21/02/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur C | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 48LAN0201P009

| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
|---------------|---|---------------------|--------------------|
| OPH77 | 48LAN0201 21/02/2018 | Cuisine | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable | 21/02/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur A | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 48LAN0201P010 | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 48LAN0201 21/02/2018 | Cuisine | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Faïence 1 | Colle beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + couche plâtreuse blanche + joint cassant blanc + carrelage | 21/02/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Mur D | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT

PHOTO NON DISPONIBLE

| PRELEVEMENT : 48LAN0201P011 | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 48LAN0201 21/02/2018 | Cuisine | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement bitumineux | Tampon bitumineux noir | 21/02/2018 | JULIEN Mickaël |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sous évier | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-23061 EN DATE DU 03/03/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

| | |
|---|--|
| Cliant : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI | Réf. Commande ITGA : IT0718-23061 Réf. Commande Client : 48LAN0201-01 |
|---|--|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 28/02/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
ou
Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|----------------------|--------------------|----------------|--|
| Réf dossier client : 48LAN0201-01 - 19 RUE P. ET M. CURIE 77720 MORMANT Réf échantillon client : 48LAN0201P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Dalle de sol | | | | Réf échantillon ITGA : IT071802-57693 Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène |
| ▫ Revêtement cassant beige + matériau compact gris hétérogène | META | 1 | 02/03/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▫ Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable | MOLP | 2 | 01/03/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| Réf dossier client : 48LAN0201-01 - 19 RUE P. ET M. CURIE 77720 MORMANT Réf échantillon client : 48LAN0201P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Mur A Enduit | | | | Réf échantillon ITGA : IT071802-57694 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture |
| ▫ Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 02/03/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 48LAN0201-01 - 19 RUE P. ET M. CURIE 77720 MORMANT Réf échantillon client : 48LAN0201P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Plafond Enduit béton | | | | Réf échantillon ITGA : IT071802-57695 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |
| ▫ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/03/2018 | Amiante non détecté / - |

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-23061 EN DATE DU 03/03/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|---|----------------------|---|----------------|---|
| Réf dossier client : 48LAN0201-01 - 19 RUE P. ET M. CURIE 77720 MORMANT Réf échantillon client : 48LAN0201P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Sol Dalle de sol | | | | |
| | | Réf échantillon ITGA : IT071802-57696 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire / Ragrée gris / Sous couche de ragrée blanche en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène | | |
| ▫ Dalle dure cassante grise | META | 1 | 02/03/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▫ Colle bitumineuse noire | MOLP | 2 | 01/03/2018 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile |
| ▫ Ragrée gris + sous couche de ragrée blanche en faible quantité non séparable | META | 1 | 02/03/2018 | Amiante non détecté / - |
| ▫ Matériau compact gris hétérogène | META | 1 | 02/03/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 48LAN0201-01 - 19 RUE P. ET M. CURIE 77720 MORMANT Réf échantillon client : 48LAN0201P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur F Enduit béton | | | | |
| | | Réf échantillon ITGA : IT071802-57697 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac / Toile fibreuse blanche / Peinture | | |
| ▫ Enduit plâtreux blanc en vrac + enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 02/03/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 48LAN0201-01 - 19 RUE P. ET M. CURIE 77720 MORMANT Réf échantillon client : 48LAN0201P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol | | | | |
| | | Réf échantillon ITGA : IT071802-57698 Description ITGA : Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrée gris / Sous couche de ragrée beige / Matériau compact gris hétérogène | | |
| ▫ Revêtement cassant gris + colle polymère incolore non séparable + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragrée gris + sous couche de ragrée beige non séparable + matériau compact gris hétérogène | META | 2 | 03/03/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 48LAN0201-01 - 19 RUE P. ET M. CURIE 77720 MORMANT Réf échantillon client : 48LAN0201P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit béton | | | | |
| | | Réf échantillon ITGA : IT071802-57699 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture | | |
| ▫ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META | 1 | 02/03/2018 | Amiante non détecté / - |
| Réf dossier client : 48LAN0201-01 - 19 RUE P. ET M. CURIE 77720 MORMANT Réf échantillon client : 48LAN0201P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit | | | | |
| | | Réf échantillon ITGA : IT071802-57700 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peintures multiples | | |
| ▫ Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable | META | 1 | 02/03/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-23061 EN DATE DU 03/03/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|--------------------|----------------|--|
| Ref dossier client : 48LAN0201-01 - 19 RUE P. ET M. CURIE 77720 MORMANT Ref échantillon client : 48LAN0201P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit béton | | | | Ref échantillon ITGA : IT071802-57701 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peinture |
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable | META | 1 | 02/03/2018 | Amiante non détecté / - |
| Ref dossier client : 48LAN0201-01 - 19 RUE P. ET M. CURIE 77720 MORMANT Ref échantillon client : 48LAN0201P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sous évier Revêtement bitumineux | | | | Ref échantillon ITGA : IT071802-57702 Description ITGA : Tampon bitumineux noir |
| ▶ Tampon bitumineux noir | META | 1 | 02/03/2018 | Amiante non détecté / - |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 3/3



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-23062 EN DATE DU 02/03/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

| | |
|---|--|
| Client : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE- AGENCE IDF (COMPTE MATERIAUX) 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI | Ref. Commande ITGA : IT0718-23062 Ref. Commande Client : 48LAN0201-02 |
|---|--|

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 28/02/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante |
|--|----------------------|---|----------------|---------------------------|
| Ref dossier client : 48LAN0201-02 - 19 RUE P. ET M. CURIE 77720 MORMANT | | Ref échantillon ITGA : IT071802-57703 | | |
| Ref échantillon client : 48LAN0201P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Falence 1 | | Description ITGA : Colle beige / Toile fibreuse blanche / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc / Carrelage | | |
| ☐ Colle beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + couche plâtreuse blanche + joint cassant blanc + carrelage | META | 1 | 02/03/2018 | Amiante non détecté / - |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/1

ATTESTATION(S)



réinventons / notre métier



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :

EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES MISSIONS REALISEES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

- ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
- CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
- CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
- REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
- DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
- DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
- RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
- ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
- ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
- INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
- MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
- CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004-479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM7)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
- ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.
- DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
- CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
- DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE- MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
- THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
- DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
- DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
- DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
- DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code. L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constitué de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation. A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

VD ASSOCIES
81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 10-31-1483 / Contrôle PEFC
UNE NORD 17 22 20105 861

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

| | |
|-----------------------------|--|
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021 |
| DPE individuel | Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021 |
| Electricité | Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021 |
| Gaz | Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022 |
| Plomb | Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D et des matériaux et produits de la liste E dans les bâtiments autres que ceux mentionnés ci-dessous.

Missions de repérage des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D et des matériaux et produits de la liste E dans les immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 5, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 20 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les missions courtes à l'issue des travaux de travaux de construction.

Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des activités de risque d'exposition au plomb, des diagnostics de risque d'exposition au plomb des personnes ou des conseils après travaux en plomb et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques exerçant des missions de repérage, d'installation physique de l'état de conservation des matériaux et produits mentionnés de l'annexe et d'inspection visuelle dans les immeubles bâtis et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 22 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la performance des bâtiments et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 18 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'évaluation de leur conformité de la réglementation thermique et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 3 août 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D et des matériaux et produits de la liste E dans les bâtiments autres que ceux mentionnés ci-dessous et les critères d'attribution des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B et des matériaux et produits de la liste C et des matériaux et produits de la liste D et des matériaux et produits de la liste E dans les bâtiments autres que ceux mentionnés ci-dessous et les critères d'attribution des organismes de certification



I.Cert
Institut de Certification


Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



COFRAC
ACCREDITATION
N° 4402
LABORATOIRES
D'ESSAIS
D'INSTRUMENTATION
ET DE RESSOURCES

CPE DI DR 11 rev 13

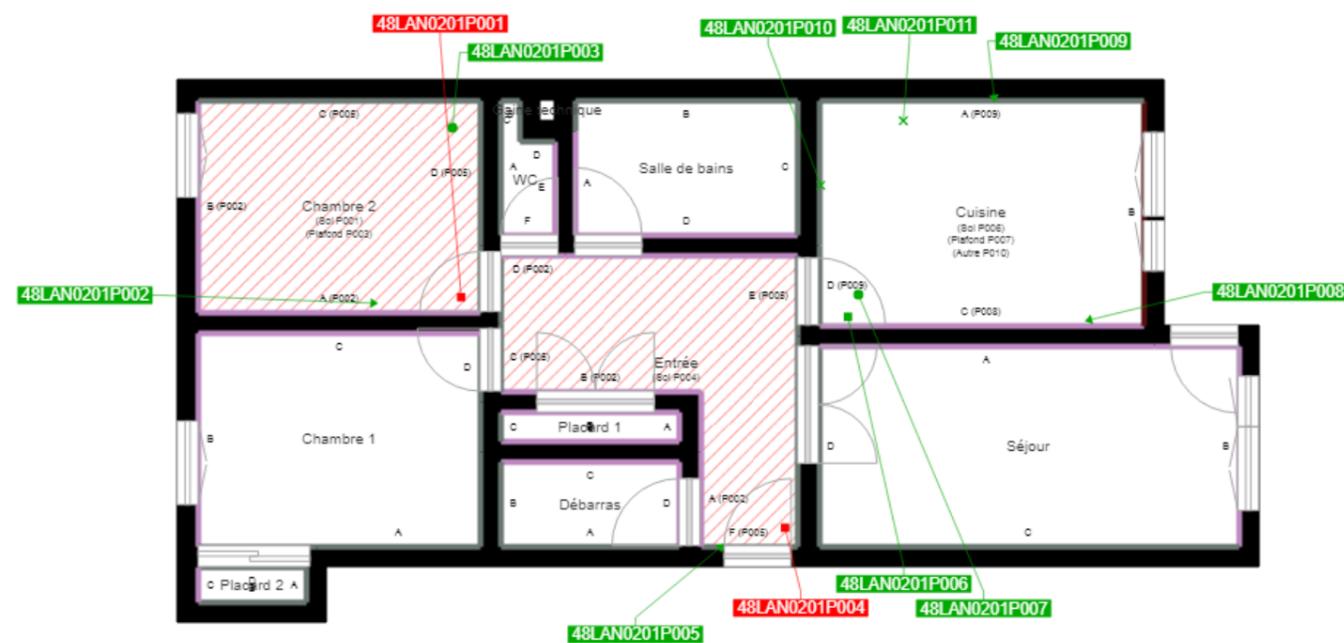

| | |
|--|--|
| | Murs périphériques / Plaques de plâtre |
| | Murs Bois |
| | Murs Brique |
| | Murs Béton brut |
| | Cloisons Plaques de plâtre |
| | Murs carreaux de plâtre |
| | Murs Béton / Enduit |
| | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre |
| | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
| | Torchis |
| | Murs Amiantés |
| | Murs Brique / Enduit |
| | Murs Brique plâtrière |

- Prélèvements de sol amiantés
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafonds amiantés
- Prélèvements de plafonds non amiantés
- Prélèvements de murs amiantés
- Prélèvements de murs non amiantés
- Autres types de prélèvements amiantés
- Autres types de prélèvements non amiantés
- Sol amianté
- Plafond amianté
- Sol et Plafond amiantés
