

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

12 SQUARE DE LA MADELEINE

77220 TOURNAN EN BRIE



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

|                      |                      |                |                                                    |
|----------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Nature du bâtiment : | LOGEMENTS COLLECTIFS | Adresse :      | 12 SQUARE DE LA MADELEINE<br>77220 TOURNAN EN BRIE |
| Cat. Du bâtiment :   |                      | Bâtiment :     |                                                    |
| Etage :              |                      | Porte :        |                                                    |
| Ref Cadastrale :     | NC                   | Propriété de : | OPH77<br>10 AVENUE CHARLES PEGUY<br>77000 MELUN    |

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

|           |                                        |                            |  |
|-----------|----------------------------------------|----------------------------|--|
| Nom :     | OPH77                                  | Documents remis :          |  |
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY<br>77000 MELUN | Moyens mis à disposition : |  |

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

|                         |                                                                                                          |                                         |                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RAPPORT N° :            | 49LAJ0001                                                                                                | Laboratoire d'Analyses :                | ITGA                                                         |
| Repérage réalisé le :   | 13/07/2018                                                                                               | Adresse laboratoire :                   | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537<br>35065 RENNES CEDEX |
| Accompagnateur :        |                                                                                                          | Numéro d'accréditation :                | 1-5967                                                       |
| Par :                   | Guillaume ROGEZ                                                                                          | Organisme d'assurance professionnelle : | AXA France                                                   |
| N° certificat :         | 8073002                                                                                                  | Adresse assurance :                     | 313 Terrasses de l'Arche<br>92727 NANTERRE CEDEX             |
| Date d'obtention :      | 09/10/2017                                                                                               | N° de contrat d'assurance :             | 10063271004                                                  |
| Organisme certificateur | BUREAU VERITAS<br>60 Avenue du General de Gaulle - Immeuble Le<br>Guillaumet - 92046 PARIS<br>LA DEFENSE | Date de validité :                      | 31/12/2018                                                   |

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 25/07/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT &amp; INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Guillaume ROGEZ**


## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| A \ INFORMATIONS GENERALES .....                                 | 2  |
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....                              | 2  |
| A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....                       | 2  |
| A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....                               | 2  |
| B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....                               | 2  |
| C \ SOMMAIRE .....                                               | 3  |
| D \ CONCLUSIONS .....                                            | 4  |
| E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....                                  | 5  |
| F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....                  | 7  |
| G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....                                     | 7  |
| H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....                        | 8  |
| ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES ..... | 14 |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....                        | 18 |
| ATTESTATION(S).....                                              | 20 |
| CERTIFICAT DE COMPETENCES .....                                  | 21 |

## D\ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

| PIECE  | ETAGE | ELEMENTS                      | DESCRIPTIF<br>LABORATOIRE                                                                    | REPERAGE | Echantillon   | METHODE             | ETAT     | RESULTAT                           |
|--------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------|----------|------------------------------------|
| Séjour |       | Enduit /<br>Peinture          | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>carton non<br>séparable +<br>peinture non<br>séparable | Mur A    | 49LAJ0001P005 | RESULTAT<br>ANALYSE | BON ETAT | Amiante<br>détecté<br>(Chrysotile) |
| Séjour |       | Enduit /<br>Peinture<br>béton | Enduit plâtreux<br>beige en vrac +<br>papier non<br>séparable +<br>peinture non<br>séparable | Mur D    | 49LAJ0001P006 | RESULTAT<br>ANALYSE | BON ETAT | Amiante<br>détecté<br>(Chrysotile) |
| Séjour |       | Enduit /<br>Peinture          | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>carton non<br>séparable +<br>peinture non<br>séparable | Mur A    | 49LAJ0001P005 | ZSO                 | BON ETAT | Amiante<br>détecté<br>(Chrysotile) |
| Séjour |       | Enduit /<br>Peinture<br>béton | Enduit plâtreux<br>beige en vrac +<br>papier non<br>séparable +<br>peinture non<br>séparable | Mur D    | 49LAJ0001P006 | ZSO                 | BON ETAT | Amiante<br>détecté<br>(Chrysotile) |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

| PIECE | ETAGE | STATUT DE VISITE |
|-------|-------|------------------|
| NEANT |       |                  |

### Liste des éléments non inspectés et justification

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | REPERAGE | RESULTAT |
|-------|-------|----------|----------|----------|
| NEANT |       |          |          |          |

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

| PIECES<br>CONCERNEES | PERIMETRE<br>DU<br>REPERAGE | REPERAGE | TRAVAUX  | ELEMENTS | Echantillonnage | REMARQUES<br>PARTICULIERES |
|----------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------------------------|
|                      | LOGEMENTS<br>COLLECTIFS     |          | Selon BT |          |                 |                            |

| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                      |                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                 | PAGE N°                                                                              |                             |  |
| OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77<br>AGENCE DE SENART<br>Les Arcades - 2 rue Haute<br>77176 SAVIGNY LE TEMPLE<br>Tél : 01 64 19 19 90 Fax : 01 60 83 55 26<br>Siret : 27720001600016 |                                                                                                                                                                                                     |                                 | BON DE TRAVAUX N° 2018-16431                                                         |                             |  |
| Réf. fournisseur F / 5149<br>Marché n° 2017 4474 1<br>Provenance MELUN SENART<br>Objet DIVERS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                 | EXPERT HABITAT INGENIERIE<br>33 BIS BOULEVARD GAMBETTA<br>3EME ETAGE<br>78300 POISSY |                             |  |
| SERVICE SENART Techniciens                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                 | Téléphone 0321734144                                                                 |                             |  |
| LOCALISATION Programme 49 TOURNAN EN BRIE - PARC LAMBERT<br>Tranche 1 Ensemble E000 Escalier AJ                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                 | ÉMETTEUR ERNST ERIC                                                                  |                             |  |
| ADRESSE 12 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                 | Étage 00 Logement 1 Module 49LAJ0001<br>Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN             |                             |  |
| DÉLAI D'EXÉCUTION 15 JOURS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                 | PÉRIODE DU 06-07-2018 AU 20-07-2018                                                  |                             |  |
| ARTICLE                                                                                                                                                                          | DÉSIGNATION                                                                                                                                                                                         | QUANTITÉ                        | PRIX UNITAIRE H.T.                                                                   | TOTAL H.T.                  |  |
| AM145                                                                                                                                                                            | REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX                                                                                                                                                                | 1,00                            | 5,00                                                                                 | 5,00                        |  |
| AM175                                                                                                                                                                            | D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A<br>ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET<br>ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS<br>PEINTURE CUISINE + SEJOUR TEL GARDIEN<br>POUR CLÉ MR LAIDOUNI 0686408212 | 2,00                            | 46,00                                                                                | 98,00                       |  |
| TOTAL H.T.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                      | 101,00                      |  |
| H.T. ACTUALISÉ                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                      |                             |  |
| COEFFICIENT REGIONAL                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                      |                             |  |
| RABAIS                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                      |                             |  |
| TOTAL H.T.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                      |                             |  |
| T.V.A. 20,00 %                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                      | 20,20                       |  |
| TOTAL T.T.C.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                      | 121,20                      |  |
| AFFECTATION BUDGÉTAIRE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                      |                             |  |
| CODE BUDGET RUBRIQUE                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     | INSTANCES                       |                                                                                      | CODES STRUCTURE ET SCHEMA   |  |
| 1 HONAMIA A760                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | SENT SNTA                       |                                                                                      | LIRELLE DU POSTE BUDGÉTAIRE |  |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | HONORAIRES DIAG AMIANTE         |                                                                                      | MONTANT T.T.C.              |  |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                      | 121,20                      |  |
| AFFECTATION ANALYTIQUE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                      |                             |  |
| CODE BUDGET                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | RÉFÉRENCES PATRIMOINE           |                                                                                      | RÉFÉRENCES OCCUPANT         |  |
| 1 HONAMIA                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | 49 1 E000 AJ 49LAJ0001 L6000918 |                                                                                      | MONTANT T.T.C.              |  |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                      | 121,20                      |  |
| Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018-16431                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                      |                             |  |
| EXEMPLAIRE A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA FACTURE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                      |                             |  |

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N° : 49LAJ0001 13/07/2018

Version : 25/07/2018

6/23

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME  
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com  
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

| PIECE           | ETAGE | JUSTIFICATION | VISITE | TRAVAUX   |
|-----------------|-------|---------------|--------|-----------|
| Entrée          |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Cuisine         |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Gaine technique |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Buanderie       |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Séjour          |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Dégagement      |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| WC              |       |               | OUI    | CONCERNEE |
|                 |       |               | OUI    | CONCERNEE |
|                 |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Salle d'eau     |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Débarras        |       |               | OUI    | CONCERNEE |

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| PIECE              | MUR1                     | MUR2                                    | MUR3  | MUR4 | PLANCHER<br>BAS | PLANCHER<br>HAUT | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------|------|-----------------|------------------|--------|----------|----------|
| Entrée             |                          |                                         |       |      |                 |                  |        |          |          |
| Cuisine            | Béton                    | Carreaux de<br>plâtre                   |       |      |                 | Peinture         |        |          |          |
| Gaine<br>technique |                          |                                         |       |      |                 |                  |        |          |          |
| Buanderie          |                          |                                         |       |      |                 |                  |        |          |          |
| Séjour             | Carreaux<br>de<br>plâtre | Périphériques<br>/ Plaques de<br>plâtre | Béton |      |                 | Peinture         |        |          |          |
| Dégagement         |                          |                                         |       |      |                 |                  |        |          |          |
| WC                 |                          |                                         |       |      |                 |                  |        |          |          |
|                    |                          |                                         |       |      |                 |                  |        |          |          |
| Salle d'eau        |                          |                                         |       |      |                 |                  |        |          |          |
| Débarras           |                          |                                         |       |      |                 |                  |        |          |          |

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF<br>LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------|-------|----------|---------------------------|-------------|----------|------|----------|---------|
|-------|-------|----------|---------------------------|-------------|----------|------|----------|---------|

| PIECE  | ETAGE | ELEMENTS                      | DESCRIPTIF<br>LABORATOIRE                                                                    | Echantillon   | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT                           | METHODE |
|--------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|------------------------------------|---------|
| Séjour |       | Enduit /<br>Peinture          | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>carton non<br>séparable +<br>peinture non<br>séparable | 49LAJ0001P005 | Mur A    | BON ETAT | Amiante<br>détecté<br>(Chrysotile) | ZSO     |
| Séjour |       | Enduit /<br>Peinture<br>béton | Enduit plâtreux<br>beige en vrac +<br>papier non<br>séparable +<br>peinture non<br>séparable | 49LAJ0001P006 | Mur D    | BON ETAT | Amiante<br>détecté<br>(Chrysotile) | ZSO     |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

| PIECE  | ETAGE | ELEMENTS                      | DESCRIPTIF<br>LABORATOIRE                                                                    | Echantillon   | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT                           |
|--------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|------------------------------------|
| Séjour |       | Enduit /<br>Peinture          | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>carton non<br>séparable +<br>peinture non<br>séparable | 49LAJ0001P005 | Mur A    | BON ETAT | Amiante<br>détecté<br>(Chrysotile) |
| Séjour |       | Enduit /<br>Peinture<br>béton | Enduit plâtreux<br>beige en vrac +<br>papier non<br>séparable +<br>peinture non<br>séparable | 49LAJ0001P006 | Mur D    | BON ETAT | Amiante<br>détecté<br>(Chrysotile) |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

### LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

| PIECE   | ETAGE | ELEMENTS                      | DESCRIPTIF<br>LABORATOIRE                                                     | Echantillon   | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT                  | METHODE             |
|---------|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------------------------|---------------------|
| Cuisine |       | Enduit /<br>Peinture          | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>peintures<br>multiples non<br>séparable | 49LAJ0001P001 | Mur F    | BON ETAT | Amiante<br>non<br>détecté | RESULTAT<br>ANALYSE |
| Cuisine |       | Enduit /<br>Peinture<br>béton | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>peintures<br>multiples non<br>séparable | 49LAJ0001P002 | Mur C    | BON ETAT | Amiante<br>non<br>détecté | RESULTAT<br>ANALYSE |

| PIECE   | ETAGE | ELEMENTS                      | DESCRIPTIF<br>LABORATOIRE                                                                              | Echantillon   | REPERAGE | ETAT                     | RESULTAT                  | METHODE             |
|---------|-------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| Cuisine |       | Enduit /<br>Peinture          | Enduit plâtreux<br>blanc en faible<br>quantité en<br>vrac +<br>peintures<br>multiples non<br>séparable | 49LAJ0001P003 | Plafond  | BON ETAT                 | Amiante<br>non<br>détecté | RESULTAT<br>ANALYSE |
| Séjour  |       | Calicot                       | Matériau<br>plâtreux blanc<br>en vrac +<br>carton non<br>séparable +<br>peinture non<br>séparable      | 49LAJ0001P004 | Mur B    | BON ETAT                 | Amiante<br>non<br>détecté | RESULTAT<br>ANALYSE |
| Séjour  |       | Enduit /<br>Peinture          | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>peinture non<br>séparable                                        | 49LAJ0001P007 | Plafond  | DEGRADATION<br>PARTIELLE | Amiante<br>non<br>détecté | RESULTAT<br>ANALYSE |
| Cuisine |       | Enduit /<br>Peinture          | Enduit plâtreux<br>blanc en faible<br>quantité en<br>vrac +<br>peintures<br>multiples non<br>séparable | 49LAJ0001P003 | Plafond  | BON ETAT                 | Amiante<br>non<br>détecté | ZSO                 |
| Séjour  |       | Enduit /<br>Peinture          | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>peinture non<br>séparable                                        | 49LAJ0001P007 | Plafond  | DEGRADATION<br>PARTIELLE | Amiante<br>non<br>détecté | ZSO                 |
| Cuisine |       | Enduit /<br>Peinture          | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>peintures<br>multiples non<br>séparable                          | 49LAJ0001P001 | Mur F    | BON ETAT                 | Amiante<br>non<br>détecté | ZSO                 |
| Cuisine |       | Enduit /<br>Peinture<br>béton | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>peintures<br>multiples non<br>séparable                          | 49LAJ0001P002 | Mur A    | BON ETAT                 | Amiante<br>non<br>détecté | ZSO                 |
| Cuisine |       | Enduit /<br>Peinture<br>béton | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>peintures<br>multiples non<br>séparable                          | 49LAJ0001P002 | Mur B    | BON ETAT                 | Amiante<br>non<br>détecté | ZSO                 |
| Cuisine |       | Enduit /<br>Peinture<br>béton | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>peintures<br>multiples non<br>séparable                          | 49LAJ0001P002 | Mur C    | BON ETAT                 | Amiante<br>non<br>détecté | ZSO                 |

| PIECE   | ETAGE | ELEMENTS                      | DESCRIPTIF<br>LABORATOIRE                                                                         | Echantillon   | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT                  | METHODE |
|---------|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------------------------|---------|
| Cuisine |       | Enduit /<br>Peinture<br>béton | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>peintures<br>multiples non<br>séparable                     | 49LAJ0001P002 | Mur D    | BON ETAT | Amiante<br>non<br>détecté | ZSO     |
| Cuisine |       | Enduit /<br>Peinture<br>béton | Enduit plâtreux<br>blanc en vrac +<br>peintures<br>multiples non<br>séparable                     | 49LAJ0001P002 | Mur E    | BON ETAT | Amiante<br>non<br>détecté | ZSO     |
| Séjour  |       | Calicot                       | Matériau<br>plâtreux blanc<br>en vrac +<br>carton non<br>séparable +<br>peinture non<br>séparable | 49LAJ0001P004 | Mur B    | BON ETAT | Amiante<br>non<br>détecté | ZSO     |
| Séjour  |       | Calicot                       | Matériau<br>plâtreux blanc<br>en vrac +<br>carton non<br>séparable +<br>peinture non<br>séparable | 49LAJ0001P004 | Mur C    | BON ETAT | Amiante<br>non<br>détecté | ZSO     |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage





## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES


| PRELEVEMENT : 49LAJ0001P001 |                                                                   |                     |                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER                                                 |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                       | 49LAJ0001 13/07/2018                                              |                     | Cuisine            |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                                         | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture           | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 13/07/2018          | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                |                                                                   | RESULTAT            |                    |
| Mur F                       |                                                                   | Amiante non détecté |                    |

### EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 49LAJ0001P002 |                                                                   |                     |                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER                                                 |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                       | 49LAJ0001 13/07/2018                                              |                     | Cuisine            |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                                         | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton     | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 13/07/2018          | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                |                                                                   | RESULTAT            |                    |
| Mur C                       |                                                                   | Amiante non détecté |                    |

### EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 49LAJ0001P003 |                                                                                      |                     |                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER                                                                    |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                       | 49LAJ0001 13/07/2018                                                                 |                     | Cuisine            |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                                                            | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture           | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable | 13/07/2018          | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                |                                                                                      | RESULTAT            |                    |
| Plafond                     |                                                                                      | Amiante non détecté |                    |


EMPLACEMENT




| PRELEVEMENT : 49LAJ0001P004 |                                                                                 |                     |                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT               | NUMERO DU DOSSIER                                                               |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                       | 49LAJ0001 13/07/2018                                                            |                     | Séjour             |
| ELEMENT                     | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                                                       | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Calicot                     | Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable | 13/07/2018          | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                |                                                                                 | RESULTAT            |                    |
| Mur B                       |                                                                                 | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 49LAJ0001P005                                                       |                                                                               |                              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                                                                     | NUMERO DU DOSSIER                                                             |                              | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                                                                             | 49LAJ0001 13/07/2018                                                          |                              | Séjour             |
| ELEMENT                                                                           | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                                                     | DATE DE PRELEVEMENT          | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture                                                                 | Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable | 13/07/2018                   | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                                                                      |                                                                               | RESULTAT                     |                    |
| Mur A                                                                             |                                                                               | Amiante détecté (Chrysotile) |                    |
| EMPLACEMENT                                                                       |                                                                               |                              |                    |
|  |                                                                               |                              |                    |

| PRELEVEMENT : 49LAJ0001P006                                                         |                                                                                  |                              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                                                                       | NUMERO DU DOSSIER                                                                |                              | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                                                                               | 49LAJ0001 13/07/2018                                                             |                              | Séjour             |
| ELEMENT                                                                             | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                                                        | DATE DE PRELEVEMENT          | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture<br>béton                                                          | Enduit plâtreux beige en vrac + papier non<br>séparable + peinture non séparable | 13/07/2018                   | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                                                                        |                                                                                  | RESULTAT                     |                    |
| Mur D                                                                               |                                                                                  | Amiante détecté (Chrysotile) |                    |
| EMPLACEMENT                                                                         |                                                                                  |                              |                    |
|  |                                                                                  |                              |                    |

| PRELEVEMENT : 49LAJ0001P007                                                       |                                                        |                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT                                                                     | NUMERO DU DOSSIER                                      |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                                                                             | 49LAJ0001 13/07/2018                                   |                     | Séjour             |
| ELEMENT                                                                           | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                              | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture                                                                 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 13/07/2018          | ROGEZ Guillaume    |
| LOCALISATION                                                                      |                                                        | RESULTAT            |                    |
| Plafond                                                                           |                                                        | Amiante non détecté |                    |
| EMPLACEMENT                                                                       |                                                        |                     |                    |
|  |                                                        |                     |                    |

## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-76336 EN DATE DU 24/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

|          |                                                                                                                              |                        |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Cliant : | AGENCE EHI IDF (COMPTE MATERIAUX)-<br>EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE<br>2 rue Traversière<br>78580 LES ALLUETS LE ROI | Réf. Commande ITGA :   | IT0718-76336 |
|          |                                                                                                                              | Réf. Commande Client : | 49LAJ0001-01 |

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 18/07/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

| Fraction analysée                                                                                         | Technique analytique | Nb de préparations     | Date d'analyse                                                         | Résultat / Type d'amiante |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Réf dossier client : 49LAJ0001-01 - 12 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE                       |                      | Réf échantillon ITGA : | IT071807-40529                                                         |                           |
| Réf échantillon client : 49LAJ0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur F Enduit Peinture       |                      | Description ITGA :     | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples                    |                           |
| ► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable                                       | META                 | 1                      | 23/07/2018                                                             | Amiante non détecté / -   |
| Réf dossier client : 49LAJ0001-01 - 12 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE                       |                      | Réf échantillon ITGA : | IT071807-40530                                                         |                           |
| Réf échantillon client : 49LAJ0001P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur C Enduit Peinture béton |                      | Description ITGA :     | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples                    |                           |
| ► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable                                       | META                 | 1                      | 23/07/2018                                                             | Amiante non détecté / -   |
| Réf dossier client : 49LAJ0001-01 - 12 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE                       |                      | Réf échantillon ITGA : | IT071807-40531                                                         |                           |
| Réf échantillon client : 49LAJ0001P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Plafond Enduit Peinture     |                      | Description ITGA :     | Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peintures multiples |                           |
| ► Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac + peintures multiples non séparable                    | META                 | 1                      | 23/07/2018                                                             | Amiante non détecté / -   |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 1/2

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-76336 EN DATE DU 24/07/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

| Fraction analysée                                                                                                                                                                               | Technique analytique | Nb de préparations | Date d'analyse | Résultat / Type d'amiante                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf dossier client : 49LAJ0001-01 - 12 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE<br>Réf échantillon client : 49LAJ0001P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur B Calicot               |                      |                    |                | Réf échantillon ITGA : IT071807-40532<br>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture |
| ↳ Matériau plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable                                                                                                               | META                 | 2                  | 24/07/2018     | Amiante non détecté / -                                                                                         |
| Réf dossier client : 49LAJ0001-01 - 12 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE<br>Réf échantillon client : 49LAJ0001P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur A Enduit Peinture       |                      |                    |                | Réf échantillon ITGA : IT071807-40533<br>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture   |
| ↳ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable                                                                                                                 | META                 | 1                  | 23/07/2018     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile                                                                       |
| Réf dossier client : 49LAJ0001-01 - 12 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE<br>Réf échantillon client : 49LAJ0001P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur D Enduit Peinture béton |                      |                    |                | Réf échantillon ITGA : IT071807-40534<br>Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Papier / Peinture   |
| ↳ Enduit plâtreux beige en vrac + papier non séparable + peinture non séparable                                                                                                                 | META                 | 1                  | 23/07/2018     | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile                                                                       |
| Réf dossier client : 49LAJ0001-01 - 12 SQUARE DE LA MADELEINE 77220 TOURNAN EN BRIE<br>Réf échantillon client : 49LAJ0001P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit Peinture     |                      |                    |                | Réf échantillon ITGA : IT071807-40535<br>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture            |
| ↳ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable                                                                                                                                        | META                 | 1                  | 23/07/2018     | Amiante non détecté / -                                                                                         |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03

Page 2/2

# ATTESTATION(S)



**réinventons / notre métier**

**Votre attestation Responsabilité Civile**

AXA France IARD atteste que :

**EXPERT HABITAT ET INDUSTRIE INGENIERIE**  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10063271004 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incombent du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES  
DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES - TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965,  
DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI  
QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE  
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012  
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF  
ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO  
INFILTROMETRIE: MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230 2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A  
L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5 000 000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 01/03/2018 au 01/01/2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.  
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de  
l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.  
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou  
être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1  
du code de la Construction et de l'Habitation.  
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 01/01/2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue  
toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie  
opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 15/02/2018 - Pour la Compagnie,

**VD ASSOCIES**  
81, Bd Pierre Premier  
33110 LE BOUSCAT  
RCS 794 672 238 ORIAS : 13010220  
Tél. : 05 56 30 95 75

PEFC 1031-1483 / Certifié PEFC

UNE-ISO14001:2015 501

## CERTIFICAT DE COMPETENCES



**BUREAU VERITAS**  
Certification

**Certificat**  
 Attribué à  
**Monsieur Guillaume ROGEZ**

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

| DOMAINES TECHNIQUES         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|                             | Références des arrêtés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Date de Certification originale | Validité du certificat* |
| <b>Amiante sans mention</b> | Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification     | 09/10/2017                      | 08/10/2022              |
| <b>Electricité</b>          | Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification                                                                                                                         | 25/10/2017                      | 24/10/2022              |
| <b>Gaz</b>                  | Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification                                                                                                                                  | 25/10/2017                      | 24/10/2022              |
| <b>Plomb sans mention</b>   | Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification | 09/10/2017                      | 08/10/2022              |
| <b>Termites métropole</b>   | Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification                                                                                                                | 09/10/2017                      | 08/10/2022              |

Date : 25/10/2017

**Jacques MATHÉON - Directeur Général**

Numéro de certificat : 8073002




\* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus


Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur [www.bureauveritas.fr/certification-diag](http://www.bureauveritas.fr/certification-diag)

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France  
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Defense



**cofrac**  
CERTIFICATION DE PERSONNES  
ACCREDITATION  
N°4-0087  
Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

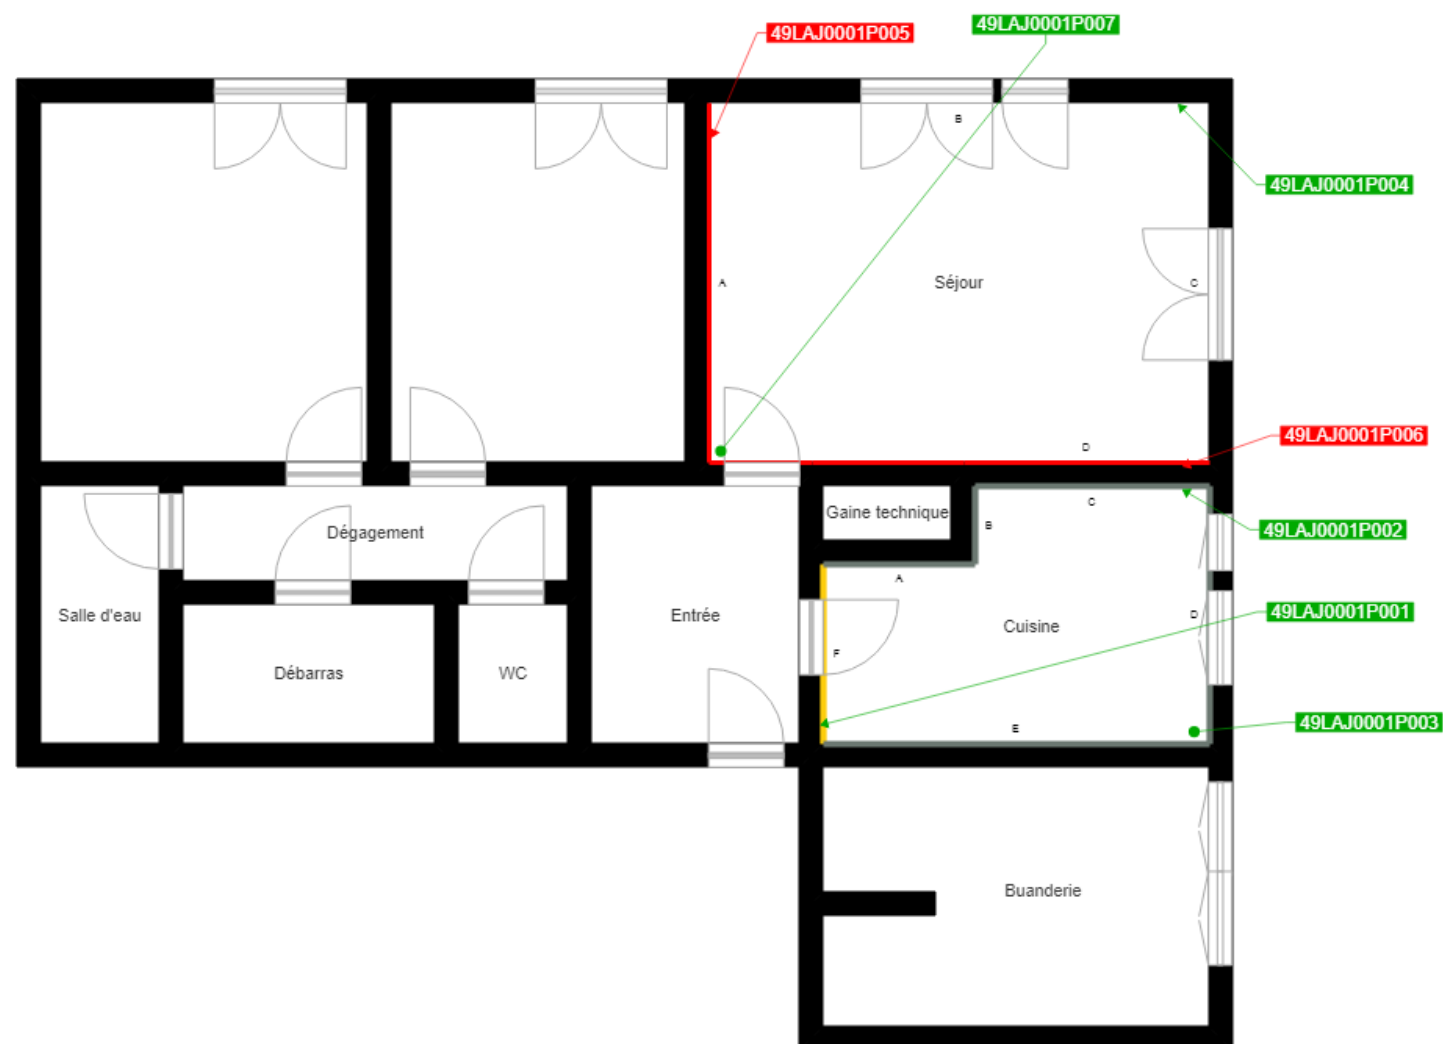

|  |                                                            |
|--|------------------------------------------------------------|
|  | Murs périphériques / Plaques de plâtre                     |
|  | Murs Bois                                                  |
|  | Murs Brique                                                |
|  | Murs Béton brut                                            |
|  | Cloisons Plaques de plâtre                                 |
|  | Murs carreaux de plâtre                                    |
|  | Murs Béton / Enduit                                        |
|  | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre      |
|  | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
|  | Torchis                                                    |
|  | Murs Amiantés                                              |
|  | Murs Brique / Enduit                                       |
|  | Murs Brique plâtrière                                      |
|  | Murs Pierre                                                |

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Prélèvements de sol amiantés              |
|   | Prélèvements de sol non amiantés          |
|   | Prélèvements de plafonds amiantés         |
|   | Prélèvements de plafonds non amiantés     |
| → | Prélèvements de murs amiantés             |
| → | Prélèvements de murs non amiantés         |
| X | Autres types de prélèvements amiantés     |
| X | Autres types de prélèvements non amiantés |
|   | Sol amianté                               |
|   | Plafond amianté                           |
|   | Sol et Plafond amiantés                   |

