

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)



**SOCOTEC**



## Bien concerné

1, Rue A. Roussel - Logement 2 - ESC AA - R+1  
77510 REBAIS

## Propriétaire

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE  
10 AVENUE CHARLES PEGUY  
77000 MELUN

## Donneur d'ordre

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE  
10 AVENUE CHARLES PEGUY  
77000 MELUN

## CONCLUSION DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

**Date du rapport :** 12/03/2020

**Date de visite :** 02/03/2020

**Fait à :** VILLEPINTE

**Référence du dossier :** Diffus OPH77

**Référence du rapport :**

54LAA0102 12/03/2020 - 12:37

**Nombre de prélèvements :** 16

**Auteur du rapport :** Mickaël JULIEN

**Fonction :** Opérateur de repérage

**Certificat de compétence :** n° CPDI4129

**Délivré par :** ICERT

**Contrat d'assurance :**

AXA France  
313 Terrasses de l'Arche  
92727 NANTERRE CEDEX

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

## SOMMAIRE

<b>I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE</b> .....	<b>3</b>
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	4
<b>II. CONCLUSIONS</b> .....	<b>5</b>
<b>III. OBJET DE LA MISSION</b> .....	<b>6</b>
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE .....	7
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES .....	7
<b>IV. DEROULEMENT DE LA MISSION</b> .....	<b>7</b>
1. PRESTATIONS REALISEES.....	7
2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	7
3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE .....	8
4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE.....	8
<b>V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b> .....	<b>10</b>
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	10
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE .....	11
<b>VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT</b> .....	<b>12</b>
<b>ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION</b> .....	<b>14</b>
<b>ANNEXE 2 - PV ANALYSES</b> .....	<b>18</b>
<b>ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS</b> .....	<b>22</b>
<b>ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES</b> .....	<b>23</b>
<b>ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE</b> .....	<b>24</b>
<b>ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS</b> .....	<b>26</b>

# I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

## 1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 - oph de seine et marn		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> HABITAT 77 - oph de seine et marn ANT. PAYS DE LA BRIE 29 SQUARE MONTMIRAIL 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél: 01 64 14 11 11 Siret: 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2020 4059  SOCOTEC DIAG (EXPERT HABITAT)  33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144
<b>Ref. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4475 1 <b>Provenance</b> PAYS DE LA BRIE <b>Objet</b> DIVERS	<b>ÉMETTEUR</b> TOUBAGHI DRISS	
<b>SERVICE</b> SCE PAYS DE LA BRIE	<b>LOCALISATION</b> Programme 54 REBAIS - LE CHAMP GIBLOIS Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AA Étage 01 Logement 2 Module 54LAA0102 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN	
<b>ADRESSE</b> 1 RUE A. ROUSSEL 77510 REBAIS		

**DÉLAI D'EXÉCUTION** 7 JOURS **PÉRIODE DU** 26-02-2020 AU 03-03-2020

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNIFORME H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX	1,00	5,27	5,27
AMI73	D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	7,00	50,58	354,06
<b>TOTAL H.T.</b>				359,33
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				71,87
<b>T.V.A</b> 20,00 %				
<b>TOTAL T.T.C.</b>				431,20

26-02-2020 ANALYSE ET REPERAGE TYPE 4  
 TEL GARDIENNE Mme DONNAY 06.86.40.92.24

AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI			MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLE DU POSTE BUDGETAIRE		
1 HONAMIA	A760	AEST EST	HONORAIRES DIAG AMIANTE		431,20

AFFECTATION ANALYTIQUE		REFERENCES PATRIMOINE	REFERENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
CODE BUDGET				
1 HONAMIA	54 1	A000 AA 54LAA0102 L 36410		431,20

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2020 4059

ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

<b>HABITAT 77 - oph de seine et marne</b>		PAGE N° 2
<b>BON DE TRAVAUX</b>		2020 4059

AFIN DE RESPECTER L'ORDONNANCE N°2014-697MERCİ DE DEPOSER VOS FACTURES SUR HTTP://chorus-pro.gouv.frIDENTIFIANT OPH77 : 27770001900015	Edité le 26-02-2020
Le Service Émetteur Dries TOUBAGHI Gestionnaire de Secteur Pays de la Brie	

ACCUSÉ DE RÉCEPTION À RETOURNER AU RESPONSABLE D'ANTENNE DÈS LA FIN DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX			
JE SOUSSIGNÉ		CERTIFIE QUE LES RÉPARATIONS FAISANT L'OBJET DU B.T. 2020 4059	
ONT BIEN ÉTÉ EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRISE		LE	
HEURE D'ARRIVÉE :	SIGNATURE DU LOCATAIRE	SIGNATURE DU REPRÉSENTANT	POUR L'ENTREPRISE
HEURE DE DÉPART :			

ORIGINAL À CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE

## 2. PERIMETRE DU REPERAGE

Pièces concernées	Travaux	Ouvrages ou composants de la construction	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Remarques particulières
	Selon BT			

## II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Entrée - R+1	Autres	Mur A	Enduit	P001	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2 - R+1	Autres	Allège fenêtre	Plaque de type « Glasal »	P004	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3 - R+1	Autres	Allège fenêtre	Plaque de type « Glasal »	P004	ZPSO
Débarras - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE
Débarras - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Entrée - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr3)	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr1)	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr1)	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr3)	ZPSO
Débarras - R+1	Autres	Mur C	Enduit plaque de plâtre	P006	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - R+1	Autres	Mur C	Enduit plaque de plâtre	P006	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Mur E	Enduit plaque de plâtre	P006	ZPSO
Chambre 3 - R+1	Autres	Mur C	Enduit plaque de plâtre	P006	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Mur C	Enduit plaque de plâtre	P006	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P007	RESULTAT ANALYSE
WC - R+1	Autres	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P007	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P009 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P009 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
WC - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P009 (Fr1)	ZPSO
WC - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P009 (Fr2)	ZPSO
Chambre 1 - R+1	Autres	Allège fenêtre	Plaque de type « Glasal »	P011	RESULTAT ANALYSE
Séjour - R+1	Autres	Allège fenêtre	Plaque de type « Glasal »	P011	ZPSO
Chambre 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Chambre 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr1)	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr2)	ZPSO
Chambre 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr1)	ZPSO
Chambre 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr2)	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Allège fenêtre	Plaque de type « Glasal »	P014	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P015 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P015 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P016 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P016 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

### III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

*Rappel réglementaire :*

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés

- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

## 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : LOGEMENTS COLLECTIFS

Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

## 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveau	Local	Concernée
R+1	Chambre 3	Concerné
R+1	Débarras	Concerné
R+1	Chambre 2	Concerné
R+1	Entrée	Concerné
R+1	Salle de bains	Concerné
R+1	WC	Concerné
R+1	Gaine technique	Concerné
R+1	Chambre 1	Concerné
R+1	Séjour	Concerné
R+1	Cuisine	Concerné

## IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

### 1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC  
**Laboratoire(s) d'analyse** : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

### 2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



### 3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) : NEANT

### 4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

**Parties non visitées**

Pièce et étage	Justification
NEANT	

**Eléments non inspectés et justification**



PIECE ET ETAGE	REPERAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	JUSTIFICATION
NEANT			

### Eléments à sonder ou à analyser non présents :

Conduits, Eléments de la liste A, Plinthes carrelage, Sol sous meuble d'évier

### Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire :

Occupation des locaux : Vacant

[RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION](#)

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Néant
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	

## V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

### 1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Entrée - R+1	Autres	Mur A	Enduit	P001	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2 - R+1	Autres	Allège fenêtre	Plaque de type « Glasal »	P004	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3 - R+1	Autres	Allège fenêtre	Plaque de type « Glasal »	P004	ZPSO
Débarras - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE
Débarras - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Entrée - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr1)	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr3)	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr1)	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr3)	ZPSO
Débarras - R+1	Autres	Mur C	Enduit plaque de plâtre	P006	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - R+1	Autres	Mur C	Enduit plaque de plâtre	P006	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Mur E	Enduit plaque de plâtre	P006	ZPSO
Chambre 3 - R+1	Autres	Mur C	Enduit plaque de plâtre	P006	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Mur C	Enduit plaque de plâtre	P006	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P007	RESULTAT ANALYSE
WC - R+1	Autres	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P007	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P009 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P009 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
WC - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P009 (Fr1)	ZPSO

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
WC - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P009 (Fr2)	ZPSO
Chambre 1 - R+1	Autres	Allège fenêtre	Plaque de type « Glasal »	P011	RESULTAT ANALYSE
Séjour - R+1	Autres	Allège fenêtre	Plaque de type « Glasal »	P011	ZPSO
Chambre 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr1)	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr2)	ZPSO
Chambre 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr1)	ZPSO
Chambre 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr2)	ZPSO
Cuisine - R+1	Autres	Allège fenêtre	Plaque de type « Glasal »	P014	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P015 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P015 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P016 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P016 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants	Unité de mesure	Quantité	Poids (t / U)	Poids total estimé
NEANT					

## 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Entrée - R+1	Autres	Mur B	Enduit béton	P002	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2 - R+1	Autres	Mur D, Mur F	Enduit béton	P002	ZPSO
Chambre 3 - R+1	Autres	Mur B, Mur D	Enduit béton	P002	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Mur C	Enduit béton	P002	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Mur B, Mur D	Enduit béton	P002	ZPSO
Chambre 3 - R+1	Autres	Plafond	Enduit béton	P003	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - R+1	Autres	Plafond	Enduit béton	P003	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Plafond	Enduit béton	P003	ZPSO
Débarras - R+1	Autres	Plafond	Enduit béton	P003	ZPSO

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification
Entrée - R+1	Autres	Plafond	Enduit béton	P003	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Plafond	Enduit béton	P003	ZPSO
Débarras - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE
Entrée - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr2)	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr2)	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Plafond	Enduit béton	P008	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Plafond	Enduit béton	P008	ZPSO
WC - R+1	Autres	Plafond	Enduit béton	P008	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P009 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE
WC - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P009 (Fr3)	ZPSO
WC - R+1	Autres	Mur D	Enduit béton	P010	RESULTAT ANALYSE
Cuisine - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P010	ZPSO
Salle de bains - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit béton	P010	ZPSO
WC - R+1	Autres	Mur A	Enduit béton	P010	ZPSO
Chambre 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr3)	ZPSO
Chambre 3 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P012 (Fr3)	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P013	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1 - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P013	ZPSO
Chambre 2 - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P013	ZPSO
Chambre 3 - R+1	Autres	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P013	ZPSO
Débarras - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P013	ZPSO
Entrée - R+1	Autres	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P013	ZPSO
Séjour - R+1	Autres	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P013	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions

suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

## ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

Identification : P001

Pièce et étage : Entrée R+1

Localisation : Mur A

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit blanc en faible quantité non séparable + matériau compact beige avec fibres visibles

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P002

Pièce et étage : Entrée R+1

Localisation : Mur B

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P003


Pièce et étage : Chambre 3 R+1

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P004

Pièce et étage : Chambre 2 R+1

Localisation : Allège fenêtre

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Plaque de type « Glasal »)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau gris avec fibres visibles

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P005 (Fr1)

Pièce et étage : Débarras R+1

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)

Descriptif Laboratoire : Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable

Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P005 (Fr2)

Pièce et étage : Débarras R+1

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)

Descriptif Laboratoire : Matériau compact gris hétérogène

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)





**Identification : P005 (Fr3)**


**Pièce et étage : Débarras R+1**

**Localisation : Sol**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)**

**Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante beige**

**Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P006**


**Pièce et étage : Débarras R+1**

**Localisation : Mur C**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit plaque de plâtre)**

**Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée**

**Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P007**


**Pièce et étage : Salle de bains R+1**

**Localisation : Mur D**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture plaque de plâtre)**

**Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + carton non séparable**

**Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)**

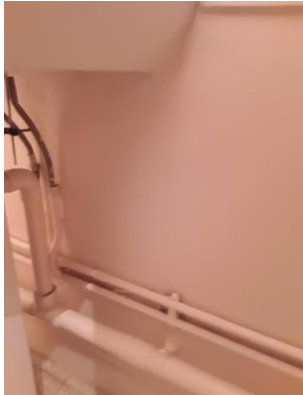

**Identification : P008**


**Pièce et étage : Salle de bains R+1**

**Localisation : Plafond**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)**

**Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P009 (Fr1)**


**Pièce et étage : Salle de bains R+1**

**Localisation : Sol**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)**

**Descriptif Laboratoire : Colle polymère non séparable + dalle dure cassante beige**

**Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P009 (Fr2)**


**Pièce et étage : Salle de bains R+1**


**Localisation : Sol**


**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)**


**Descriptif Laboratoire : Colle bitumineuse noire**


**Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)**



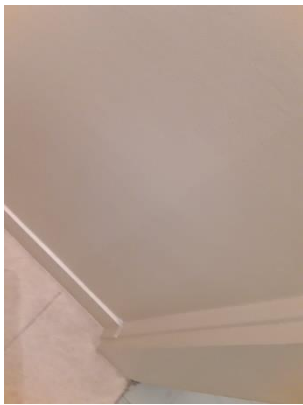

Identification : P009 (Fr3)
Pièce et étage : Salle de bains R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)
Descriptif Laboratoire : Revêtement souple beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P010
Pièce et étage : WC R+1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris hétérogène non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P011
Pièce et étage : Chambre 1 R+1
Localisation : Allège fenêtre
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Plaque de type « Glasal »)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau gris avec fibres visibles
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P012 (Fr1)
Pièce et étage : Chambre 1 R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)
Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante beige
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P012 (Fr2)
Pièce et étage : Chambre 1 R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)
Descriptif Laboratoire : Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P012 (Fr3)
Pièce et étage : Chambre 1 R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)
Descriptif Laboratoire : Matériau compact gris hétérogène
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


**Identification : P013**


**Pièce et étage : Séjour R+1**

**Localisation : Mur E**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture plaque de plâtre)**

**Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P014**


**Pièce et étage : Cuisine R+1**

**Localisation : Allège fenêtre**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Plaque de type « Glasal »)**

**Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac avec fibres visibles non séparable**

**Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P015 (Fr1)**


**Pièce et étage : Cuisine R+1**

**Localisation : Sol**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)**

**Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante beige**

**Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P015 (Fr2)**


**Pièce et étage : Cuisine R+1**

**Localisation : Sol**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)**

**Descriptif Laboratoire : Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable**

**Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P016 (Fr1)**


**Pièce et étage : Cuisine R+1**

**Localisation : Sol**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)**

**Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante beige**

**Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P016 (Fr2)**


**Pièce et étage : Cuisine R+1**

**Localisation : Sol**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Dalle de sol)**

**Descriptif Laboratoire : Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable**

**Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)**



# ANNEXE 2 - PV ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-21295 EN DATE DU 11/03/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE VILLEPINTE 22 Avenue des Nations 93420 VILLEPINTE	Réf. Commande ITGA : IT0720-21295 Réf. Commande Client : 54LAA0102-01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/03/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai:
    - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
    - (2)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
    - (3)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 54LAA0102-01 - 1 Rue A. Roussel - Logement 2 - ESC AA - R-1 77510 REBAIS				
Réf échantillon client : 54LAA0102P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur A Enduit				
Réf dossier client : 54LAA0102-01 - 1 Rue A. Roussel - Logement 2 - ESC AA - R-1 77510 REBAIS				
Réf échantillon client : 54LAA0102P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur B Enduit béton				
Réf dossier client : 54LAA0102-01 - 1 Rue A. Roussel - Logement 2 - ESC AA - R-1 77510 REBAIS				
Réf échantillon client : 54LAA0102P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Plafond Enduit béton				

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

SAUF demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 1/4

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-21295 EN DATE DU 11/03/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 54LAA0102--01 - 1 Rue A. Roussel - Logement 2 - ESC AA - R+1 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAA0102P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Allège fenêtre Plaque de type « Glasal »				Réf échantillon ITGA : IT072003-8925 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau gris avec fibres visibles
<b>Peintures multiples non séparable + matériau gris avec fibres visibles</b>	MOLP	1	06/03/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 54LAA0102--01 - 1 Rue A. Roussel - Logement 2 - ESC AA - R+1 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAA0102P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débaras Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT072003-8926 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène
<b>Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable</b>	MOLP	1	06/03/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<b>Matériau compact gris hétérogène</b>	META (1)	1	11/03/2020	Amiante non détecté / -
<b>Dalle dure cassante beige</b>	META (3)	2	11/03/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 54LAA0102--01 - 1 Rue A. Roussel - Logement 2 - ESC AA - R+1 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAA0102P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débaras Mur C Enduit plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT072003-8927 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
<b>Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée</b>	META (1)	1	10/03/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 54LAA0102--01 - 1 Rue A. Roussel - Logement 2 - ESC AA - R+1 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAA0102P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT072003-8928 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Carton
<b>Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc + carton non séparable</b>	META (1)	1	10/03/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 54LAA0102--01 - 1 Rue A. Roussel - Logement 2 - ESC AA - R+1 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAA0102P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT072003-8929 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac
<b>Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable</b>	META (1)	1	10/03/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 54LAA0102--01 - 1 Rue A. Roussel - Logement 2 - ESC AA - R+1 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAA0102P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT072003-8930 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère / Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire
<b>Colle polymère non séparable + dalle dure cassante beige</b>	META (3)	1	10/03/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<b>Colle bitumineuse noire</b>	MOLP	1	06/03/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<b>Revêtement souple beige</b>	META (1)	3	11/03/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 2/4



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-21295 EN DATE DU 11/03/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiant
Réf dossier client : 54LAA0102-01 - 1 Rue A. Roussel - Logement 2 - ESC AA - R+1 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAA0102P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur D Enduit béton				Réf échantillon ITGA : IT072003-8931 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris hétérogène
<sup>1</sup> Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris hétérogène non séparable	META (1)	1	10/03/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 54LAA0102-01 - 1 Rue A. Roussel - Logement 2 - ESC AA - R+1 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAA0102P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Allège fenêtre Plaque de type « Glasal »				Réf échantillon ITGA : IT072003-8932 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau gris avec fibres visibles
<sup>1</sup> Peintures multiples non séparable + matériau gris avec fibres visibles	MOLP	1	06/03/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 54LAA0102-01 - 1 Rue A. Roussel - Logement 2 - ESC AA - R+1 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAA0102P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT072003-8933 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène
<sup>1</sup> Dalle dure cassante beige	META (3)	1	10/03/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<sup>1</sup> Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	MOLP	1	06/03/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<sup>1</sup> Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	10/03/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 54LAA0102-01 - 1 Rue A. Roussel - Logement 2 - ESC AA - R+1 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAA0102P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur E Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT072003-8934 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc / Carton
<sup>1</sup> Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + carton	META (1)	2	11/03/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 54LAA0102-01 - 1 Rue A. Roussel - Logement 2 - ESC AA - R+1 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAA0102P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Allège fenêtre Plaque de type « Glasal »				Réf échantillon ITGA : IT072003-8935 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau gris en faible quantité en vrac avec fibres visibles
<sup>1</sup> Peintures multiples non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac avec fibres visibles non séparable	MOLP	1	06/03/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : 54LAA0102-01 - 1 Rue A. Roussel - Logement 2 - ESC AA - R+1 77510 REBAIS Réf échantillon client : 54LAA0102P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol				Réf échantillon ITGA : IT072003-8936 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris
<sup>1</sup> Dalle dure cassante beige	META (3)	1	10/03/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<sup>1</sup> Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	MOLP	1	06/03/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sanf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 3/4



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-21295 EN DATE DU 11/03/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 54LAA0102-01 - 1 Rue A. Roussel - Logement 2 - ESC AA - R+1 77510 REBAIS				Réf échantillon ITGA : IT072003-8937
Réf échantillon client : 54LAA0102P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Dalle de sol				Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris
<sup>a</sup> Dalle dure cassante beige	META (3)	1	10/03/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<sup>a</sup> Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	MOLP	1	06/03/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 4/4

## ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible



# ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Assurance  
▶ RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

COURTIER  
**VD ASSOCIES**  
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER  
33110 LE BOUSCAT  
Tél : 05 56 30 95 75  
Fax : 08 97 50 56 06  
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR  
Portefeuille : 0201478984

Vos références :  
Contrat n° 10158549604  
Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

**SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME**

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

**AMIANTE :**  
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

**PLOMB :**  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

**ETAT PARASITAIRE :**  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETES, LYCTUS )  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALUR )

**MESURES :**  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

10158549604180710

65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ  
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )  
ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)  
ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS)  
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  
DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.  
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.  
ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.  
DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF  
ETAT DES LIEUX LOCATIFS  
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE  
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION  
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO  
INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES  
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE  
DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.  
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE  
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION  
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG ) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.  
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES  
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )  
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION  
CENTRE DE FORMATION  
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE  
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR  
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES  
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ  
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINES DE LEVAGE ET DE CHANTIER  
DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE  
CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX  
RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 02 Janvier 2020

Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460


Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

## ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS



# Logement 102 de l'entrée n 1

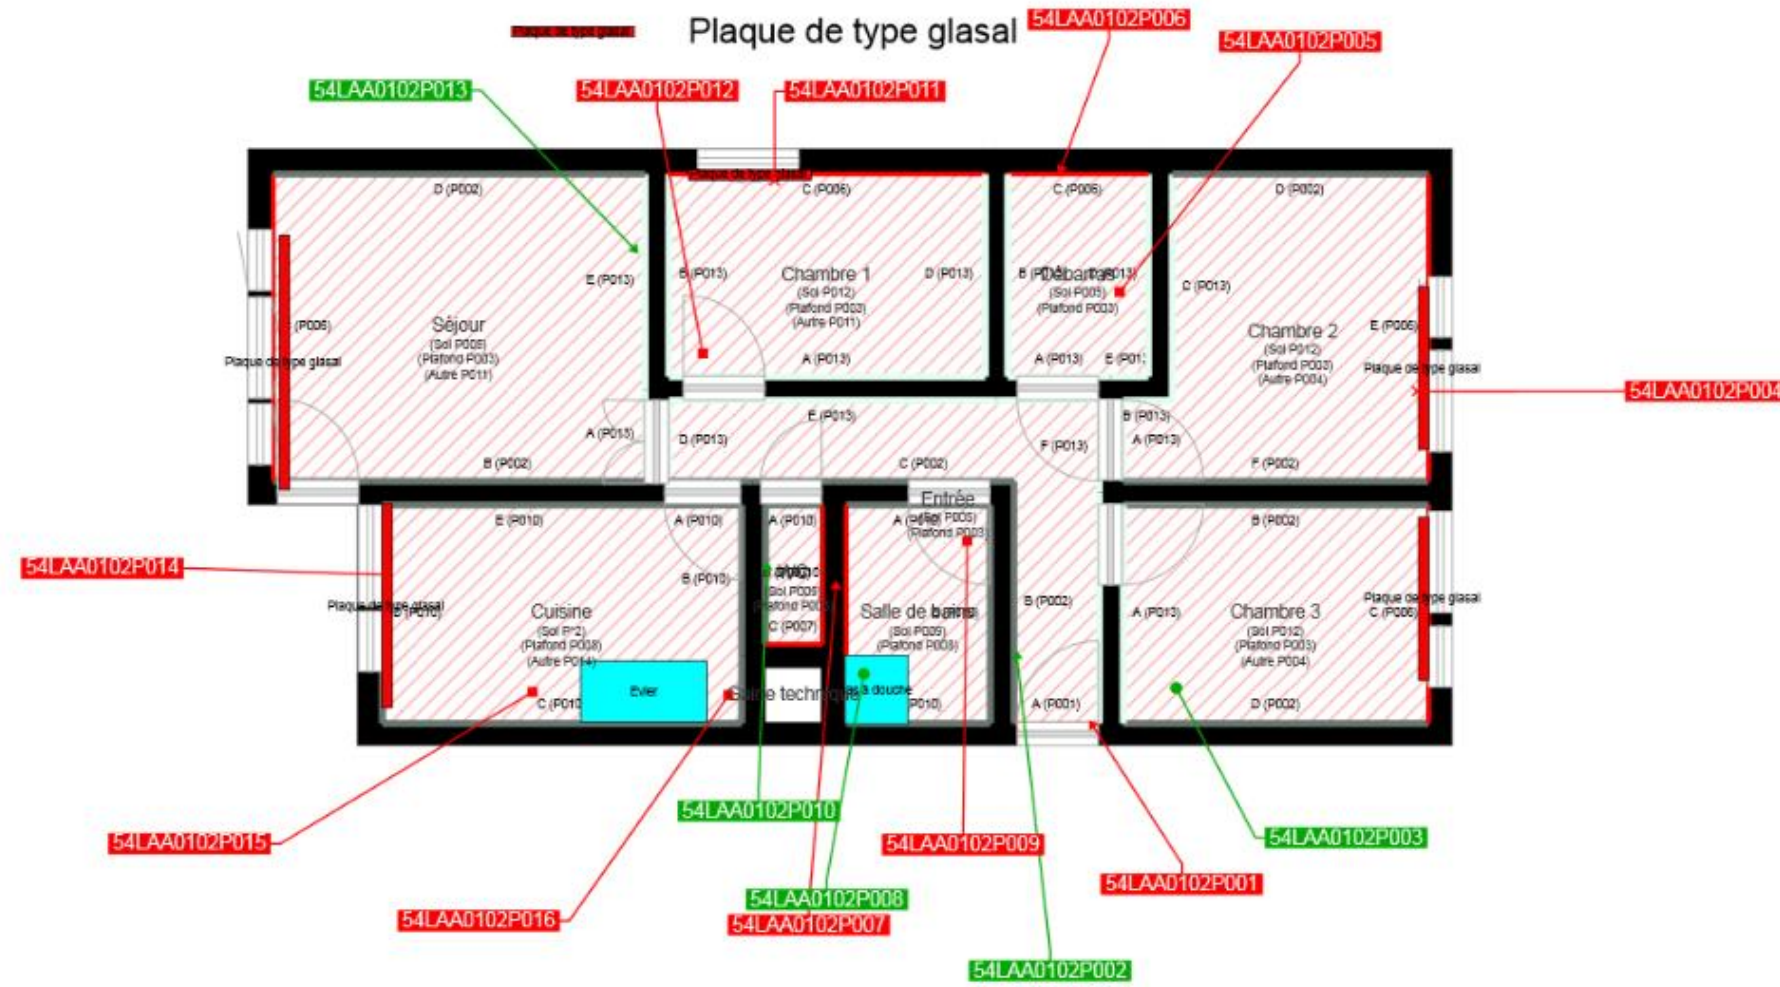

## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : 54LAA0102 - 1 Rue A. Roussel  
- Logement 2 - ESC AA - R+1 77510  
REBAIS

Zone :R+1

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :1/1

### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés
