

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A A INTEGRER AU DOSSIER AMIANTE - PARTIES PRIVATIVES

Article R.1334-20 du Code de la Santé Publique
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage

PROGRAMME 88PAW0000

23 SQUARE DES TILLEULS

77560 VILLIERS SAINT GEORGES



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	OPH77 88PAW0000	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
		Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Le repérage a été réalisé le :	31/01/2019	Numéro d'accréditation :	1-5967
Accompagnateur :		Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
Par :	Mickaël JULIEN	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
N° certificat :	CPDI 4129	N° de contrat d'assurance :	
Date d'obtention :	01/01/2017	Date de validité :	31/12/2019
Organisme certificateur :	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT- GREGOIRE		

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 15/02/2019

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
Obligations réglementaires pour les matériaux de la liste A contenant de l'amiante	5
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	10
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	10
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	12
ATTESTATION(S).....	16
CERTIFICAT DE COMPETENCES	17

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations complémentaires

Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

PIECE	ETAGE	ELEMENT A PRELEVER	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	EVALUATION	RESULTAT
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

(Voir ci-dessous obligations réglementaires)

Liste des locaux non visités et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
Garages	RC	PAS D'ACCES

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que les obligations réglementaires prévues aux articles R. 1334-15 à R1334-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012.

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENT A PRELEVER	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que les obligations réglementaires prévues aux articles R. 1334-15 à R1334-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012.

Obligations réglementaires pour les matériaux de la liste A contenant de l'amiante

Obligations de constitution et communication des documents et informations relatives à la présence d'amiante

(Article R 1334-29-4 du Code de la Santé Publique)

Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation constituent, conservent et actualisent un dossier intitulé " dossier amiante – parties privatives " comprenant les informations et documents suivants :

1. Le rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante
2. Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante ou des mesures conservatoires mises en oeuvre.

Le dossier amiante – parties privatives mentionné au I de l'article R. 1334-29-4 est tenu par le propriétaire à la disposition des occupants des parties privatives concernées. Ceux-ci sont informés de l'existence et des modalités de consultation de ce dossier. Il est communiqué par le propriétaire, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, aux agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L. 1421-1 et au troisième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi que des inspecteurs et contrôleurs du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, aux agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation.

Le propriétaire communique le dossier amiante – parties privatives à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication. »

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (**Art R.1334-20**)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon la liste citée au chapitre E \ programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE	VISITE
Entrée	RC		OUI
Débarras	RC		OUI
WC	RC		OUI
Placard	RC		OUI
Escalier	RC		OUI
Cuisine	RC		OUI
Séjour	RC		OUI
Garages	RC	PAS D'ACCES	NON
Escalier	R-1		OUI
Salle de bains	R-1		OUI
Chambre 1	R-1		OUI
Chambre 2	R-1		OUI
Palier	R-1		OUI
Chambre 3	R-1		OUI

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que les obligations réglementaires prévues aux articles R. 1334-15 à R1334-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012.

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Plaque de plâtre	Béton			Carrelage	Enduit	METALLIQUE		
Débarras	Béton	Plaque de plâtre			Carrelage	Enduit	BOIS	PVC	
WC	Plaque de plâtre	Béton			Carrelage	Enduit	BOIS		
Placard	Plaque de plâtre				Dalle de sol	Bois	BOIS		
Escalier	Plaque de plâtre	Béton				Enduit			
Cuisine	Béton	Plaque de plâtre			Carrelage	Enduit	BOIS		
Séjour	Béton				Carrelage	Enduit	BOIS		
Garages									
Escalier	Plaque de plâtre	Béton			Plancher bois	Placoplatre	BOIS	PVC	
Salle de bains	Béton	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Plaque de plâtre		Carrelage	Placoplatre	BOIS		
Chambre 1	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Parquet flottant	Placoplatre			
Chambre 2	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)			Parquet flottant	Placoplatre	BOIS		
Palier	Plaque de plâtre				Parquet flottant	Placoplatre	METALLIQUE		
Chambre 3	Plaque de plâtre	Périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)	Béton		Parquet flottant	Placoplatre	METALLIQUE		

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENT A PRELEVER	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE

PIECE	ETAGE	ELEMENT A PRELEVER	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.


PIECE	ETAGE	ELEMENT A PRELEVER	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								


ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LEGENDE		
Obligation matériaux de type Flocage, calorifugeage ou faux-plafond (résultat de la grille d'évaluation)	1	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation
	2	Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement
	3	Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS

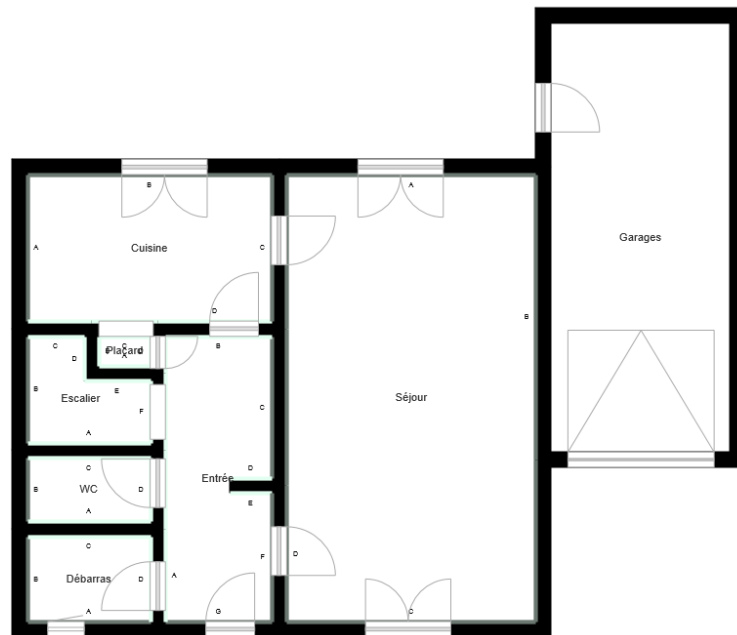

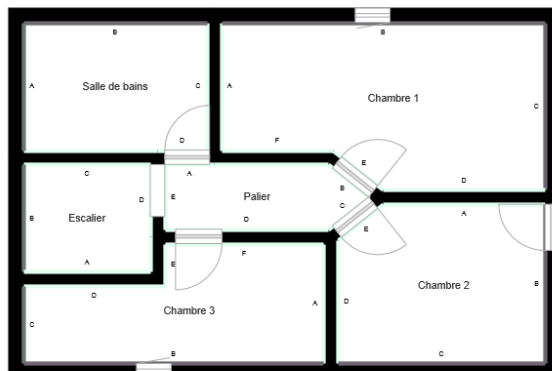


	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	Murs Machefer

	Murs amiantés
	Prélèvements de sol amianté
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafond amiantés
	Prélèvements de plafond non amiantés
	→ Prélèvements de mur amiantés
	→ Prélèvements de mur non amiantés
	X Autres types de prélèvements amiantés
	X Autres types de prélèvements non amiantés
	Sols amiantés
	Plafonds amiantés
	Sols et plafonds amiantés
	Conduits amiantés
	Conduits non amiantés


ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



itga
Innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-11615 EN DATE DU 15/02/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-11615 Réf. Commande Client : 88PAW000-01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 11/02/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP): Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1)- Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
(2)- Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050): Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Palier Sol Dalle de sol				
		Réf échantillon ITGA : IT071902-21233		
		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragrage gris / Matériau compact gris hétérogène		
▫ Dalle dure cassante beige	META (2)	1	14/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▫ Colle bitumineuse noire + ragrage gris non séparable	MOLP	1	13/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
▫ Matériau compact gris hétérogène	META (1)	1	15/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2. Mur B Enduit plaque de plâtre				
		Réf échantillon ITGA : IT071902-21234		
		Description ITGA : Enduit compact beige avec poussières / Matériau gris en faible quantité		
▫ Enduit compact beige avec poussières + matériau gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	15/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 3 Plafond Enduit plaque de plâtre				
		Réf échantillon ITGA : IT071902-21235		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples		
▫ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 1/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-11615 EN DATE DU 15/02/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Sol Colle carrelage				
Réf échantillon ITGA : IT071902-21236 Description ITGA : Colle blanche / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène / Carrelage				
* Colle blanche	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
* Carrelage	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
* Ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable	META (1)	2	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur C Colle faïence				
Réf échantillon ITGA : IT071902-21237 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage				
* Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
* Carrelage	META (1)	2	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit Peinture plaque de plâtre				
Réf échantillon ITGA : IT071902-21238 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier / Peintures multiples				
* Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peintures multiples non séparable	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Réseaux de distribution Peinture				
Réf échantillon ITGA : IT071902-21239 Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité en vrac				
* Peintures multiples en faible quantité en vrac	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur F Enduit béton				
Réf échantillon ITGA : IT071902-21241 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en faible quantité / Toile fibreuse blanche / Peinture en vrac				
* Enduit plâtreux blanc en faible quantité + toile fibreuse blanche non séparable + peinture en vrac non séparable	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Entrée Mur D Enduit plaque de plâtre				
Réf échantillon ITGA : IT071902-21242 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux beige / Toile fibreuse blanche / Peinture				
* Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + matériau plâtreux beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débaras Sol Colle carrelage				
Réf échantillon ITGA : IT071902-21244 Description ITGA : Colle grise en vrac / Carrelage				
* Carrelage	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
* Colle grise en vrac	META (1)	2	15/02/2019	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-11615 EN DATE DU 15/02/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Débaras Mur A Colle plinthe				
Réf échantillon ITGA :		IT071902-21247		
Description ITGA :		Colle beige / Couche plâtruse blanche en faible quantité / Carrelage		
Carrelage	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Colle beige + couche plâtruse blanche en faible quantité non séparable	META (1)	2	15/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Enduit béton				
Réf échantillon ITGA :		IT071902-21249		
Description ITGA :		Enduit plâtrux blanc en vrac / Peinture		
Enduit plâtrux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P013 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Mur B Enduit béton				
Réf échantillon ITGA :		IT071902-21251		
Description ITGA :		Enduit plâtrux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peinture		
Enduit plâtrux blanc en vrac + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P014 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Plafond Enduit béton				
Réf échantillon ITGA :		IT071902-21253		
Description ITGA :		Enduit plâtrux blanc en vrac / Peinture		
Enduit plâtrux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P015 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Enduit plaque de plâtre				
Réf échantillon ITGA :		IT071902-21254		
Description ITGA :		Enduit plâtrux blanc en vrac / Carton / Matériau plâtrux beige / Papier / Toile fibreuse blanche / Peinture		
Enduit plâtrux blanc en vrac + carton non séparable + matériau plâtrux beige non séparable + papier non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P016 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur B Colle plinthe				
Réf échantillon ITGA :		IT071902-21256		
Description ITGA :		Colle beige en vrac / Peintures multiples en faible quantité / Couche plâtruse blanche en faible quantité		
Colle beige en vrac + peintures multiples en faible quantité non séparable + couche plâtruse blanche en faible quantité non séparable	META (1)	1	14/02/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 88PAW0000-01 - 23 SQUARE DES TILLEULS 77560 VILLIERS SAINT GEORGES Réf échantillon client : 88PAW0000P017 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur D Colle faïence				
Réf échantillon ITGA :		IT071902-21258		
Description ITGA :		Colle beige / Joint cassant blanc / Carrelage		
Colle beige	META (1)	1	15/02/2019	Amiante non détecté / -
Joint cassant blanc	META (1)	1	15/02/2019	Amiante non détecté / -
Carrelage	META (1)	1	15/02/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 3/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-11615 EN DATE DU 15/02/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
-------------------	--	---------------------------	-------------------	------------------------------

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALLUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNM)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER - ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PEFC 10-31-1483 / Certifié PEFC
N° 100000103 2008-002

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.
La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.
Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.
L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
Pour la compagnie



CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.





I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



cofrac
ACCREDITATION
N° 4402
LABORATOIRES
D'ESSAIS

CPE DI DR 11 rev12
