

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Août 2017)



**SOCOTEC**



## Bien concerné

Bâtiment N°8  
8 AVENUE DE ROTHSCHILD  
77400 LAGNY SUR MARNE

## Propriétaire

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE  
10 AVENUE CHARLES PEGUY  
77000 MELUN

## Donneur d'ordre

HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE  
10 AVENUE CHARLES PEGUY  
77000 MELUN

## CONCLUSION DU RAPPORT :

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

### Réserves :

-Avec l'accord du donneur d'ordre les conduits de ventilations hautes dans les séjours n'ont pas été sondés, cela aurait engendré une destruction partielle de l'ouvrage et aurait altérer sa fonction. Une suspicion de présence d'amiante dans la composition de ces conduits demeure.

-Les ventilations basses situées au niveau des allèges de la cuisine ont été sondées lors du diagnostic des façades, les conduits présents dans ces dernières sont revenus amiantés.

**Date du rapport :** 16/07/2020

**Date de visite :** 01/07/2020

**Fait à :** VILLEPINTE


**Référence du dossier :** 2020  
4582\_2020 4579\_AV

**Auteur du rapport :** Mickaël JULIEN

**Fonction :** Opérateur de repérage

**Certificat de compétence :** n° DTI/2003-007

**Délivré par :** SOCOTEC Certification  
France

<p>ROTHSCHLD_REHAB</p> <p><b>Référence du rapport :</b></p> <p>Bâtiment N°8 16/07/2020 - 15:37</p> <p><b>Nombre de prélèvements : 58</b></p>	<p><b>Contrat d'assurance :</b></p> <p>AXA France 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX</p>	
--	---	---

*Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.*

## SOMMAIRE

<b>I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE</b> .....	<b>4</b>
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	4
2. PERIMETRE DU REPERAGE.....	4
<b>II. CONCLUSIONS</b> .....	<b>5</b>
<b>III. OBJET DE LA MISSION</b> .....	<b>7</b>
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE .....	8
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES .....	8
<b>IV. DEROULEMENT DE LA MISSION</b> .....	<b>13</b>
1. PRESTATIONS REALISEES.....	13
2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	13
3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE .....	14
4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE.....	14
<b>V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b> .....	<b>15</b>
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	15
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE .....	17
<b>VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT</b> .....	<b>130</b>
<b>ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION</b> .....	<b>131</b>
<b>ANNEXE 2 - PV ANALYSES</b> .....	<b>145</b>
<b>ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS</b> .....	<b>199</b>
<b>ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES</b> .....	<b>200</b>
<b>ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE</b> .....	<b>201</b>
<b>ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS</b> .....	<b>203</b>

# I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

## 1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

### Parties communes :

- peinture des parties communes (murs, plafonds , escaliers , main courante)
- électricité des parties communes
- création de trémie pour désenfumage (plafond haut cage d'escalier)
- ouverture des murs sur les 2 wc donnant sur l'escalier
- pose de revêtement de sol sur les paliers d'étage

### Logements :

- remplacement de la chaudière existante par une chaudière à ventouse donc percement en façade et depuis la cuisine
- remplacement des bouches de ventilation cuisine, sdb, wc
- réfection peinture et sol uniquement sdb
- bouchement de l'ancien conduit de chauffage séjour et des grilles de transferts hautes et basses dans les différentes pièces du logements (chambres dans placard + sdb)

## 2. PERIMETRE DU REPERAGE

### 15 Logements :

15LAD0303  
15LAD0102  
15LAD0302  
15LAD0003  
15LAD0304  
15LAD0402  
15LAD0401  
15LAD0404  
15LAD0204  
15LAD0203  
15LAD0202  
15LAD0201  
15LAD0103  
15LAD0101  
15LAD0002

### **Parties communes intérieurs**



## II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Palier 1 - R+4	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Palier 1 - R+4	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Demi palier du 8 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO	
Palier 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO	
Palier 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO	
Palier 1 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO	
Palier 1 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+3	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+3	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO	
Demi-Paliers - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO	
Demi-Paliers - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO	
Gaines techniques lgt 303 - R+3	Autres	Chutes EU / EV	Conduit	P006	RESULTAT ANALYSE	
Demi palier du 8 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Demi palier du 8 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Demi palier du 8 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Palier 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Palier 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Palier 1 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Palier 1 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Demi palier du 8 - R+3	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+3	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Demi-Paliers - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Demi-Paliers - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Sdb Igt 101 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P038 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb Igt 101 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P038 (Fr1)	ZPSO	
Sdb Igt 103 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P039 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb Igt 202 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P046	RESULTAT ANALYSE	
Sdb Igt 203 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P047 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb Igt 304 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P053 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Séjour Igt 304 - R+3	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P058	RESULTAT ANALYSE	
Séjour Igt 102 - R+1	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P058	ZPSO	
Séjour Igt 103 - R+1	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P058	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour Igt 002 - RC	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P058	ZPSO	
Séjour Igt 003 - RC	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P058	ZPSO	
Sdb Igt 102 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P061 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	

ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

### III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

**Rappel réglementaire :**

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

## 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Bâtiment collectif

Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

## 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveau	Local	Concernée
RC	Circulation 1 bâtiment 8	Concerné
RC	Local poubelles	Concerné
RC	Loge 1	Concerné
RC	Demi-Paliers	Concerné
RC	Cage d'escalier 1	Concerné
RC	Gaine technique EDF	Concerné
RC	Gaine technique Gaz	Concerné
RC	Gaines techniques lgt 003	Concerné
RC	Wc lgt 003	Concerné
RC	Entrée lgt 003	Concerné
RC	Sdb lgt 003	Concerné
RC	Séjour lgt 003	Concerné
RC	Placard 2 lgt 003	Concerné
RC	Gaines techniques 2 lgt 003	Concerné
RC	Placard 1 lgt 003	Concerné
RC	Chambre 2 lgt 003	Concerné
RC	Chambre 1 lgt 003	Concerné
RC	Gaines techniques 1 lgt 002	Concerné
RC	Entrée lgt 002	Concerné
RC	Wc lgt 002	Concerné
RC	Sdb lgt 002	Concerné
RC	Séjour lgt 002	Concerné
RC	Placard 2 lgt 002	Concerné
RC	Gaines techniques 2 lgt 002	Concerné
RC	Placard 1 lgt 002	Concerné
RC	Chambre 2 lgt 002	Concerné
RC	Chambre 1 lgt 002	Concerné
RC	Circulation 2 bâtiment 8	Concerné
RC	Local vélos	Concerné
RC	Cuisine lgt 003	Concerné
RC	Conduit chaudière lgt 003	Concerné
RC	Cuisine lgt 002	Concerné
RC	Conduit chaudière lgt 002	Concerné
RC	Lgt non visité	Concerné
RC	Lgt non visité	Concerné
R+1	Demi palier du 8	Concerné
R+1	Cage d'escalier 2	Concerné

Niveau	Local	Concernée
R+1	Gaine technique Gaz	Concerné
R+1	Gaine technique EDF	Concerné
R+1	Palier 1	Concerné
R+1	Gaines techniques 1 lgt	Concerné
R+1	Séjour lgt 101	Concerné
R+1	Placard 1 lgt 101	Concerné
R+1	Gaines techniques 1 lgt 101	Concerné
R+1	Placard 2 lgt 101	Concerné
R+1	Couloir lgt 101	Concerné
R+1	Chambre 1 lgt 101	Concerné
R+1	Chambre 3 lgt 101	Concerné
R+1	Gaines techniques 2 lgt 101	Concerné
R+1	Chambre 2 lgt 101	Concerné
R+1	Placard 3 lgt 101	Concerné
R+1	Sdb lgt 101	Concerné
R+1	Wc lgt 101	Concerné
R+1	Dégagement lgt 101	Concerné
R+1	Cuisine lgt 101	Concerné
R+1	Gaine technique cgt 101	Concerné
R+1	Entrée lgt 102	Concerné
R+1	Wc lgt 102	Concerné
R+1	Sdb lgt 102	Concerné
R+1	Cuisine lgt 102	Concerné
R+1	Conduit chaudière lgt 102	Concerné
R+1	Séjour lgt 102	Concerné
R+1	Placard 1 lgt 102	Concerné
R+1	Gaines techniques 2 lgt 102	Concerné
R+1	Placard 2 lgt 102	Concerné
R+1	Chambre 2 lgt 102	Concerné
R+1	Chambre 1 lgt 102	Concerné
R+1	Entrée lgt 103	Concerné
R+1	Gaines techniques lgt 103	Concerné
R+1	Wc lgt 103	Concerné
R+1	Sdb lgt 103	Concerné
R+1	Cuisine lgt 103	Concerné
R+1	Conduit chaudière lgt 103	Concerné
R+1	Séjour lgt 103	Concerné
R+1	Placard 1 lgt 103	Concerné
R+1	Gaines techniques 2 lgt 103	Concerné
R+1	Placard 2 lgt 103	Concerné
R+1	Chambre 2 lgt 103	Concerné
R+1	Chambre 1 lgt 103	Concerné
R+1	Gaines techniques 1 lgt 102	Concerné
R+1	Lgt non visité	Concerné
R+2	Demi palier du 8	Concerné
R+2	Cage d'escalier 2	Concerné
R+2	Gaine technique Gaz	Concerné
R+2	Gaine technique EDF	Concerné
R+2	Palier 1	Concerné
R+2	Cuisine lgt 204	Concerné

Niveau	Local	Concernée
R+2	Conduit chaudière lgt 204	Concerné
R+2	Chambre 2 lgt 204	Concerné
R+2	Entrée lgt 204	Concerné
R+2	Wc lgt 204	Concerné
R+2	Gaines techniques 1 lgt 204	Concerné
R+2	Sdb lgt 204	Concerné
R+2	Séjour lgt 204	Concerné
R+2	Chambre 1 lgt 204	Concerné
R+2	Séjour lgt 201	Concerné
R+2	Placard 1 lgt 201	Concerné
R+2	Gaines techniques 1 lgt 201	Concerné
R+2	Placard 2 lgt	Concerné
R+2	Couloir lgt 201	Concerné
R+2	Chambre 1 lgt 201	Concerné
R+2	Chambre 3 lgt 201	Concerné
R+2	Gaines techniques 2 lgt 201	Concerné
R+2	Chambre 2 lgt 201	Concerné
R+2	Placard 3 lgt 201	Concerné
R+2	Sdb lgt 201	Concerné
R+2	Wc lgt 201	Concerné
R+2	Dégagement lgt 201	Concerné
R+2	Cuisine lgt 201	Concerné
R+2	Gaine technique cgt 201	Concerné
R+2	Entrée lgt 202	Concerné
R+2	Wc lgt 202	Concerné
R+2	Sdb lgt 202	Concerné
R+2	Cuisine lgt 202	Concerné
R+2	Conduit chaudière lgt 202	Concerné
R+2	Séjour lgt 202	Concerné
R+2	Placard 1 lgt 202	Concerné
R+2	Gaines techniques 2 lgt 202	Concerné
R+2	Placard 2 lgt 202	Concerné
R+2	Chambre 2 lgt 202	Concerné
R+2	Chambre 1 lgt 202	Concerné
R+2	Entrée lgt 203	Concerné
R+2	Gaines techniques lgt 203	Concerné
R+2	Wc lgt 203	Concerné
R+2	Sdb lgt 203	Concerné
R+2	Cuisine lgt 203	Concerné
R+2	Conduit chaudière lgt 203	Concerné
R+2	Séjour lgt 203	Concerné
R+2	Placard 1 lgt 203	Concerné
R+2	Gaines techniques 2 lgt 203	Concerné
R+2	Placard 2 lgt 203	Concerné
R+2	Chambre 2 lgt 203	Concerné
R+2	Chambre 1 lgt 203	Concerné
R+2	Gaines techniques 1 lgt 202	Concerné
R+2	Placard 2 lgt 204	Concerné
R+2	Gaines techniques 2 lgt 204	Concerné
R+2	Placard 1 lgt 204	Concerné

Niveau	Local	Concernée
R+3	Demi palier du 8	Concerné
R+3	Cage d'escalier 2	Concerné
R+3	Gaine technique Gaz	Concerné
R+3	Gaine technique EDF	Concerné
R+3	Palier 1	Concerné
R+3	Cuisine lgt 304	Concerné
R+3	Conduit chaudière lgt	Concerné
R+3	Chambre 2 lgt 304	Concerné
R+3	Entrée lgt 304	Concerné
R+3	Wc lgt 304	Concerné
R+3	Gaines techniques 1 lgt 304	Concerné
R+3	Sdb lgt 304	Concerné
R+3	Séjour lgt 304	Concerné
R+3	Chambre 1 lgt 304	Concerné
R+3	Entrée lgt 302	Concerné
R+3	Wc lgt 302	Concerné
R+3	Sdb lgt 302	Concerné
R+3	Cuisine lgt 302	Concerné
R+3	Conduit chaudière lgt 302	Concerné
R+3	Séjour lgt 302	Concerné
R+3	Placard 1 lgt 302	Concerné
R+3	Gaines techniques 2 lgt 302	Concerné
R+3	Placard 2 lgt 302	Concerné
R+3	Chambre 2 lgt 302	Concerné
R+3	Chambre 1 lgt 302	Concerné
R+3	Entrée lgt 303	Concerné
R+3	Gaines techniques lgt 303	Concerné
R+3	Wc lgt 303	Concerné
R+3	Sdb lgt 303	Concerné
R+3	Cuisine lgt 303	Concerné
R+3	Conduit chaudière lgt 303	Concerné
R+3	Séjour lgt 303	Concerné
R+3	Placard 1 lgt 303	Concerné
R+3	Gaines techniques 2 lgt 303	Concerné
R+3	Placard 2 lgt 303	Concerné
R+3	Chambre 2 lgt 303	Concerné
R+3	Chambre 1 lgt 303	Concerné
R+3	Gaines techniques 1 lgt 302	Concerné
R+3	Placard 2 lgt 304	Concerné
R+3	Gaines techniques 2 lgt 304	Concerné
R+3	Placard 1 lgt 304	Concerné
R+3	Lgt non visité	Concerné
R+4	Demi palier du 8	Concerné
R+4	Cage d'escalier 2	Concerné
R+4	Gaine technique Gaz	Concerné
R+4	Gaine technique EDF	Concerné
R+4	Palier 1	Concerné
R+4	Cuisine lgt 404	Concerné
R+4	Conduit chaudière lgt 404	Concerné
R+4	Chambre 2 lgt 404	Concerné

Niveau	Local	Concernée
R+4	Entrée lgt 404	Concerné
R+4	Wc lgt 404	Concerné
R+4	Gaines techniques 1 lgt 404	Concerné
R+4	Sdb lgt 404	Concerné
R+4	Séjour lgt 404	Concerné
R+4	Chambre 1 lgt 404	Concerné
R+4	Séjour lgt 401	Concerné
R+4	Placard 1 lgt 401	Concerné
R+4	Gaines techniques 1 lgt 401	Concerné
R+4	Placard 2 lgt 401	Concerné
R+4	Couloir lgt 401	Concerné
R+4	Chambre 1 lgt 401	Concerné
R+4	Chambre 3 lgt 401	Concerné
R+4	Gaines techniques 2 lgt 401	Concerné
R+4	Chambre 2 lgt 401	Concerné
R+4	Placard 3 lgt 401	Concerné
R+4	Sdb lgt 401	Concerné
R+4	Wc lgt 401	Concerné
R+4	Dégagement lgt 401	Concerné
R+4	Cuisine lgt 401	Concerné
R+4	Gainé chaudière lgt 401	Concerné
R+4	Entrée lgt 402	Concerné
R+4	Wc lgt 402	Concerné
R+4	Sdb lgt 402	Concerné
R+4	Cuisine lgt 402	Concerné
R+4	Conduit chaudière lgt 402	Concerné
R+4	Séjour lgt 402	Concerné
R+4	Placard 1 lgt 402	Concerné
R+4	Gaines techniques 2 lgt 402	Concerné
R+4	Placard 2 lgt 402	Concerné
R+4	Chambre 2 lgt 402	Concerné
R+4	Chambre 1 lgt 402	Concerné
R+4	Gaines techniques lgt	Concerné
R+4	Gaines techniques 1 lgt 402	Concerné
R+4	Placard 2 lgt 404	Concerné
R+4	Gaines techniques 2 lgt 404	Concerné
R+4	Placard 1 lgt 404	Concerné
R+4	Lgt non visité	Concerné
R-1	Demi-Paliers	Concerné
R-1	Cages d'escalier	Concerné
R-1	Dégagement	Concerné
R-1	Gainé technique Gaz	Concerné
R-1	Gainé technique EDF	Concerné
R-1	Vide sanitaire	Concerné
R-1	Cave 1	Concerné
R-1	Cave 3	Concerné
R-1	Cave 2	Concerné
R-1	Terre plein	Concerné
R-1	Accès cave	Concerné



## IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

### 1. PRESTATIONS REALISEES

- Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC  
**Laboratoire(s) d'analyse** : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

### 2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



### 3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) : NEANT

### 4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

#### Parties non visitées

Pièce et étage	Justification
NEANT	

#### Éléments non inspectés et justification

PIECE ET ETAGE	REPERAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	JUSTIFICATION
sdb lgt 201 - R+1	Sol		Refus - carrelage tout neuf
sdb lgt 404 - R+2	Sol		Refus - carrelage neuf
Couloir 1 - R+1	Sol		Refus - carrelage neuf

#### Éléments à sonder ou à analyser non présents :

#### Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire : Aucun

Occupation des locaux : Oui

**RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION**

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	NC
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	NC
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	NC

## V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

### 1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Palier 1 - R+4	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Palier 1 - R+4	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Demi palier du 8 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO	
Palier 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO	
Palier 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO	
Palier 1 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO	
Palier 1 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+3	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+3	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO	
Demi-Paliers - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr2)	ZPSO	
Demi-Paliers - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P004 (Fr1)	ZPSO	
Gaines techniques lgt 303 - R+3	Autres	Chutes EU / EV	Conduit	P006	RESULTAT ANALYSE	
Demi palier du 8 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Demi palier du 8 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Demi palier du 8 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Palier 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Palier 1 - R+1	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Palier 1 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Palier 1 - R+2	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+3	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+3	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Demi-Paliers - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr2)	ZPSO	
Demi-Paliers - RC	Autres	Sol	Dalle de sol	P013 (Fr1)	ZPSO	
Sdb lgt 101 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P038 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 101 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P038 (Fr1)	ZPSO	
Sdb lgt 103 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P039 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 202 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P046	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 203 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P047 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 304 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P053 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Séjour lgt 304 - R+3	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P058	RESULTAT ANALYSE	
Séjour lgt 102 - R+1	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P058	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour Igt 103 - R+1	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P058	ZPSO	
Séjour Igt 002 - RC	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P058	ZPSO	
Séjour Igt 003 - RC	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Ventilation haute	Conduits en fibres-ciment	P058	ZPSO	
Sdb Igt 102 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P061 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	

ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants	Unité de mesure	Quantité	Poids (t / U)	Poids total estimé
Revêtements de sols	Dalles de sol en PCI	m2	44	1,5kg	66kg
Revêtements de sols	Dalles de sol en SDB	m2	56,57	1,5kg	84,85kg
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement)	Conduits en fibres ciment rond en PCI	ml	12,65	2,8 kg	35,42kg
Revêtements de sols	Colles et joints de carrelage	m2	6,4	10.000	64kg
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Conduits en fibres-ciment carré en Igt	ml	45	3,6kg	162kg

## 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
----------------	---	--------------	--	----------------	---------------	-------------

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Palier 1 - R+1	Autres	Mur E	Enduit	P001	RESULTAT ANALYSE	
Palier 1 - R+1	Autres	Mur E	Enduit	P001	ZPSO	
Palier 1 - R+2	Autres	Mur E	Enduit	P001	ZPSO	
Palier 1 - R+3	Autres	Mur E	Enduit	P001	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Autres	Mur E	Enduit	P001	ZPSO	
Circulation 2 bâtiment 8 - RC	Autres	Mur H	Enduit	P001	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Autres	Trappe	Peinture	P002	RESULTAT ANALYSE	
Palier 1 - R+1	Autres	Trappe	Peinture	P002	ZPSO	
Palier 1 - R+2	Autres	Trappe	Peinture	P002	ZPSO	
Palier 1 - R+3	Autres	Trappe	Peinture	P002	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Autres	Plafond	Enduit béton	P003	RESULTAT ANALYSE	
Demi palier du 8 - R+1	Autres	Plafond	Enduit béton	P003	ZPSO	
Palier 1 - R+1	Autres	Plafond	Enduit béton	P003	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+2	Autres	Plafond	Enduit béton	P003	ZPSO	
Palier 1 - R+2	Autres	Plafond	Enduit béton	P003	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+3	Autres	Plafond	Enduit béton	P003	ZPSO	
Palier 1 - R+3	Autres	Plafond	Enduit béton	P003	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+4	Autres	Plafond	Enduit béton	P003	ZPSO	
Circulation 2 bâtiment 8 - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P003	ZPSO	
Demi-Paliers - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P003	ZPSO	
Palier 1 - R+3	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	
Palier 1 - R+3	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr4)	RESULTAT ANALYSE	
Demi palier du 8 - R+4	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr3)	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+4	Autres	Sol	Dalle de sol	P005 (Fr4)	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+1	Autres	Mur B	Enduit béton	P007	RESULTAT ANALYSE	
Cage d'escalier 2 - R+1	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit béton	P007	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P007	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Palier 1 - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit béton	P007	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+2	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P007	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+2	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P007	ZPSO	
Palier 1 - R+2	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit béton	P007	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+3	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P007	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+3	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P007	ZPSO	
Palier 1 - R+3	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit béton	P007	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+4	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit béton	P007	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+4	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P007	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit béton	P007	ZPSO	
Cage d'escalier 1 - RC	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit béton	P007	ZPSO	
Circulation 1 bâtiment 8 - RC	Autres	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P007	ZPSO	
Circulation 2 bâtiment 8 - RC	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit béton	P007	ZPSO	
Demi-Paliers - RC	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit béton	P007	ZPSO	
Entrée lgt 002 - RC	Autres	Mur B	Enduit béton	P007	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+3	Autres	Plafond	Enduit béton	P008	RESULTAT ANALYSE	
Cage d'escalier 2 - R+1	Autres	Plafond	Enduit béton	P008	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+2	Autres	Plafond	Enduit béton	P008	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cage d'escalier 2 - R+4	Autres	Plafond	Enduit béton	P008	ZPSO	
Cage d'escalier 1 - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P008	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+3	Autres	Main-courante	Peinture	P009	RESULTAT ANALYSE	
Cage d'escalier 2 - R+1	Autres	Main-courante	Peinture	P009	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+2	Autres	Main-courante	Peinture	P009	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+4	Autres	Main-courante	Peinture	P009	ZPSO	
Cage d'escalier 1 - RC	Autres	Main-courante	Peinture	P009	ZPSO	
Palier 1 - R+2	Autres	Trappe	Peinture	P010	RESULTAT ANALYSE	
Palier 1 - R+1	Autres	Mur E	Enduit	P011	RESULTAT ANALYSE	
Palier 1 - R+1	Autres	Mur E	Enduit	P011	ZPSO	
Palier 1 - R+2	Autres	Mur E	Enduit	P011	ZPSO	
Palier 1 - R+3	Autres	Mur E	Enduit	P011	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Autres	Mur E	Enduit	P011	ZPSO	
Circulation 2 bâtiment 8 - RC	Autres	Mur H	Enduit	P011	ZPSO	
Palier 1 - R+2	Autres	Plafond	Enduit béton	P012	RESULTAT ANALYSE	
Demi palier du 8 - R+1	Autres	Plafond	Enduit béton	P012	ZPSO	
Palier 1 - R+1	Autres	Plafond	Enduit béton	P012	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+2	Autres	Plafond	Enduit béton	P012	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+3	Autres	Plafond	Enduit béton	P012	ZPSO	
Palier 1 - R+3	Autres	Plafond	Enduit béton	P012	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+4	Autres	Plafond	Enduit béton	P012	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Autres	Plafond	Enduit béton	P012	ZPSO	
Circulation 2 bâtiment 8 - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P012	ZPSO	
Demi-Paliers - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P012	ZPSO	
Palier 1 - R+1	Autres	Mur H	Enduit béton	P014	RESULTAT ANALYSE	
Cage d'escalier 2 - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P014	ZPSO	



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Demi palier du 8 - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P014	ZPSO	
Palier 1 - R+1	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit béton	P014	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+2	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P014	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+2	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P014	ZPSO	
Palier 1 - R+2	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit béton	P014	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+3	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P014	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+3	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P014	ZPSO	
Palier 1 - R+3	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit béton	P014	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+4	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit béton	P014	ZPSO	
Demi palier du 8 - R+4	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P014	ZPSO	
Palier 1 - R+4	Autres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit béton	P014	ZPSO	
Cage d'escalier 1 - RC	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit béton	P014	ZPSO	
Circulation 1 bâtiment 8 - RC	Autres	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P014	ZPSO	
Circulation 2 bâtiment 8 - RC	Autres	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit béton	P014	ZPSO	
Demi-Paliers - RC	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit béton	P014	ZPSO	
Entrée Igt 002 - RC	Autres	Mur H	Enduit béton	P014	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+1	Autres	Plafond	Enduit béton	P015	RESULTAT ANALYSE	
Cage d'escalier 2 - R+2	Autres	Plafond	Enduit béton	P015	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cage d'escalier 2 - R+3	Autres	Plafond	Enduit béton	P015	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+4	Autres	Plafond	Enduit béton	P015	ZPSO	
Cage d'escalier 1 - RC	Autres	Plafond	Enduit béton	P015	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+1	Autres	Main-courante	Peinture	P016	RESULTAT ANALYSE	
Cage d'escalier 2 - R+2	Autres	Main-courante	Peinture	P016	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+3	Autres	Main-courante	Peinture	P016	ZPSO	
Cage d'escalier 2 - R+4	Autres	Main-courante	Peinture	P016	ZPSO	
Cage d'escalier 1 - RC	Autres	Main-courante	Peinture	P016	ZPSO	
Circulation 2 bâtiment 8 - RC	Autres	Sol	Colle carrelage	P017	RESULTAT ANALYSE	
Circulation 2 bâtiment 8 - RC	Autres	Mur C	Colle plinthe	P018	RESULTAT ANALYSE	
Circulation 2 bâtiment 8 - RC	Autres	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Colle plinthe	P018	ZPSO	
Circulation 2 bâtiment 8 - RC	Autres	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P019	RESULTAT ANALYSE	
Dégagement - R-1	Autres	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P019	ZPSO	
Circulation 1 bâtiment 8 - RC	Autres	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P019	ZPSO	
Circulation 1 bâtiment 8 - RC	Autres	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	RESULTAT ANALYSE	
Circulation 2 bâtiment 8 - RC	Autres	Plafond	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P020	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Circulation 1 bâtiment 8 - RC	Autres	Sol	Colle carrelage	P021 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Circulation 1 bâtiment 8 - RC	Autres	Sol	Colle carrelage	P021 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Circulation 1 bâtiment 8 - RC	Autres	Mur B	Colle faïence	P022 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Circulation 1 bâtiment 8 - RC	Autres	Mur B	Colle faïence	P022 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Circulation 1 bâtiment 8 - RC	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Colle faïence	P022 (Fr1)	ZPSO	
Circulation 1 bâtiment 8 - RC	Autres	Mur A, Mur C, Mur D	Colle faïence	P022 (Fr2)	ZPSO	
Circulation 2 bâtiment 8 - RC	Autres	Mur B	Colle plinthe	P023 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Circulation 2 bâtiment 8 - RC	Autres	Mur B	Colle plinthe	P023 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Circulation 2 bâtiment 8 - RC	Autres	Mur B	Colle plinthe	P023 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	
Accès cave - R-1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P024 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Accès cave - R-1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P024 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Accès cave - R-1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P024 (Fr3)	RESULTAT ANALYSE	
Vide sanitaire - R-1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P024 (Fr1)	ZPSO	
Vide sanitaire - R-1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P024 (Fr2)	ZPSO	
Vide sanitaire - R-1	Autres	Plafond	Enduit plaque de plâtre	P024 (Fr3)	ZPSO	
Accès cave - R-1	Autres	Plafond	Enduit / Calicot	P025	RESULTAT ANALYSE	
Vide sanitaire - R-1	Autres	Plafond	Enduit / Calicot	P025	ZPSO	
Entrée Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 3 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Couloir lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Dégagement lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Entrée lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Entrée lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 3 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 3 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Couloir lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Dégagement lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Entrée lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Entrée lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Entrée lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 lgt - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 3 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Entrée lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Entrée lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Entrée lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 3 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Couloir lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Dégagement lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Entrée lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Entrée lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 3 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 1 lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Chambre 2 lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Entrée lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 1 lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Placard 2 lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Séjour Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P026	ZPSO	
Wc Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P027	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Cuisine lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Sdb lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P027	ZPSO	
Wc lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Cuisine lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Cuisine lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Sdb lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Sdb lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Wc lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Wc lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Wc lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Cuisine lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Cuisine lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Cuisine lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Sdb lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Wc lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Wc lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Cuisine lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Cuisine lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Cuisine lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Sdb lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Sdb lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Sdb lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Wc lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Wc lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Cuisine lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Cuisine lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Cuisine lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Sdb lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Sdb lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Sdb lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Wc lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Wc lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Wc lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Cuisine lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Cuisine lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Sdb lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Wc lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
Chambre 1 lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P029	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Chambre 2 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Chambre 3 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Entrée lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Entrée lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Placard 1 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Séjour lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Séjour lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Chambre 1 lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Chambre 1 lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Chambre 3 lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Entrée lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Entrée lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Entrée lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Placard 1 lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Placard 2 lgt - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Séjour lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Séjour lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Séjour lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Chambre 1 lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Chambre 1 lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Chambre 2 lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Entrée lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Entrée lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Séjour Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Séjour Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Séjour Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Chambre 1 Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Chambre 1 Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Chambre 3 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Entrée Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Entrée Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Placard 1 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Placard 2 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Séjour Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Séjour Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Séjour Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Chambre 2 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P029	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Entrée Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Séjour Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Séjour Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P029	ZPSO	
Séjour Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P030	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 1 Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 1 Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 2 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 2 Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 2 Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 3 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Couloir Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Dégagement Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Entrée Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 1 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 1 Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 1 Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 2 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 2 Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 2 Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 3 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Séjour Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Séjour Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Séjour Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 1 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 1 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 1 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 1 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P030	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 2 lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 2 lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 2 lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 3 lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Couloir lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Dégagement lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Entrée lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Entrée lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Entrée lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 1 lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 1 lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 1 lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 1 lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 2 lgt - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 2 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 2 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 3 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Séjour Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Séjour Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Séjour Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Séjour Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 1 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 1 Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 1 Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 2 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 2 Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 2 Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Entrée Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Entrée Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 1 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 1 Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 1 Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 2 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 2 Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 2 Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Séjour Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Séjour Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Séjour Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 1 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 1 Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 1 Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 2 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P030	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 2 lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 3 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Couloir lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Dégagement lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Entrée lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Entrée lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 1 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 1 lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 1 lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 2 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 2 lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 2 lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 3 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Séjour lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Séjour Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 1 Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 1 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 2 Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Chambre 2 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Entrée Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Entrée Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 1 Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 1 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 2 Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Placard 2 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Séjour Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Séjour Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P030	ZPSO	
Sdb Igt 002 - RC	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P031 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 002 - RC	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P031 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 303 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P031 (Fr1)	ZPSO	
Sdb lgt 303 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P031 (Fr2)	ZPSO	
Sdb lgt 401 - R+4	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P031 (Fr1)	ZPSO	
Sdb lgt 401 - R+4	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P031 (Fr2)	ZPSO	
Sdb lgt 003 - RC	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P031 (Fr1)	ZPSO	
Sdb lgt 003 - RC	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P031 (Fr2)	ZPSO	
Couloir lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 1 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 2 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 2 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 2 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 3 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Dégagement lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Entrée lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Entrée lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 1 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 1 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 1 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 2 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 2 Igt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 3 Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Séjour Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Séjour Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Séjour Igt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 1 Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 1 Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 1 Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 1 Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 2 Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 2 Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 2 lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 3 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Couloir lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Dégagement lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Entrée lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Entrée lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Entrée lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 1 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 1 lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 1 lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 1 lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 lgt - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 2 lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 2 lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 2 lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 3 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Séjour lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Séjour lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Séjour lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Séjour lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 1 lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 1 lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 1 lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 2 Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 2 Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Entrée Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Entrée Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Entrée Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 1 Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 1 Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 1 Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 2 Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 2 Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 2 Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Séjour lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Séjour lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 1 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 1 lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 1 lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 2 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 2 lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 2 lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 3 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Couloir lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Dégagement lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Entrée Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 1 Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 1 Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 1 Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 2 Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 2 Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 2 Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 3 Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Séjour Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Séjour Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Séjour Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 1 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 2 Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Chambre 2 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Entrée Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Entrée Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 1 Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 1 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 2 Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Placard 2 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Séjour Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	
Séjour Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P032	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P033	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 2 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 3 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Entrée lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Entrée lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 1 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 1 lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 1 lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 2 lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 3 lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Entrée lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Entrée lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 1 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 2 Igt - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 1 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 1 Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 2 Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Entrée Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Entrée Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Entrée Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 1 lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 3 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Entrée lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Entrée lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 1 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Placard 2 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 1 lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Chambre 2 lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Entrée lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Entrée lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Séjour lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P033	ZPSO	



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P033	ZPSO	
Dégagement Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P034	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 1 Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 1 Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 2 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 2 Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 2 Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 3 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Couloir Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Dégagement Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Entrée Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Entrée Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 1 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 1 Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 2 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 2 Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 2 Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 3 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Séjour Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Séjour Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Séjour Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 1 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 1 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 1 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 1 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 2 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 2 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 2 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P034	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 3 lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Couloir lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Dégagement lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Entrée lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Entrée lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Entrée lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 1 lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 1 lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 1 lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 1 lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 2 lgt - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 2 lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 2 lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 2 lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 3 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Séjour Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Séjour Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Séjour Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Séjour Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 1 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 1 Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 1 Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 2 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 2 Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 2 Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Entrée Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Entrée Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Entrée Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 1 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 1 lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 2 lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 2 lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 2 lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Séjour lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Séjour lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Séjour lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 1 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 1 lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 1 lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 2 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 2 lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 2 lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 3 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P034	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Couloir Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Dégagement Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Entrée Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Entrée Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 1 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 1 Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 1 Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 2 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 2 Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 2 Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 3 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Séjour Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Séjour Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Séjour Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 1 Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 2 lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Chambre 2 lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Entrée lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Entrée lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 1 lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 1 lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 2 lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Placard 2 lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Séjour lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Séjour lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P034	ZPSO	
Cuisine lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P035	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Cuisine lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Cuisine lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P035	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Sdb lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Sdb lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Wc lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Wc lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Wc lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Cuisine lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Cuisine lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Cuisine lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Sdb lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P035	ZPSO	



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Wc lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Wc lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Cuisine lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Cuisine lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Cuisine lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Sdb lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Sdb lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Sdb lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Wc lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Wc lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Wc lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Cuisine lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P035	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Cuisine Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Sdb Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Sdb Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Sdb Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Wc Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Wc Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Wc Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Cuisine Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Cuisine Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Sdb Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Sdb Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Wc Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	
Wc Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P035	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P036	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Sdb lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Wc lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Cuisine lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Wc lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Cuisine lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Cuisine lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Sdb lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Sdb lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P036	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Wc lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Cuisine lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Sdb lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Sdb lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Wc lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Cuisine lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Sdb lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Wc lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P036	ZPSO	
Sdb lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Sdb lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Wc lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Wc lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Wc lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Sdb lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Wc lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Wc lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Sdb lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Sdb lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Sdb lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Wc lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Wc lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Sdb lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Sdb lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Sdb lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Wc lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Wc lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Wc lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Cuisine lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Sdb lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Wc lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Wc lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
Sdb lgt 101 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P038 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 101 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P038 (Fr2)	ZPSO	
Sdb lgt 103 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P039 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Wc lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P041	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P041	ZPSO	



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P041	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Cuisine lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Sdb lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Wc lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P041	ZPSO	
Entrée lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 1 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 2 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 2 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 2 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 3 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Couloir lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Dégagement lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Entrée lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Entrée lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 1 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 1 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 Igt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 2 Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 2 Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 2 Igt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 3 Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Séjour Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Séjour Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Séjour Igt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 1 Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 1 Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 1 Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 1 Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 2 lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 2 lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 2 lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 3 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Couloir lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Dégagement lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Entrée lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Entrée lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 1 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 1 lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 1 lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 2 Igt - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 2 Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 2 Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 2 Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 3 Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Séjour Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Séjour Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Séjour Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Séjour Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 1 Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 1 Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 2 lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 2 lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 2 lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Entrée lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Entrée lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Entrée lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 1 lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 1 lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 1 lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 2 lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 2 lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Séjour lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Séjour lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Séjour lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 1 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 1 lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 1 lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 2 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 2 lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 2 lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 3 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Couloir lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Dégagement lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Entrée lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Entrée lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 1 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 1 lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 1 lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 2 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 2 lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 2 lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 3 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Séjour lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Séjour lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 1 Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 1 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 2 Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Chambre 2 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Entrée Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Entrée Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 1 Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 1 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 2 Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Placard 2 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Séjour Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P042	ZPSO	
Entrée Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P043	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 2 Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 3 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Entrée Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Placard 1 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 1 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 1 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 2 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 3 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Entrée Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Entrée Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P043	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Placard 1 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Placard 2 Igt - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 1 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 1 Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 2 Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Entrée Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Entrée Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Entrée Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P043	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 1 lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 1 lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 3 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Entrée lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Entrée lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Placard 1 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Placard 2 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 1 lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Chambre 2 lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Entrée lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Entrée lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P043	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P043	ZPSO	
Séjour lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 1 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 1 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 2 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 2 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 2 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 3 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Couloir lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Dégagement lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Entrée Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 1 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 1 Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 1 Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 3 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Séjour Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Séjour Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Séjour Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 1 lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 1 lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 1 lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 2 lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 2 lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 2 lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 2 lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 3 lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Couloir lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Dégagement lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Entrée lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Entrée Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 1 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 1 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 1 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 1 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 3 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Séjour Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Séjour Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Séjour Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 1 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 1 Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 1 Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 2 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 2 Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 2 Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Entrée Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Entrée Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Entrée Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 1 Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 1 Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Séjour Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Séjour Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Séjour Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 1 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 1 Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 1 Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 2 lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 2 lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 3 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Couloir lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Dégagement lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Entrée lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Entrée lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 1 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 1 lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 1 lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 2 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 3 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Séjour Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Séjour Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Séjour Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 1 Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 1 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 2 Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Chambre 2 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Entrée Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Entrée Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 1 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Placard 2 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Séjour Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Séjour Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P044	ZPSO	
Sdb Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine Igt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Cuisine Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Cuisine Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Sdb Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Sdb Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Wc lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Wc lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Wc lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Cuisine lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Cuisine lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Cuisine lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Wc lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Wc lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Cuisine lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Cuisine lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Cuisine lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Sdb lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Sdb lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Sdb lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Wc lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Wc lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Wc lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Cuisine Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Cuisine Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Sdb Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Sdb Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Sdb Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Wc Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Wc Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Wc Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Cuisine Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Cuisine Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Sdb Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Wc lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Wc lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P045	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P047 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Entrée lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Colle polystyrène	P048	RESULTAT ANALYSE	
Séjour lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Colle polystyrène	P048	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P049 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 204 - R+2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P049 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P052	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Cuisine lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Cuisine lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Sdb lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Sdb lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P052	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Wc lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Wc lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Cuisine lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Cuisine lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Cuisine lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Sdb lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Wc lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Wc lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Cuisine lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Cuisine lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Cuisine lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Sdb lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Sdb lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Sdb lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Wc lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Wc lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Wc lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Cuisine lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Cuisine lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Cuisine lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Sdb lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Sdb lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Wc lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Wc lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Wc lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Cuisine lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Cuisine lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Sdb lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Sdb lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Wc lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Wc lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P052	ZPSO	
Sdb lgt 304 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P053 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P054	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P054	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P054	ZPSO	
Sdb lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P054	ZPSO	
Wc lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P054	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P054	ZPSO	
Cuisine lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P054	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P054	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P054	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P054	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P054	ZPSO	
Wc lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P054	ZPSO	
Cuisine lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P054	ZPSO	
Sdb lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P054	ZPSO	
Sdb lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P054	ZPSO	
Wc lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P054	ZPSO	
Wc lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P054	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P054	ZPSO	
Sdb lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P054	ZPSO	
Sdb lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P054	ZPSO	
Wc lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P054	ZPSO	
Cuisine lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduits de lissage	P054	ZPSO	
Sdb lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P054	ZPSO	
Wc lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P054	ZPSO	
Chambre 1 lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P055	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Chambre 2 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Chambre 3 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Entrée lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Entrée lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Placard 1 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Séjour lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P055	ZPSO	



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Chambre 1 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Chambre 2 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Chambre 3 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Cuisine Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Entrée Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Entrée Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Entrée Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Placard 1 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Placard 2 Igt - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Séjour Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Séjour Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Séjour Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Chambre 1 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Chambre 1 Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P055	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Entrée lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Entrée lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Entrée lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Séjour lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Séjour lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Séjour lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Chambre 1 lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Chambre 1 lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Chambre 3 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Entrée lgt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Entrée lgt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Placard 1 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Placard 2 lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Séjour lgt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P055	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Séjour Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Chambre 1 Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Chambre 2 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Entrée Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Entrée Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Séjour Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Séjour Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduits de lissage	P055	ZPSO	
Séjour Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduits de lissage	P056	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 1 Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 1 Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 2 Igt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 2 Igt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 2 Igt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P056	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 3 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Couloir lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Dégagement lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Entrée lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Entrée lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 1 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 1 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 1 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 2 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 2 lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 2 lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 3 lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Séjour lgt 101 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Séjour lgt 102 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Séjour lgt 103 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P056	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 1 lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 1 lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 1 lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 2 lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 2 lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 2 lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 2 lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 3 lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Couloir lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Dégagement lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Entrée lgt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Entrée lgt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Entrée lgt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 1 lgt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 1 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 1 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 2 Igt - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 2 Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 2 Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 2 Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 3 Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Séjour Igt 201 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Séjour Igt 202 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Séjour Igt 203 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Séjour Igt 204 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 1 Igt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 1 Igt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 1 Igt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 2 lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 2 lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Entrée lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Entrée lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Entrée lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 1 lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 1 lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 1 lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 2 lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 2 lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 2 lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Séjour lgt 302 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Séjour lgt 303 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Séjour lgt 304 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P056	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 1 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 1 Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 1 Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 2 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 2 Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 2 Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 3 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Couloir Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Dégagement Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Entrée Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Entrée Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 1 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 1 Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 1 Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 2 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 2 Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 3 Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Séjour Igt 401 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Séjour Igt 402 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Séjour Igt 404 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 1 Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 1 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 2 Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Chambre 2 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Entrée Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Entrée Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 1 Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 1 Igt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Placard 2 Igt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Séjour lgt 002 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Séjour lgt 003 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduits de lissage	P056	ZPSO	
Séjour lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	RESULTAT ANALYSE	
Chambre 1 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 1 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 1 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 2 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 2 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 2 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 3 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Couloir lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Dégagement lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 1 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 1 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 1 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 2 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 2 lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 2 lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 3 lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 1 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 1 lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 1 lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 1 lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 2 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 2 lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 2 lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 2 lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 3 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Couloir lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Dégagement lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 1 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 1 lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 1 lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 1 lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 2 lgt - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 2 lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 2 lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 2 lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 3 lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Séjour Igt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour Igt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour Igt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour Igt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 1 Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 1 Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 1 Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 2 Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 2 Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 2 Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Entrée Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 1 Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 1 Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 1 Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 2 Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 2 Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 2 Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour Igt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour Igt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 1 Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 1 Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 1 Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Chambre 2 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 2 lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 2 lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 3 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Couloir lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Dégagement lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 1 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 1 lgt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 1 lgt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 2 lgt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	



Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 2 Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 2 Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 3 Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 1 Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 1 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 2 Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Chambre 2 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Entrée Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Placard 1 Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 1 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 2 Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Placard 2 Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Séjour Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P057	ZPSO	
Sdb Igt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	RESULTAT ANALYSE	
Cuisine Igt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Cuisine Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Cuisine Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Sdb Igt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Sdb Igt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Wc lgt 101 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Wc lgt 102 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Wc lgt 103 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Cuisine lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Cuisine lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Cuisine lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Cuisine lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Sdb lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Sdb lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Sdb lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Sdb lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Wc lgt 201 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Wc lgt 202 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Wc lgt 203 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Wc lgt 204 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Cuisine lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Cuisine lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Cuisine lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Sdb lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Sdb lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Wc lgt 302 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Wc lgt 303 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Wc lgt 304 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Cuisine Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Cuisine Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Cuisine Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Sdb Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Sdb Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Sdb Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Wc Igt 401 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Wc Igt 402 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Wc Igt 404 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Cuisine Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Cuisine Igt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Sdb Igt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sdb lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Wc lgt 002 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Wc lgt 003 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P059	ZPSO	
Sdb lgt 302 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P060 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 302 - R+3	Revêtements de sols	Sol	Dalles de sol	P060 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 102 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P061 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
Sdb lgt 102 - R+1	Revêtements de sols	Sol	Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples	P061 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	

ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

## ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

Identification : P001

Pièce et étage : Palier 1 R+1

Localisation : Mur E

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P002

Pièce et étage : Palier 1 R+4

Localisation : Trappe

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Peinture)

Descriptif Laboratoire : Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P003

Pièce et étage : Palier 1 R+4

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P006


Pièce et étage : Gains techniques Igt R+3


Localisation : Chutes EU / EV


Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Conduit)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau gris en vrac avec fibres visibles


Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)

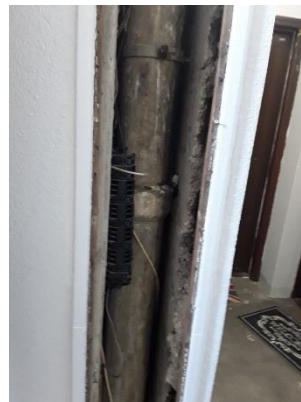

Identification : P007
Pièce et étage : Cage d'escalier 2 R+1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P008
Pièce et étage : Cage d'escalier 2 R+3
Localisation : Sous face d'escalier
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P009
Pièce et étage : Cage d'escalier 2 R+3
Localisation : Main-courante
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Peinture)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)
néant

Identification : P010
Pièce et étage : Palier 1 R+2
Localisation : Trappe
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Peinture)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en faible quantité en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)




Identification : P011


Pièce et étage : Palier 1 R+1

Localisation : Mur E

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P012


Pièce et étage : Palier 1 R+2

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)

Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P014


Pièce et étage : Palier 1 R+1

Localisation : Mur H

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P015


Pièce et étage : Cage d'escalier 2 R+1


Localisation : Sous face d'escalier


Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit béton)


Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable


Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)





Identification : P016
Pièce et étage : Cage d'escalier 2 R+1
Localisation : Main-courante
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Peinture)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P017
Pièce et étage : Circulation 2 bâtiment 8 RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise avec poussières
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P018
Pièce et étage : Circulation 2 bâtiment 8 RC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle grise
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P019
Pièce et étage : Circulation 2 bâtiment 8 RC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en faible quantité avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P020
Pièce et étage : Circulation 1 bâtiment 8 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Peinture plaque de plâtre)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P022 (Fr1)
Pièce et étage : Circulation 1 bâtiment 8 RC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle faïence)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P022 (Fr2)
Pièce et étage : Circulation 1 bâtiment 8 RC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle grise
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P023 (Fr1)
Pièce et étage : Circulation 2 bâtiment 8 RC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P023 (Fr2)
Pièce et étage : Circulation 2 bâtiment 8 RC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P023 (Fr3)
Pièce et étage : Circulation 2 bâtiment 8 RC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Couche plâtreuse blanche
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P024 (Fr1)


Pièce et étage : Accès cave R-1

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit plaque de plâtre)

Descriptif Laboratoire : Carton avec aluminium avec poussières

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P024 (Fr2)


Pièce et étage : Accès cave R-1

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit plaque de plâtre)

Descriptif Laboratoire : Matériau fibreux jaune avec poussières

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P024 (Fr3)


Pièce et étage : Accès cave R-1

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit plaque de plâtre)

Descriptif Laboratoire : Matériau plâtreux blanc avec poussières

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P025


Pièce et étage : Accès cave R-1

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Autres (Enduit / Calicot)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P026


Pièce et étage : entree lgt 002 RC

Localisation : Plafond

Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)

Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P027


Pièce et étage : Wc lgt 002 RC


Localisation : Mur D


Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)


Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène


Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)





Identification : P028
Pièce et étage : wc lgt 002 RC
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P029
Pièce et étage : Chambre 1 lgt 002 RC
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P030
Pièce et étage : Séjour lgt 002 RC
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P031 (Fr1)
Pièce et étage : sdb lgt 002 RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples)
Descriptif Laboratoire : Revêtement souple beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P031 (Fr2)
Pièce et étage : sdb lgt 002 RC
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples)
Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P032
Pièce et étage : couloir lgt 101 R+1
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)




**Identification : P033**


**Pièce et étage : Séjour lgt 101 R+1**

**Localisation : Mur E**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)**

**Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**

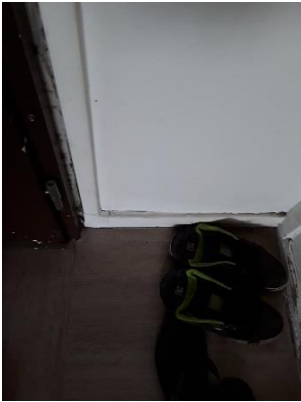

**Identification : P034**


**Pièce et étage : Dégagement lgt 101 R+1**

**Localisation : Mur D**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)**

**Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P035**


**Pièce et étage : Cuisine lgt 101 R+1**

**Localisation : Mur F**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)**

**Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P036**


**Pièce et étage : Sdb lgt 101 R+1**

**Localisation : Mur C**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)**

**Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P037**


**Pièce et étage : sdb lgt 101 R+1**

**Localisation : Plafond**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)**

**Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P038 (Fr1)**


**Pièce et étage : sdb lgt 101 R+1**


**Localisation : Sol**


**Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)**


**Descriptif Laboratoire : Colle grise avec couche bitumineuse et poussières**


**Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)**





Identification : P038 (Fr2)
Pièce et étage : sdb lgt 101 R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P039 (Fr1)
Pièce et étage : sdb lgt 103 R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)
Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante noire avec couche bitumineuse et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P039 (Fr2)
Pièce et étage : sdb lgt 103 R+1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)
Descriptif Laboratoire : Ragréage gris
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P040
Pièce et étage : sdb lgt 201 R+2
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire :
Résultat (justification) : Refus



Identification : P041
Pièce et étage : Wc lgt 202 R+1
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P042
Pièce et étage : entree lgt 202 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P043
Pièce et étage : Entrée Igt 202 R+1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P044
Pièce et étage : Séjour Igt 202 R+1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P045
Pièce et étage : sdb Igt 202 R+2
Localisation : Plafond
Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P046
Pièce et étage : sdb Igt 202 R+2
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)
Descriptif Laboratoire : Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)




**Identification : P047 (Fr1)**


**Pièce et étage : sdb lgt 203 R+2**

**Localisation : Sol**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples)**

**Descriptif Laboratoire : Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + ragréage gris**

**Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P047 (Fr2)**


**Pièce et étage : sdb lgt 203 R+2**

**Localisation : Sol**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples)**

**Descriptif Laboratoire : Revêtement souple beige**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P048**


**Pièce et étage : entree lgt 203 R+2**

**Localisation : Plafond**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Colle polystyrène)**

**Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + polystyrène blanc + colle polymère beige non séparable**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P049 (Fr1)**


**Pièce et étage : sdb lgt 204 R+2**

**Localisation : Sol**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)**

**Descriptif Laboratoire : Carrelage**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P049 (Fr2)**


**Pièce et étage : sdb lgt 204 R+2**

**Localisation : Sol**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)**

**Descriptif Laboratoire : Colle grise avec poussières**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P050**


**Pièce et étage : sdb lgt 404 R+4**


**Localisation : Sol**


**Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)**


**Descriptif Laboratoire :**


**Résultat (justification) : Refus**





Identification : P051
Pièce et étage : Couloir 1 R+4
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire :
Résultat (justification) : Refus


Identification : P052
Pièce et étage : Sdb lgt 304 R+2
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P053 (Fr1)
Pièce et étage : sdb lgt 304 R+3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P053 (Fr2)
Pièce et étage : sdb lgt 304 R+3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise hétérogène avec couche bitumineuse et poussières
Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P054
Pièce et étage : Cuisine lgt 304 R+3
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P055
Pièce et étage : Chambre 1 lgt 304 R+2
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


**Identification : P056**


**Pièce et étage : Séjour lgt 304 R+2**

**Localisation : Mur A**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduits de lissage)**

**Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau gris hétérogène avec couche cartonnée**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P057**


**Pièce et étage : séjour lgt 304 R+3**

**Localisation : Plafond**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)**

**Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P058**


**Pièce et étage : séjour lgt 304 R+3**

**Localisation : Ventilation haute**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) (Conduits en fibres-ciment)**

**Descriptif Laboratoire : Matériau compact beige avec fibres visibles avec poussières**

**Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P059**


**Pièce et étage : sdb lgt 304 R+3**

**Localisation : Plafond**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Plafonds (Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés)**

**Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P060 (Fr1)**


**Pièce et étage : sdb lgt 302 R+3**

**Localisation : Sol**

**Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)**

**Descriptif Laboratoire : Revêtement cassant gris**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



**Identification : P060 (Fr2)**


**Pièce et étage : sdb lgt 302 R+3**


**Localisation : Sol**


**Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Dalles de sol)**


**Descriptif Laboratoire : Colle polymère incolore non séparable + ragréage gris hétérogène**

**Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)**



<b>Identification : P061 (Fr1)</b>
<b>Pièce et étage : sdb lgt 102 R+1</b>
<b>Localisation : Sol</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Revêtement souple beige</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P061 (Fr2)</b>
<b>Pièce et étage : sdb lgt 102 R+1</b>
<b>Localisation : Sol</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Matériau compact gris</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)</b>


<b>Identification : P061 (Fr3)</b>
<b>Pièce et étage : sdb lgt 102 R+1</b>
<b>Localisation : Sol</b>
<b>Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Sous-couches (carton, feutre, -) des revêtements souples)</b>
<b>Descriptif Laboratoire : Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris avec couche bitumineuse et poussières</b>
<b>Résultat (justification) : Amiante détecté (RESULTAT ANALYSE)</b>


# ANNEXE 2 - PV ANALYSES



3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

## RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28180 EN DATE DU 02/06/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

### Prélèvement :

Commande ITGA : IT0720-31842  
Echantillon ITGA : IT072005-28180  
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--01
Dossier client	Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P001 / Bâtiment collectif - - - / Palier 1 Mur E Enduit
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

### Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 17

Page 1 / 1





3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28181 EN DATE DU 02/06/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0720-31842  
Echantillon ITGA : IT072005-28181  
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--01
Dossier client	Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P002 / Bâtiment collectif - - / Palier 1 Trappe Peinture
Description ITGA	Peinture en faible quantité / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture en faible quantité non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28182 EN DATE DU 02/06/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0720-31842  
Echantillon ITGA : IT072005-28182  
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--01
Dossier client	Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P003 / Bâtiment collectif - - - / Palier 1 Plafond Enduit béton
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28185 EN DATE DU 02/06/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0720-31842  
Echantillon ITGA : IT072005-28185  
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--01
Dossier client	Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P006 / Bâtiment collectif - - - / Cave 4 Gaines techniques lgt Chutes EU EV Conduit
Description ITGA	Peinture / Matériau gris en vrac avec fibres visibles

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

**Technique Analytique :**

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + matériau gris en vrac avec fibres visibles	MOLP le 29/05/2020	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire







3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28186 EN DATE DU 02/06/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**  
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0720-31842  
Echantillon ITGA : IT072005-28186  
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--01
Dossier client	Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P007 / Bâtiment collectif - - - / Cage d'escalier 2 Mur B Enduit béton
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28187 EN DATE DU 02/06/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0720-31842  
Echantillon ITGA : IT072005-28187  
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--01
Dossier client	Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P008 / Bâtiment collectif - - - / Cage d'escalier 2 Sous face d'escalier Enduit béton
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit gris en vrac

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac non séparable	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28188 EN DATE DU 02/06/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0720-31842  
Echantillon ITGA : IT072005-28188  
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--01
Dossier client	Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P009 / Bâtiment collectif - - - / Cage d'escalier 2 Main-courante Peinture
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples en vrac	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28189 EN DATE DU 02/06/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0720-31842  
Echantillon ITGA : IT072005-28189  
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--01
Dossier client	Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P010 / Bâtiment collectif - - - / Palier 1 Trappe Peinture
Description ITGA	Peintures multiples en faible quantité en vrac

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples en faible quantité en vrac	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28190 EN DATE DU 02/06/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0720-31842  
Echantillon ITGA : IT072005-28190  
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--01
Dossier client	Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P011 / Bâtiment collectif - - - / Palier 1 Mur E Enduit
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris non séparable	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire







3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28191 EN DATE DU 02/06/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0720-31842  
Echantillon ITGA : IT072005-28191  
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--01
Dossier client	Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P012 / Bâtiment collectif - - - / Palier 1 Plafond Enduit béton
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28193 EN DATE DU 02/06/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0720-31842  
Echantillon ITGA : IT072005-28193  
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--01
Dossier client	Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P014 / Bâtiment collectif - - - / Palier 1 Mur H Enduit béton
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28194 EN DATE DU 02/06/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**  
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0720-31842  
Echantillon ITGA : IT072005-28194  
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--01
Dossier client	Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P015 / Bâtiment collectif - - - / Cage d'escalier 2 Sous face d'escalier Enduit béton
Description ITGA	Peintures multiples en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire







3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28195 EN DATE DU 02/06/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0720-31842  
Echantillon ITGA : IT072005-28195  
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--01
Dossier client	Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P016 / Bâtiment collectif - - - / Cage d'escalier 2 Main-courante Peinture
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples en vrac	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28196 EN DATE DU 02/06/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0720-31842  
Echantillon ITGA : IT072005-28196  
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--01
Dossier client	Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P017 / Bâtiment collectif - - - / Accès cave Circulation 2 bâtiment 8 Sol Colle carrelage
Description ITGA	Colle grise avec poussières

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Colle grise avec poussières	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28197 EN DATE DU 02/06/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0720-31842  
Echantillon ITGA : IT072005-28197  
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--01
Dossier client	Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P018 / Bâtiment collectif - - - / Accès cave Circulation 2 bâtiment 8 Mur C Colle plinthe
Description ITGA	Colle grise

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Colle grise	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28198 EN DATE DU 02/06/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**  
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0720-31842  
Echantillon ITGA : IT072005-28198  
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--01
Dossier client	Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P019 / Bâtiment collectif - - - / Accès cave Circulation 2 bâtiment 8 Mur B Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Peintures multiples en faible quantité avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples en faible quantité avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier non séparable	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28199 EN DATE DU 02/06/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0720-31842  
Echantillon ITGA : IT072005-28199  
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--01
Dossier client	Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P020 / Bâtiment collectif - - - / Accueil Circulation 1 bâtiment 8 Plafond Enduit Peinture plaque de plâtre
Description ITGA	Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire







3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28201 EN DATE DU 02/06/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**  
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0720-31842  
Echantillon ITGA : IT072005-28201  
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--01
Dossier client	Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P022 / Bâtiment collectif - - - / Accueil Circulation 1 bâtiment 8 Mur B Colle faïence
Description ITGA	Carrelage / Colle grise

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Carrelage	META (1) le 02/06/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle grise	META (1) le 02/06/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28202 EN DATE DU 02/06/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**  
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0720-31842  
Echantillon ITGA : IT072005-28202  
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--01
Dossier client	Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P023 / Bâtiment collectif - - - / Accès cave Circulation 2 bâtiment 8 Mur B Colle plinthe
Description ITGA	Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Carrelage	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle beige	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Couche plâtreuse blanche	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28203 EN DATE DU 02/06/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**  
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0720-31842  
Echantillon ITGA : IT072005-28203  
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--01
Dossier client	Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P024 / Bâtiment collectif - - - / Accès cave Plafond Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Carton avec aluminium avec poussières / Matériau fibreux jaune avec poussières / Matériau plâtreux blanc avec poussières

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)  
(2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Carton avec aluminium avec poussières	META (1) le 02/06/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Matériau fibreux jaune avec poussières	META (1) le 02/06/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Matériau plâtreux blanc avec poussières	META (1) le 02/06/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire







3 rue Armand Herpin Lacroix  
35000 RENNES  
Tél : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967  
Liste des sites et portées  
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT072005-28204 EN DATE DU 02/06/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0720-31842  
Echantillon ITGA : IT072005-28204  
Reçu au laboratoire le : 25/05/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--01
Dossier client	Batiment N°8--01 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P025 / Bâtiment collectif - - / Accès cave Plafond Enduit Calcot
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 29/05/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5439 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5439  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P026 / Bâtiment collectif - - - / Espace restauration entree lgt 002 Plafond
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5440 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5440  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :**

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P027 / Bâtiment collectif - - - / Façade arrière Wc lgt 002 Mur D
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène

**Préparation :**

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5441 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5441  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P028 / Bâtiment collectif - - - / Façade arrière wc lgt 002 Plafond
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau gris en vrac

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc + matériau gris en vrac non séparable	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5442 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5442  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P029 / / Local 2 Chambre 1 lgt 002 Mur B
Description ITGA	Peinture / Matériau gris en vrac hétérogène

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste







Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5443 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5443  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P030 / Bâtiment collectif - - / Local 1 Séjour lgt 002 Mur C
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5444 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5444  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P031 / Bâtiment collectif - - - / Façade avant sdb lgt 002 Sol
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement souple beige	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5445 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5445  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P032 / Bâtiment collectif - - - / Demi-Paliers couloir lgt 101 Plafond
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste







Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5446 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5446  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P033 / Bâtiment collectif - - - / Cour intérieure Séjour lgt 101 Mur E
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5447 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5447  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P034 / Bâtiment collectif - - - / Cuisine Dégagement lgt 101 Mur D
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau gris en vrac hétérogène

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5448 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**  
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5448  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P035 / Bâtiment collectif - - / Voir commentaire Cuisine lgt 101 Mur F
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5449 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5449  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P036 / Bâtiment collectif - - / Cuisine 1 Sdb lgt 101 Mur C
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5450 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**  
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5450  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P037 / Bâtiment collectif - - - / Cuisine 1 sdb lgt 101 Plafond
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste







Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5451 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**  
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5451  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P038 / Bâtiment collectif - - - / Cuisine 1 sdb lgt 101 Sol
Description ITGA	Carrelage / Colle grise avec couche bitumineuse et poussières

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Carrelage	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	3
▶ Colle grise avec couche bitumineuse et poussières	META (2) le 08/07/2020	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5452 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5452  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P039 / Bâtiment collectif - - / Cave 5 sdb lgt 103 Sol
Description ITGA	Dalle dure cassante noire avec couche bitumineuse et poussières / Ragréage gris

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Dalle dure cassante noire avec couche bitumineuse et poussières	META (2) le 08/07/2020	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
▶ Ragréage gris	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste







Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5453 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**  
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5453  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P041 / Bâtiment collectif - - - / Couloir Wc lgt 202 Mur C
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau gris en vrac

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5454 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5454  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P042 / Bâtiment collectif - - - / Chaufferies entree lgt 202 Plafond
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5455 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**  
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5455  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P043 / Bâtiment collectif - - - / Chaufferies Entrée lgt 202 Mur A
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5456 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**  
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5456  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P044 / Bâtiment collectif - - - / Couloir 4 Séjour lgt 202 Mur A
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5457 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5457  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P045 / Bâtiment collectif - - - / Couloir 1 sdb lgt 202 Plafond
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste







Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5458 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5458  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P046 / Bâtiment collectif - - - / Couloir 1 sdb lgt 202 Sol
Description ITGA	Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)


**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Dalle dure cassante grise + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	META (2) le 08/07/2020	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5459 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5459  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P047 / Bâtiment collectif - - / Cave 5 sdb lgt 203 Sol
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle bitumineuse noire avec poussières / Ragrée gris

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement souple beige	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	4
▶ Colle bitumineuse noire avec poussières non séparable + ragréage gris	META (2) le 08/07/2020	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste







Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5460 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5460  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P048 / Bâtiment collectif - - - / Cave 2 entree lgt 203 Plafond Colle polystyrène
Description ITGA	Peinture / Polystyrène blanc / Colle polymère beige

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + polystyrène blanc + colle polymère beige non séparable	META (2) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5461 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5461  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P049 / Bâtiment collectif - - - / Entrée sdb lgt 204 Sol
Description ITGA	Carrelage / Colle grise avec poussières

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)


**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Carrelage	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle grise avec poussières	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5462 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5462  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P052 / Bâtiment collectif - - - / Entrée Sdb lgt 304 Mur C
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5463 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5463  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P053 / Bâtiment collectif - - - / Entrée sdb lgt 304 Sol
Description ITGA	Carrelage / Colle grise hétérogène avec couche bitumineuse et poussières

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)


**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Carrelage	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	3
▶ Colle grise hétérogène avec couche bitumineuse et poussières	META (2) le 08/07/2020	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	3

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5464 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**  
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5464  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P054 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 2 Cuisine lgt 304 Mur E
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste







Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5465 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5465  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P055 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 4 Chambre 1 lgt 304 Mur B
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5466 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5466  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P056 / Bâtiment collectif - - - / Entrée 3 Séjour lgt 304 Mur A
Description ITGA	Peinture / Matériau gris hétérogène avec couche cartonnée

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + matériau gris hétérogène avec couche cartonnée	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste







Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5467 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5467  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P057 / / Entrée 3 séjour lgt 304 Plafond
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5468 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5468  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P058 / Bâtiment collectif - - / Entrée 3 séjour lgt 304 Ventilation haute
Description ITGA	Matériau compact beige avec fibres visibles avec poussières

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

**Technique Analytique :**


- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Matériau compact beige avec fibres visibles avec poussières	MOLP le 07/07/2020	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5469 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**  
SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5469  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P059 / Bâtiment collectif - - - / Entrée sdb lgt 304 Plafond
Description ITGA	Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5470 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5470  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P060 / Bâtiment collectif - - / Couloir 1 sdb lgt 302 Sol
Description ITGA	Revêtement cassant gris / Colle polymère incolore / Ragréage gris hétérogène

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
  - (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement cassant gris	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère incolore non séparable + ragréage gris hétérogène	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste





Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tél : 03.20.86.20.72  
Fax : 03.20.87.99.78  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971  
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ▶

**RAPPORT D'ESSAI N° IT022007-5471 EN DATE DU 08/07/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

**Client :**

SOCOTEC DIAGNOSTIC VILLEPINTE (EHIV)  
M. Mickael JULIEN  
22 Avenue des Nations  
93420 VILLEPINTE

**Prélèvement :**

Commande ITGA : IT0220-13915  
Echantillon ITGA : IT022007-5471  
Reçu au laboratoire le : 02/07/2020

**Réf. Client :** Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	Batiment N°8--02
Dossier client	Batiment N°8--02 - 3 a 10 avenue de Rothschild 77400 LAGNY SUR MARNE
Echantillon	Batiment N°8P061 / Bâtiment collectif - - - / Couloir 1 sdb lgt 102 Sol
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris avec couche bitumineuse et poussières / Matériau compact gris

**Préparation :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (1)- Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
- (2)- Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

**Technique Analytique :**


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse.

**Résultat :**

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
▶ Revêtement souple beige	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris avec couche bitumineuse et poussières	META (2) le 08/07/2020	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
▶ Matériau compact gris	META (1) le 08/07/2020	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Thomas OBEIN - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 18

Page 1 / 1

## ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible

### REFUS DE PRELEVEMENT

**Nom du propriétaire/locataire :**

**Adresse :** 8 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400 LAGNY SUR MARNE

Refuse que Mr JULIEN Mickaël technicien de la sté SOCOTEC DIAGNOSTIC prélève les échantillons suivants :

PIECE	ELEMENT	SIGNATURE
sdb lgt 201 1		Aucune signature disponible
sdb lgt 404 1		Aucune signature disponible
Couloir 1 1		Aucune signature disponible

Dans le but de vérifier si le matériau contient ou non de l'amiante

A LAGNY SUR MARNE

Le 01/07/2020



# ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES



**CERTIFICAT**  
N° DTI / 2003-007

Certifié par la présente que :

**Mickaël JULIEN**

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU(DES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A, B et C et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	06/07/2020	06/07/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A, B et C et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens relatifs à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	06/07/2020	05/07/2027
CREP	Constats de risque d'exposition au plomb	23/12/2016	22/12/2021
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	28/10/2016	25/10/2021
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	17/02/2017	16/02/2022

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 2 juillet 2016 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des comités de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles de grande hauteur
- Arrêté du 15 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification



ACCREDITATION N° 4-0095  
FORTE DISPONIBILITEUR  
www.cofrac.fr

Directeur Opérationnel **Guillaume Rey**

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification Internationale est matérialisée par la présence dans l'immatricule des certifiés disponibles sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : [www.socotec-certification-international.fr](http://www.socotec-certification-international.fr).  
SOCOTEC Certification France - 13, boulevard Vainoy 75297 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Orléans 495 894 339 - www.socotec-certification-international.fr



# ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Assurance  
▶ RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

COURTIER  
**VD ASSOCIES**  
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER  
33110 LE BOUSCAT  
Tél : 05 56 30 95 75  
Fax : 08 97 50 56 06  
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR  
Portefeuille : 0201478984

Vos références :

Contrat n° 10158549604  
Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

**SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME**

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

**AMIANTE :**  
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE  
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE  
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES  
CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )  
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )  
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION  
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

**PLOMB :**  
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU  
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )  
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )  
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

**ETAT PARASITAIRE :**  
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES  
ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETES, LYCTUS )  
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALUR )

**MESURES :**  
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN  
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

10158549604180710

65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )

ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)

ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS)

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE

PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.

ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.

DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF

ETAT DES LIEUX LOCATIFS

DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE

CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION

DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO

INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES

THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.

DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE

DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG ) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN

URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION

DE BIENS IMMOBILIERS.

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES

EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

CENTRE DE FORMATION

MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE

DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ

VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINES DE LEVAGE ET DE CHANTIER

DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE

CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX

RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 02 Janvier 2020

Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre





Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460


Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

## ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS

## Rdc du bâtiment n 8

-  Main courante
-  Ventilation haute en fibrociment
-  Chaudière
-  Descente EU en fibrociment

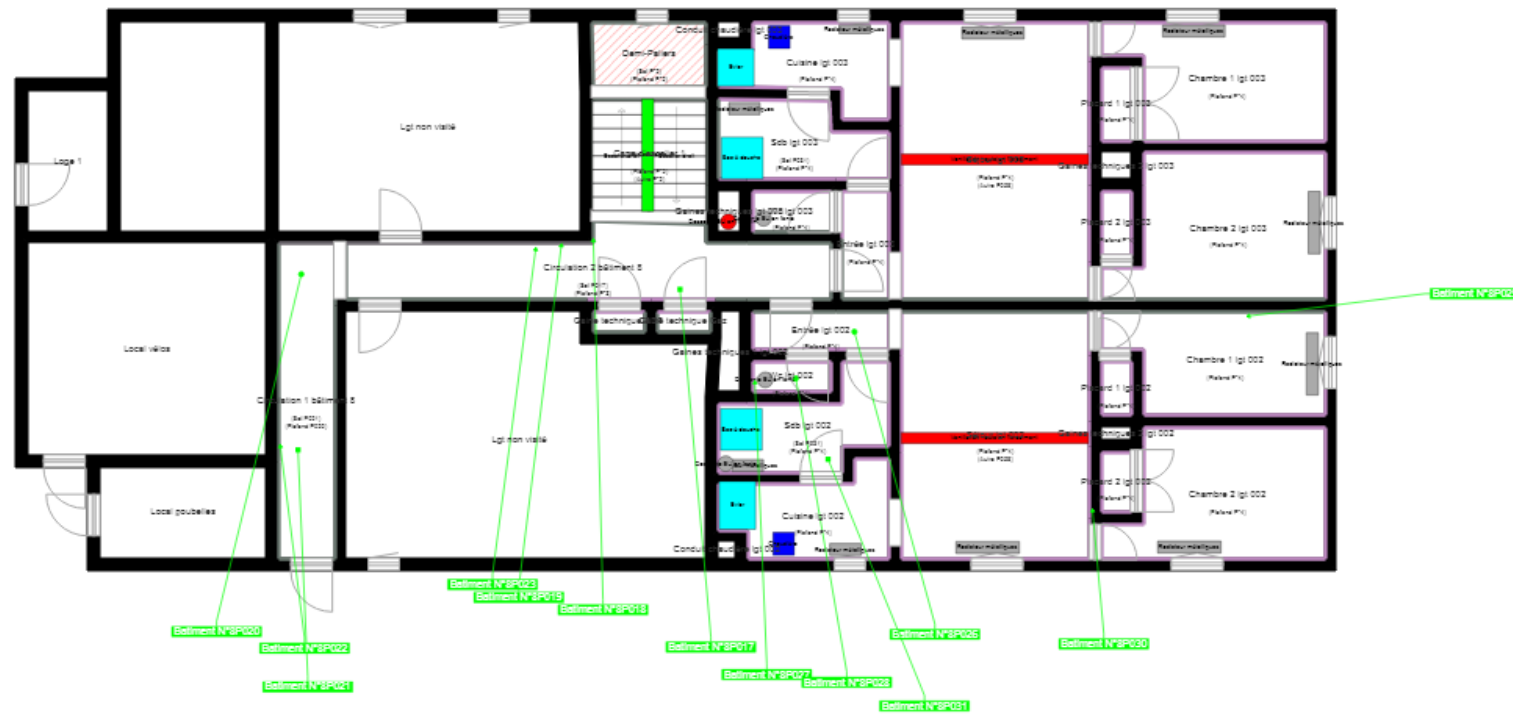

## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : Batiment N°8 - Batiment NÂ°8 8  
 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400  
 LAGNY SUR MARNE












Zone :RC

Plan


Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :1/6

### Légende des prélèvements :

-  Prélèvement de sol amianté
-  Prélèvement de sol non amianté
-  Prélèvement de plafond amianté
-  Prélèvement de plafond non amianté
-  Prélèvement de mur amianté
-  Prélèvement de mur non amianté
-  Autre type de prélèvement amianté
-  Autre type de prélèvement non amianté
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés

### 1er étage du bâtiment n 8

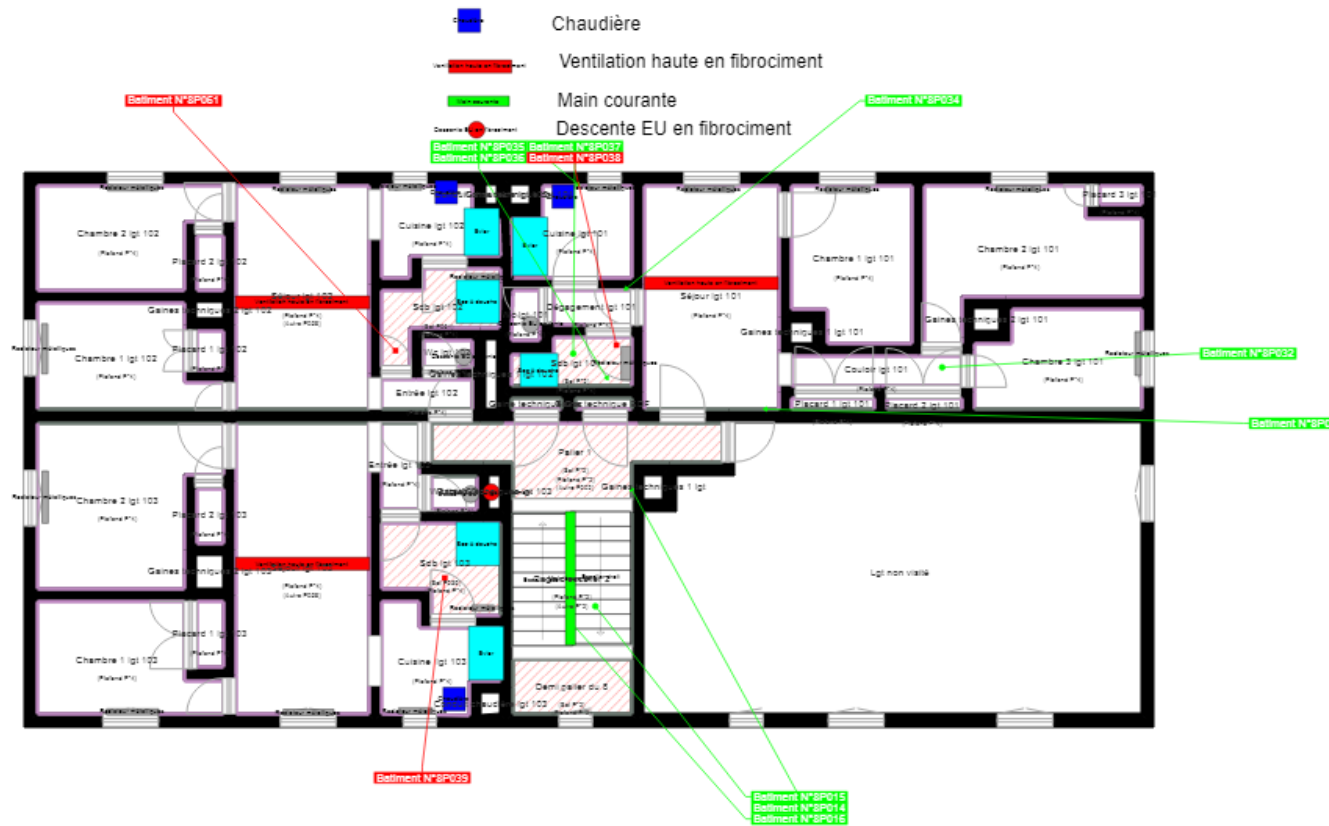

#### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : Batiment N°8 - Batiment N°8 8  
 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400  
 LAGNY SUR MARNE

Zone :R+1

Plan


Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :2/6

#### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- ➔ Prélèvement de mur amianté
- ➔ Prélèvement de mur non amianté
- ✕ Autre type de prélèvement amianté
- ✕ Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▨ Plafonds amiantés
- ▨ Sols et plafonds amiantés

## 2eme étages du bâtiment n 8

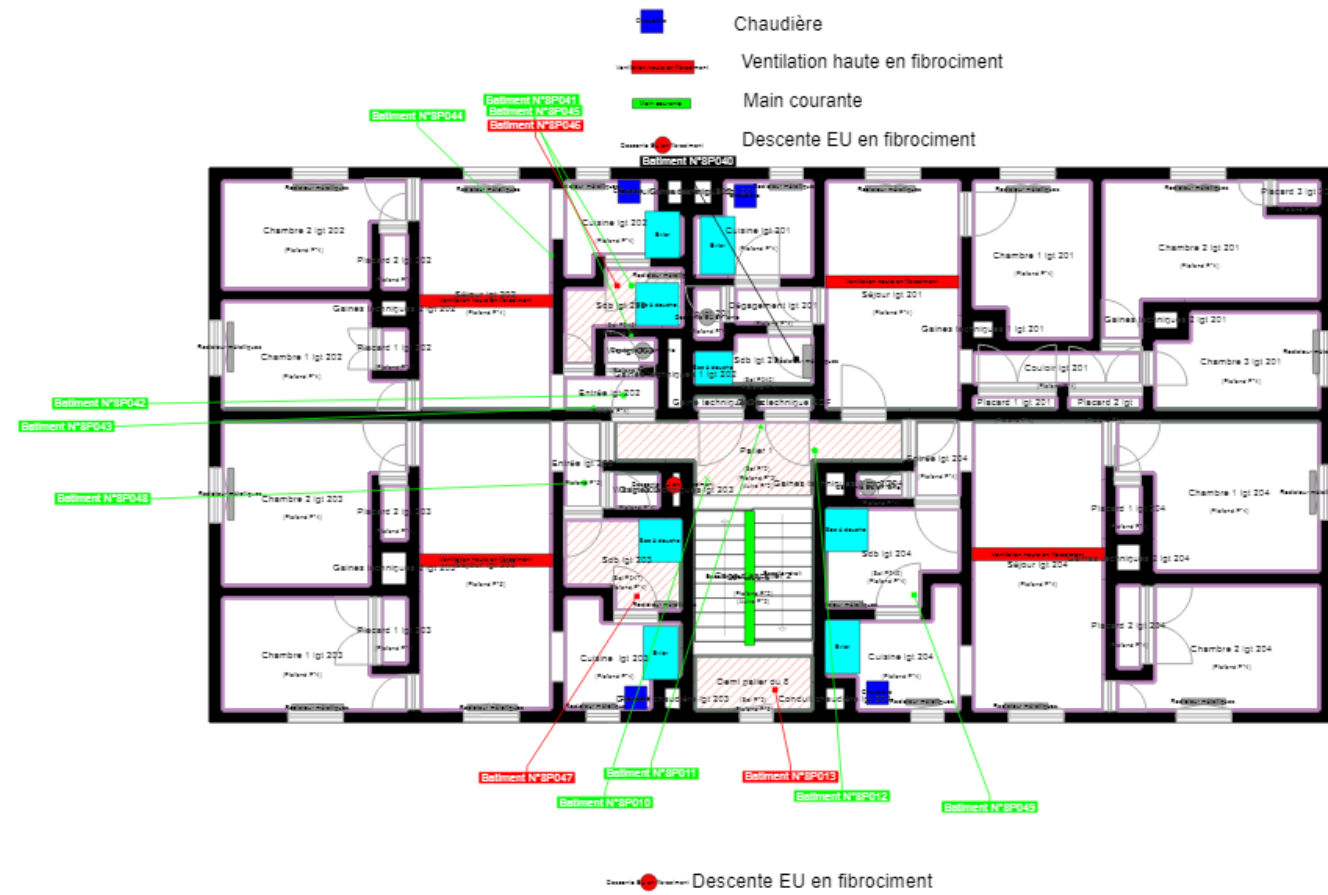

### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : Batiment N°8 - Batiment NÂ°8 8  
 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400  
 LAGNY SUR MARNE

Zone :R+2

Plan


Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :3/6

#### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- // Soils amiantés
- // Plafonds amiantés
- // Soils et plafonds amiantés

### 3eme étages du bâtiment n 8

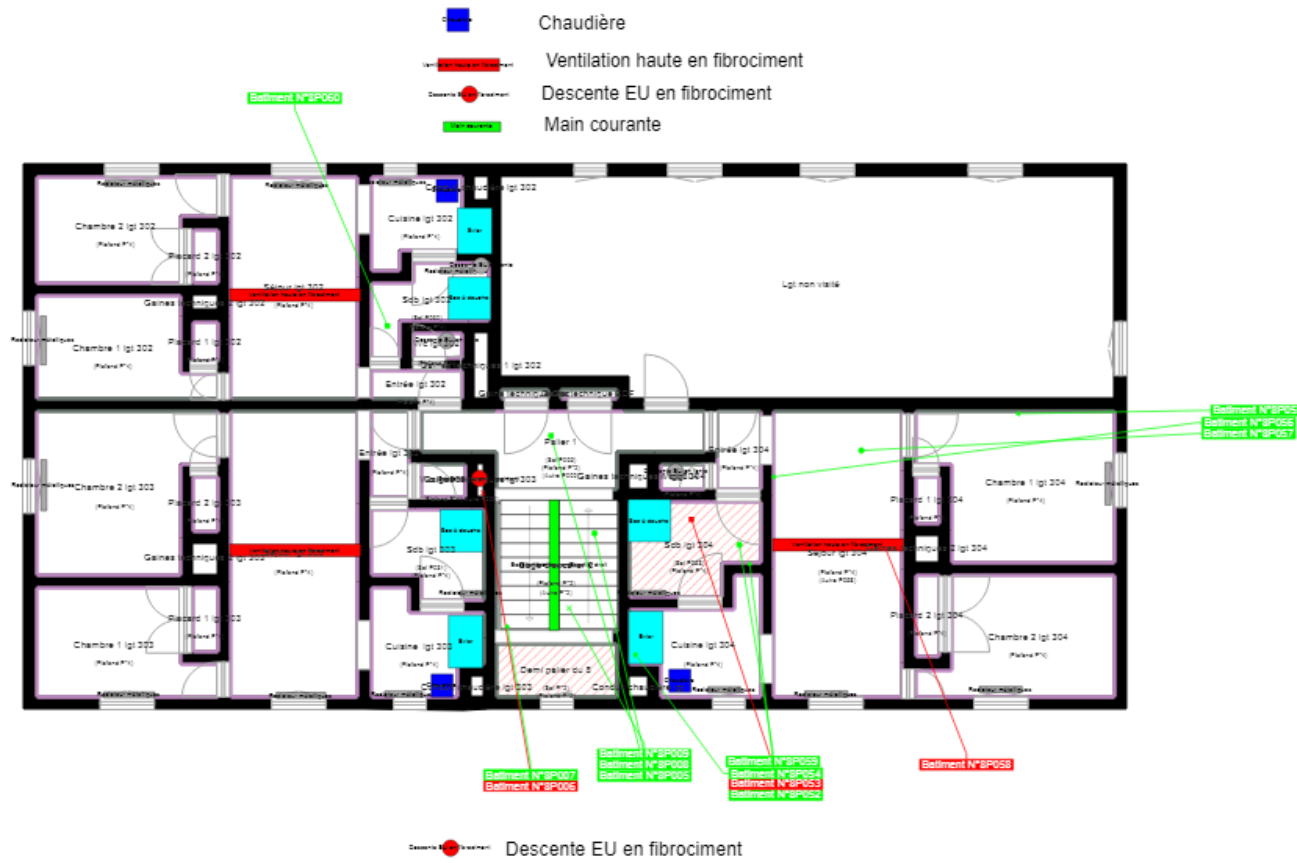

#### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : Batiment N°8 - Batiment N°8 8  
 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400  
 LAGNY SUR MARNE

Zone :R+3

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël


N° de planche :4/6

#### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▧ Plafonds amiantés
- ▩ Sols et plafonds amiantés



### 4eme étages du bâtiment n 8

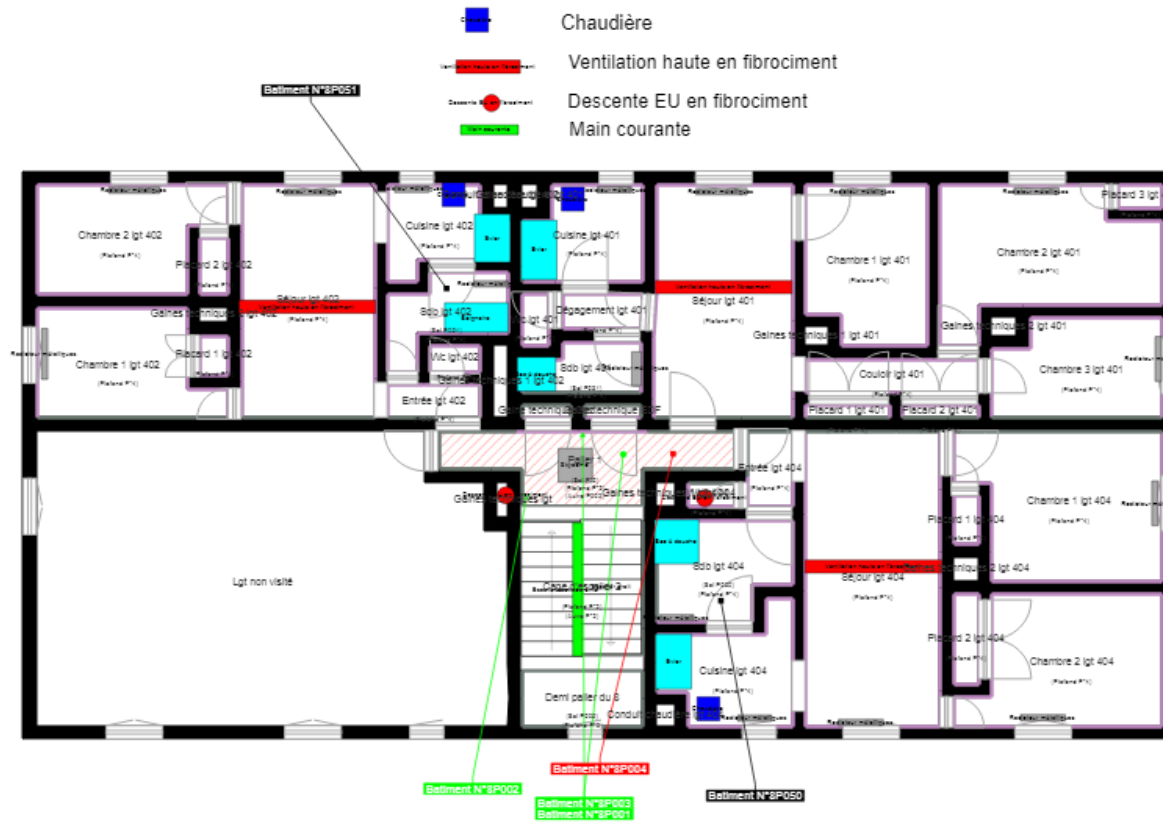

#### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : Batiment N°8 - Batiment N°8 8  
 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400  
 LAGNY SUR MARNE

Zone :R+4

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël


N° de planche :5/6

#### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▧ Plafonds amiantés
- ▩ Sols et plafonds amiantés

### Caves du bâtiment n 8

— Conduit en fonte

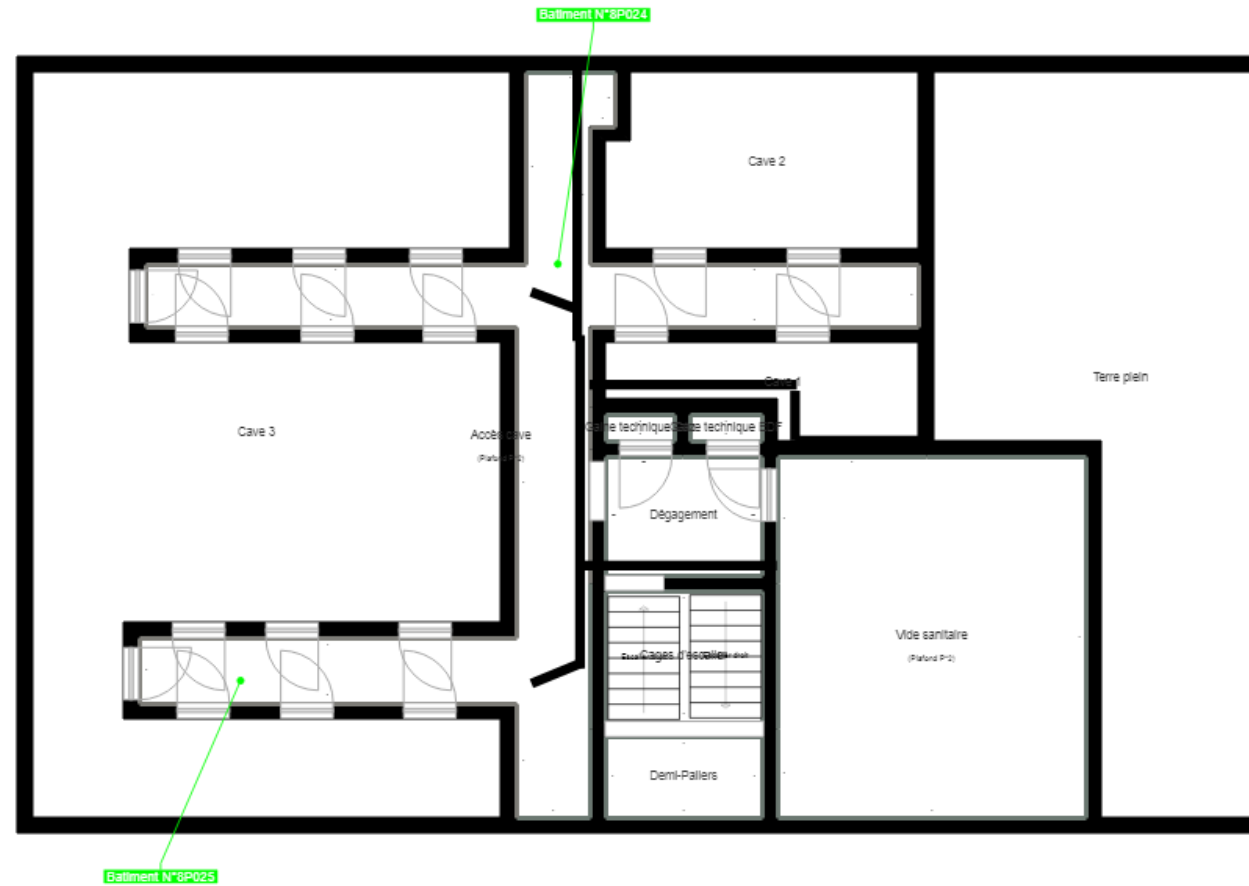

#### PLANCHE DE REPERAGE

Bien : Batiment N°8 - Batiment N°8 8  
 AVENUE DE ROTHSCHILD 77400  
 LAGNY SUR MARNE

Zone :R-1

Plan

Auteur :JULIEN Mickaël

N° de planche :6/6

#### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- ➔ Prélèvement de mur amianté
- ➔ Prélèvement de mur non amianté
- ✗ Autre type de prélèvement amianté
- ✗ Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▨ Plafonds amiantés
- ▨ Sols et plafonds amiantés
