

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

8 RUE DES ECOLES ESC 1

77370 NANGIS



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	8 RUE DES ECOLES ESC 1 77370 NANGIS
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	162LAA0001	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	25/09/2019	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Abdessamad RHENZOUR	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	DTI3342	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	23/11/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	DEKRA 5 avenue Garlande - 92220 BAGNEUX	Date de validité :	31/12/2019

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 04/10/2019**

Cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC

Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**

Nom du diagnostiqueur : **Abdessamad RHENZOUR**



SOCOTEC DIAGNOSTIC  
479 076 838 RCS Paris  
21, route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME  
Tél : 03 21 73 41 44  
www.socotec.fr

## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES .....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....	2
C \ SOMMAIRE .....	3
D \ CONCLUSIONS .....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	20
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	24
ATTESTATION(S).....	26
CERTIFICAT DE COMPETENCES .....	27

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

### Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

### Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

HABITAT 77 - oph de seine et marne		PAGE N° 1
<b>NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR</b> HABITAT 77 - oph de seine et marne ANT. PAYS DE LA BRIE 29 SQUARE MONTMIRAIL 77280 LA FERTE SOUS JOUARRE Tél: 01 64 14 11 11 Siret: 27770001900015		<b>BON DE TRAVAUX</b> 2019 21849  EXPERT HABITAT INGENIERIE  33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 78300 POISSY  Téléphone 0321734144
<b>Réf. fournisseur</b> F / 5149 <b>Marché n°</b> 2017 4475 1 <b>Provenance</b> PAYS DE LA BRIE <b>Objet</b> DIVERS	<b>ÉMETTEUR</b> ERNST ERIC	
<b>SERVICE</b> SCE PAYS DE LA BRIE		<b>Émission</b> 0321734144
<b>LOCALISATION</b> Programme 162 NANGIS (RUE DES ECOLES) ACQ. AMELIO Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AA Étage 00 Logement 1 Module 162LAA0001 Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN		
<b>ADRESSE</b> 8 RUE DES ECOLES ESC 1 77370 NANGIS		

**DELAI D'EXECUTION** 15 JOURS      **PÉRIODE DU** 17-09-2019 AU 01-10-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI45	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - TVX	1,00	5,00	5,00
	D'ENTRETIENS OU RÉPARATIONS ENTRE 1 A			
AMI75	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET	14,00	48,00	672,00
	ANALYSE DE 51 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS			
	REFECTION COMPLETE DU LOGEMENT EN			
	PEINTURE ET SOL + PLOMBERIE CUISINE TEL			
	GARDIENNE MME BRIFMI 0696406105			
<b>TOTAL H.T.</b>				677,00
<b>H.T. ACTUALISE</b>				
<b>COEFFICIENT REGIONAL</b>				
<b>RABAIS</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>				
<b>T.V.A.</b> 20,00 %				135,40
<b>TOTAL T.T.C.</b>				812,40

AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI		MONTANT T.T.C.	
CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES	LIBELLÉ DU POSTE BUDGETAIRE		
1 HONAMIA	A760	AEST EST	HONORAIRES DIAG AMIANTE	812,40	

AFFECTATION ANALYTIQUE		MONTANT T.T.C.	
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	
1 HONAMIA	162 1 A000 AA 162LAA0001 L 9902694		812,40

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 21849

EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Gaine technique 1	RC		OUI	CONCERNEE
Séjour / Salon	RC		OUI	CONCERNEE
WC	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 3	RC		OUI	CONCERNEE
Salle d'eau	RC		OUI	CONCERNEE
Chambre	RC		OUI	CONCERNEE
Gaine technique 2	RC		OUI	CONCERNEE
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Entrée	RC		OUI	CONCERNEE
Dégagement	RC		OUI	CONCERNEE

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTE S	FENETRE E1	FENETRE E2
Gaine technique 1	RC									
Séjour / Salon	RC	Plaque de plâtre	Périphériques / Plaques de plâtre			Dalle de sol	Peinture			
WC	RC	Plaque de plâtre				Dalle de sol	Peinture			
Gaine technique 3	RC									
Salle d'eau	RC	Plaque de plâtre				Dalle de sol	Peinture			
Chambre	RC	Plaque de plâtre				Dalle de sol	Peinture			
Gaine technique 2	RC									
Cuisine	RC	Périphériques / Plaques de plâtre	Plaque de plâtre			Dalle de sol	Peinture			
Entrée	RC	Plaque de plâtre	Aucun	Périphériques / Plaques de plâtre		Dalle de sol	Peinture			
Dégagement	RC	Plaque de plâtre	Aucun			Dalle de sol	Peinture			

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	Rez de chaussé e	Dalle de sol	Revêtement souple beige	162LAA0001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
WC	Rez de chaussé e	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose	162LAA0001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre	Rez de chaussé e	Dalle de sol	Revêtement souple beige	162LAA0001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre	Rez de chaussé e	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose	162LAA0001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Dalle de sol	Revêtement souple beige	162LAA0001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose	162LAA0001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussé e	Dalle de sol	Revêtement souple beige	162LAA0001P001	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	Rez de chaussé	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose	162LAA0001P00 1	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé	Dalle de sol	Revêtement souple beige	162LAA0001P00 1	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose	162LAA0001P00 1	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé	Dalle de sol	Revêtement souple beige	162LAA0001P00 1	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose	162LAA0001P00 1	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	Rez de chaussé	Dalle de sol	Revêtement cassant beige	162LAA0001P00 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau	Rez de chaussé	Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage beige	162LAA0001P00 2	Sol	DEGRADATION PARTIELLE	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle d'eau	Rez de chaussé	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P00 3	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussé	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussé	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur G	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur H	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur I	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur J	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur K	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur E	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle d'eau	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur F	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur A	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur B	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO



PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur C	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	162LAA0001P003	Mur D	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	162LAA0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	162LAA0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	Rez de chaussé e	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	162LAA0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	162LAA0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle d'eau	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	162LAA0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	162LAA0001P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussée	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	162LAA0001P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussé	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	162LAA0001P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Entrée	Rez de chaussé	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	162LAA0001P005	Mur L	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour / Salon	Rez de chaussé	Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	162LAA0001P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 162LAA0001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	162LAA0001 25/09/2019		WC (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige	25/09/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 162LAA0001P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	162LAA0001 25/09/2019		WC (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose	25/09/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

### EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 162LAA0001P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	162LAA0001 25/09/2019		Salle d'eau (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement cassant beige	25/09/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 162LAA0001P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	162LAA0001 25/09/2019		Salle d'eau (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage beige	25/09/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	


**EMPLACEMENT**



PRELEVEMENT : 162LAA0001P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	162LAA0001 25/09/2019		Salle d'eau (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	25/09/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**

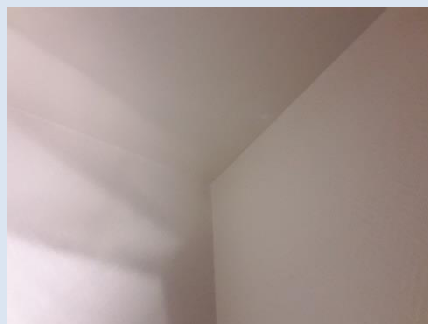

PRELEVEMENT : 162LAA0001P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	162LAA0001 25/09/2019		WC (Rez de chaussée)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	25/09/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**


PRELEVEMENT : 162LAA0001P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	162LAA0001 25/09/2019	Séjour / Salon (Rez de chaussée)	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	25/09/2019	RHENZOUR Abdessamad
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

**EMPLACEMENT**



# ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



**itga**  
Innovateur en fiabilité

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862  
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.99.35.41.42  
www.itga.fr

Accréditation n° I-5967



Liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-87297 EN DATE DU 04/10/2019 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE POISSY 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-87297 Réf. Commande Client : 162LAA0001-01
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 30/09/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
    - (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

- Analyses(s) : La détection de fibres d'amiantes optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiantes est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 162LAA0001-01 - 8 RUE DES ECOLES ESC 1 77370 NANGIS		Réf échantillon ITGA : IT071909-58308		
Réf échantillon client : 162LAA0001P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Sol Dalle de sol		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage rose		
* Revêtement souple beige	META (1)	1	03/10/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage rose	META (1)	1	03/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 162LAA0001-01 - 8 RUE DES ECOLES ESC 1 77370 NANGIS		Réf échantillon ITGA : IT071909-58309		
Réf échantillon client : 162LAA0001P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Sol Dalle de sol		Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Ragréage beige		
* Revêtement cassant beige	META (1)	1	03/10/2019	Amiante non détecté / -
* Colle polymère jaune non séparable + ragréage beige	META (1)	2	03/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 162LAA0001-01 - 8 RUE DES ECOLES ESC 1 77370 NANGIS		Réf échantillon ITGA : IT071909-58310		
Réf échantillon client : 162LAA0001P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle d'eau Mur A Enduit Peinture plaque de plâtre		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier		
* Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	META (1)	2	03/10/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07


Page 1/2



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-87297 EN DATE DU 04/10/2019**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 162LAA0001-01 - 8 RUE DES ECOLES ESC 1 77370 NANGIS Réf échantillon client : 162LAA0001P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / WC Plafond Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071909-58311 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Matériau plâtreux blanc / Peinture
¶ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META (1)	2	04/10/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 162LAA0001-01 - 8 RUE DES ECOLES ESC 1 77370 NANGIS Réf échantillon client : 162LAA0001P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Salon Mur C Enduit Peinture plaque de plâtre				Réf échantillon ITGA : IT071909-58312 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc / Peinture / Toile fibreuse blanche
¶ Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META (1)	1	03/10/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Estelle RUBAUD - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07

Page 2/2

# ATTESTATION(S)



## Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :  
**SOCOTEC DIAGNOSTIC, 1 rue des Dardanelles 75017 Paris**

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018. Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

<p><b>AMIANTE :</b>            ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE            DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE            DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES            CONTROLE PERIODIQUE ( AMIANTE )            CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX ( PLOMB - AMIANTE )            REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION            REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES</p> <p><b>PLOMB :</b>            DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU            CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ( CREP )            DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES ( DRIPP )            RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION</p> <p><b>ETAT PARASITAIRE :</b>            ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES            ETAT PARASITAIRE ( MERULES, VRILLETES, LYCTUS )            INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE ( LOI ALUR )</p> <p><b>MESURES :</b>            MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN            CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.</p> <p><b>AUTRES :</b>            ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ            ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES ( ENRNMT )            DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE            DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.</p>	<p><b>ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.</b>            ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.            DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF            DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF            ETAT DES LIEUX LOCATIFS            DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE            CERTIFICAT DE DECEANCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION            DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO            INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES            THERMOGRAPHIE INFRAROUGE            DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.            DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE            DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION            DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL            DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.            DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES            EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE ( SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION )            ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION            CENTRE DE FORMATION            MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE            DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR            VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES            VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ            VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGIS DE LEVAGE ET DE CHANTIER            DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE            CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX            RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BÂTIMENTS</p>
---	---

**La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.**

La présente attestation est valable du 6 SEPTEMBRE 2019 au 31 DECEMBRE 2019 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.  
 A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Le Bouscat, le 06/09/2019  
 Pour la compagnie

VD ASSOCIES  
 P.O. 81, Bd Pierre Pionnier  
 33110 LE BOUSCAT  
 RCS - 794 672 238 0845 - 03 56 10 22 0  
 TEL - 05 56 70 95 75

# CERTIFICAT DE COMPETENCES



# CERTIFICAT

DE COMPETENCES

## Diagnosticqueur immobilier certifié

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur

**Abdessamad RHENZOUR**

est titulaire du certificat de compétences N° DTI3342 pour :

	DU	AU
- Constat de Risque d'Exposition au Plomb	21/11/2017	20/11/2022
- Diagnostic amiante sans mention	23/11/2017	22/11/2022
- Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine)	22/11/2017	21/11/2022
- Diagnostic de performance énergétique	04/12/2017	03/12/2022
- Etat relatif à l'installation intérieure de gaz	04/12/2017	03/12/2022
- Etat relatif à l'installation intérieure d'électricité	04/12/2017	03/12/2022

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application\*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

\* Arrêté du 21 novembre 2006 relatif aux critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant des constats de risque d'exposition au plomb, ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 25 juillet 2010 relatif aux critères de certification des personnes physiques réalisant des constats de risque d'exposition au plomb, ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification ; Arrêté du 30 octobre 2006 relatif aux critères de certification des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 18 octobre 2006 relatif aux critères de certification des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères de certification des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 8 avril 2007 relatif aux critères de certification des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et 13 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 relatif aux critères de certification des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009 et 2 décembre 2011.



Le Directeur Général, Yvan MAINGUY  
Bagneux, le 04/12/2017




Numéro d'accréditation :  
4-0081  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

DEKRA Certification SAS \* 5 avenue Garlande - F92220 Bagneux \* [www.dekra-certification.fr](http://www.dekra-certification.fr)

Scanned by CamScanner

<b>PLANCHE DE REPÉRAGE</b>	Zone : Rez de chaussée	Vue de dessus
Auteur : RHENZOUR Abdessamad	Bien : 162LAA0001 - 8 RUE DES ECOLES ESC 1 77370 NANGIS	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien

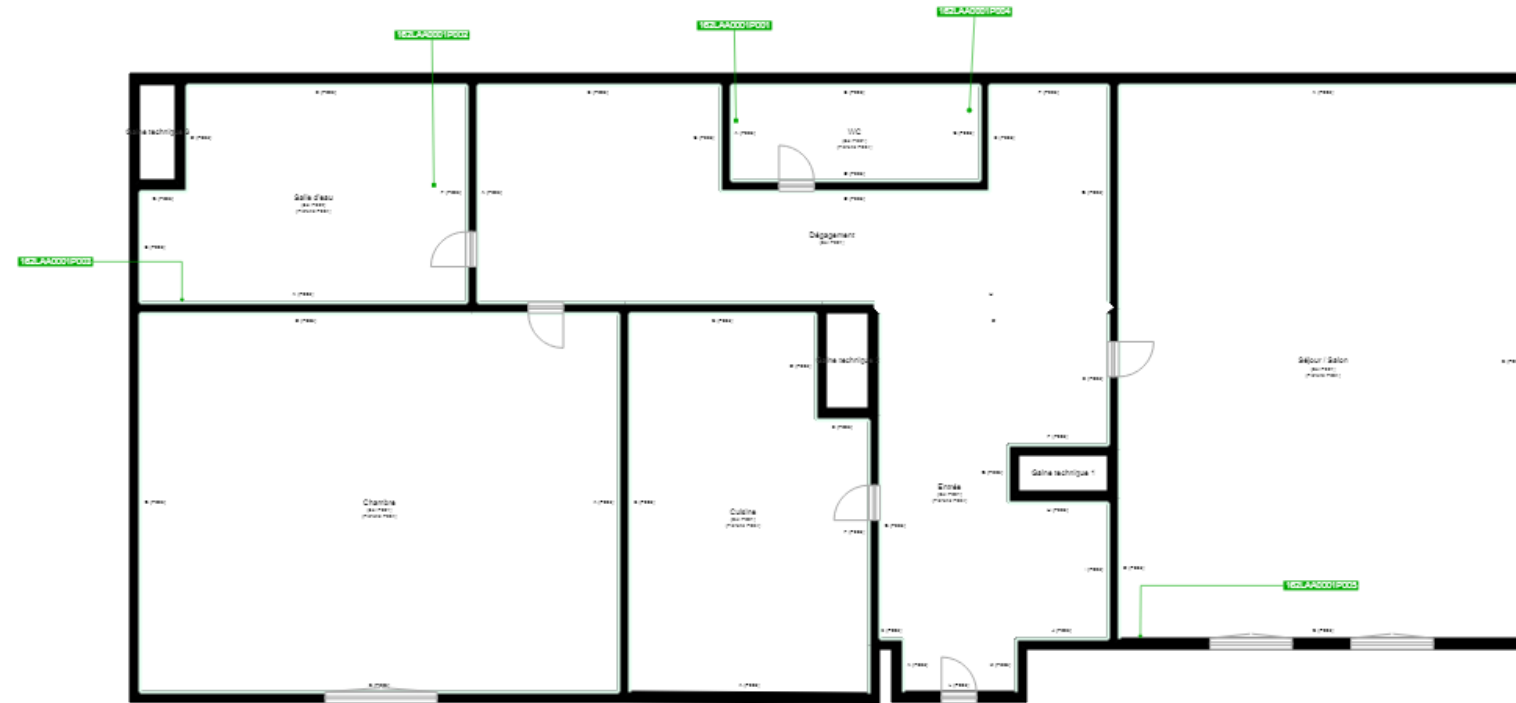

	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre
	

	Murs amiantés
	Prélèvements de sol amianté
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafond amiantés
	Prélèvements de plafond non amiantés
	Prélèvements de mur amiantés
	Prélèvements de mur non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés
	Sols amiantés
	Plafonds amiantés
	Sols et plafonds amiantés
	Conduits amiantés
	Conduits non amiantés
