

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant
réalisation de travaux

R 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

3 AVENUE DU CLOCHER

77176 SAVIGNY LE TEMPLE



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	Adresse :	3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref. Cadastre :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	91LAF0103	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	30/07/2018	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERRIN LACROIX - CS46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Gaetan BEDEL	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	OPD1869	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	22/04/2016	N° de contrat d'assurance :	10063271004
Organisme certificateur :	I.GERT PARC EDONIA - BÂT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2018

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 07/08/2018
Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric
Nom du diagnostiqueur : Gaetan BEDEL



C. SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES.....	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT.....	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	2
C. SOMMAIRE.....	3
D. CONCLUSIONS.....	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE.....	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/ OU NON AMIANTES.....	20
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	26
ATTESTATION(S).....	30
CERTIFICAT DE COMPETENCES.....	31

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

ZSD : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DEVISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

RECU 2 6 JUL. 2018

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 PAGE N° 1

NOM ET ADRESSE DE L'EXÉCUTEUR		BON DE TRAVAUX N° 2018 17544	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 AGENCE DE SENART Les Arcades - 2 rue Haute 77176 SAVIGNY LE TEMPLE Tél : 01 60 19 19 00 Fax : 01 60 83 55 28 Site : 2777001800015		EXPERT HABITAT INGENIERIE 33 BIS BOULEVARD GAMBETTA 3EME ETAGE 75300 POISSY	
N°I. Numérateur F / 5140 Marché n° 2017 4074 1 Provenance MELUN SENART Date DIVERS		Téléphone 0321734144 ÉMETTEUR DILAI REZK	
SERVICE SENART Techniciens		ÉMETTEUR DILAI REZK	
SITUATION Programme 01 SAVIGNY LE TEMPLE - LE CLOCHER Tranche 1 Essais CCO Escalier AF Étage 01 Logement 3 Module 91LAF0103 Règlement des CCRS CHEZ LE GARDIEN			
ADRESSE MME IPOTO LISE 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAVIGNY LE TEMPLE		Tél. personnel 016429 1343	
DÉLAI D'EXÉCUTION : JOURS		PÉRIODE DU : 03-07-2018 AU : 24-07-2018	
ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T. TOTAL H.T.
A0HS	SURFACES AMANTE AVANT TRAVAUX - TVA DÉBITRIBUS OU RÉCUPÉRATIONS ENTRE 1 A	1,00	5,00 5,00
AM03	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE NET ANALYSE DE 1 A 10 PELLETS/METS/50KG	10,00	48,00 480,00
TOTAL H.T.			485,00
H.T. ACTUALISÉ			
COEFFICIENT REGIONAL			
RABAIS			
TOTAL H.T.			
T.V.A. 20,00 %			97,00
TOTAL T.T.C.			582,00
18-07-2018 030 REFECTION COMPLET SOL BLANCHIMENT COMPLET MUR 6000000000			
AFFECTATION BUDGETAIRE		CODES STRUCTURE ET SCHEMA : TECHNI	
CODE BUDGET	RESTRICTIONS	UNITES DU POSTE BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.
1 50N000A	4700 28NT	SMTA HONORAIRES DIAG AMANTE	582,00
AFFECTATION ANALYTIQUE		RÉFÉRENCES OCCUPANT	
CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 50N000A	01 1 CCO. NF. 91LAF0103	L 00110: IPOTO LISE	582,00
Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX N° 2018 17544			
ORIGINAL A CONSERVER PAR LE DESTINATAIRE			

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS

Rapport N° : 91LAF0103 30/ 07/ 2018
Version : 07/08/2018

5/32

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPALUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03.21.73.94.79 - Site : www.expert-habitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissolublement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITES / NON VISITES CONCERNÉES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
WC			OUI	CONCERNÉE
Salle de bains			OUI	CONCERNÉE
Cellier			OUI	CONCERNÉE
Chambre 2			OUI	CONCERNÉE
Entrée			OUI	CONCERNÉE
Cuisine			OUI	CONCERNÉE
Chambre 1			OUI	CONCERNÉE
Séjour			OUI	CONCERNÉE

DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
WC	Plaqué de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Salle de bains	Plaqué de plâtre	Béton			Dalle de sol	Enduit			
Cellier	Plaqué de plâtre	Béton	Périphériques / Doublage (plaqué de plâtre + isolant)	Béton	Dalle de sol	Enduit			
Chambre 2	Plaqué de plâtre	Périphériques / Doublage (plaqué de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit			
Entrée	Plaqué de plâtre	Périphériques / Doublage (plaqué de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit			
Cuisine	Plaqué de plâtre	Périphériques / Doublage (plaqué de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit			

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Chambre 1	Plaques de plâtre	Périphériques / Doublage (plaques de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit			
Séjour	Plaques de plâtre	Périphériques / Doublage (plaques de plâtre + isolant)			Dalle de sol	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

ZSD : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

ZSD : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	91LAF0103F001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture plaques de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103F003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable	91LAF0103F005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + carton non séparable	91LAF0103F006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	91LAF0103F008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	91LAF0103F009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	91LAF0103F010	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103F002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	91LAF0103F008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	91LAF0103F008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	91LAF0103F008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	91LAF0103F008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	91LAF0103F008	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	91LAF0103F009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	91LAF0103F009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	91LAF0103F009	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	91LAF0103F009	Sbl	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	91LAF0103F009	Sbl	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	91LAF0103F010	Sbl	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	91LAF0103F010	Sbl	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	91LAF0103F010	Sbl	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	91LAF0103F001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	91LAF0103F001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103F003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103F003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103F003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103F003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103F003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103F003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103F003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103F003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103F003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable	91LAF0103F005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable	91LAF0103F005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cellier		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + carton non séparable	91LAF0103F006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + carton non séparable	91LAF0103F006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + carton non séparable	91LAF0103F006	Mur H	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + carton non séparable	91LAF0103F006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + carton non séparable	91LAF0103F006	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + carton non séparable	91LAF0103F006	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + carton non séparable	91LAF0103F006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Céllier		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Céllier		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F007	Mur G	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F007	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	91LAF0103F007	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103F002	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	91LAF0103F002	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DE SELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 91LAF0103P001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	91LAF0103 30/07/2018		WC
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	30/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			
PRELEVEMENT : 91LAF0103P002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	91LAF0103 30/07/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	30/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			


PRELEVEMENT : 91LAF0103P003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OH77	91LAF0103 30/07/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	30/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 91LAF0103P004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OH77	91LAF0103 30/07/2018		Salle de bains
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	30/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 91LAF0103P005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	91LAF0103 30/07/2018		Cellier
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit gris en vrac + papier peint non séparable	30/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 91LAF0103P006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	91LAF0103 30/07/2018		Séjour
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + carton non séparable	30/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 91LAF0103P007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	91LAF0103 30/07/2018		Chambre 1
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	30/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 91LAF0103P008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	91LAF0103 30/07/2018		Entrée
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture béton	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	30/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 91LAF0103P009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	91LAF0103 30/07/2018		Chambre 2
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	30/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : 91LAF0103P010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	91LAF0103 30/07/2018		Cuisine
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en vrac	30/07/2018	BEDEL Gaetan
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

	Parc Edouard - Bât. B - Rue de la Terre Aillée - CS n° 64862 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX Tél : 02.99.35.41.41 Fax : 02.99.35.41.42 www.itga.fr	 Accréditation n° 1-5967 Liste des sites et points disponibles sur www.cofrac.fr Liste des sites et points disponibles sur www.cofrac.fr
	Laboratoire de COFRAC accrédité de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :	
	RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-B1864 EN DATE DU 06/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(S)	
	Ce rapport se consacre aux 6 échantillons analysés à l'analyse.	

Client : AGENE EDF-ECOMPTÉ MATERIAUX EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGÉNIERIE 2 rue Trévignon 79193 LES AUJOUETS LE BUI	Réf. Commande ITGA : IT0718-B1864 Réf. Commande Client : 91LAF0103-01
---	--

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/08/2018

Préparation(s) : Effectués de façon à être représentative de l'échantillon
 - Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
 - Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : lavage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guidée HSE 248 - appendice 2)
 ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de caractérisations	Date d'analyse	Résultat / Type d'ambiance
Réf échantillon client : 91LAF0103-01 - 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAUVIGNY LE TEMPLE		Réf échantillon ITGA : IT071808-2210		
Réf échantillon client : 91LAF010301 (COGNONTS COLLECTIFS - 1 rue du Maréchal Bataillon)	DESCRIPTION ITGA : Enduit gris en vrac, habillage / Peinture / Papier ou carton			
* Enduit gris en vrac, habillage + peinture non séparables + papier en feuille caractérisés non séparables	META	1	06/08/2018	Presence non détectée / -
Réf échantillon client : 91LAF0103-01 - 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAUVIGNY LE TEMPLE		Réf échantillon ITGA : IT071808-2211		
Réf échantillon client : 91LAF010301 (COGNONTS COLLECTIFS - 1 rue du Maréchal Bataillon)	DESCRIPTION ITGA : Enduit grisâtre blanc en vrac / Peinture / Carton			
* Enduit grisâtre blanc en vrac + peinture non séparables + carton non séparables	META	1	06/08/2018	Absence non détectée / -

Valeurs par : Delphine JOSSET - Analyse



La reproduction de ce rapport est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Seul document particulièrement et écrit du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0718-81844 EN DATE DU 06/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de représentations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 91LAF0103-01 - 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAUVIGNY LE TEMPLE		Ref échantillon FGA :	IT071800-2212	
Ref échantillon client : 91LAF0103004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - / Salle de bain Naturel Enduit - Peinture blanc		Description FGA :	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	06/08/2018	Amiante non détecté /
Ref dossier client : 91LAF0103-01 - 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAUVIGNY LE TEMPLE		Ref échantillon FGA :	IT071800-2213	
Ref échantillon client : 91LAF0103005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - / Colonne Mur & Enduit - Peinture blanc		Description FGA :	Enduit gris en vrac / Papier peint	
* Enduit gris en vrac + papier peint non séparable	META	1	06/08/2018	Amiante non détecté /
Ref dossier client : 91LAF0103-01 - 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAUVIGNY LE TEMPLE		Ref échantillon FGA :	IT071800-2214	
Ref échantillon client : 91LAF0103006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - / / Sapeur Mur & Enduit - Peinture		Description FGA :	Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier peint / Carton	
* Enduit plâtreux blanc en vrac + papier peint non séparable + Carton non séparable	META	1	06/08/2018	Amiante non détecté /
Ref dossier client : 91LAF0103-01 - 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAUVIGNY LE TEMPLE		Ref échantillon FGA :	IT071800-2215	
Ref échantillon client : 91LAF0103007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - / / Courbe 1 Mur & Enduit - Peinture plâtre de plâtre		Description FGA :	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
* Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	06/08/2018	Amiante non détecté /
Ref dossier client : 91LAF0103-01 - 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAUVIGNY LE TEMPLE		Ref échantillon FGA :	IT071800-2216	
Ref échantillon client : 91LAF0103008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - / / Escier Naturel Enduit - Peinture blanc		Description FGA :	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture multiple / Mauvais gris en vrac / Tôle flexo blanche	
* Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture multiple non séparable + mauvais gris en vrac non séparable + tôle flexo blanche non séparable	META	1	06/08/2018	Amiante non détecté /
Ref dossier client : 91LAF0103-01 - 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAUVIGNY LE TEMPLE		Ref échantillon FGA :	IT071800-2217	
Ref échantillon client : 91LAF0103009 / LOGEMENTS COLLECTIFS - / / Courbe 2 Sur dalle et sol		Description FGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Papier gris en vrac	
* Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + papier gris en vrac	META	1	06/08/2018	Amiante non détecté /

La reproduction de ce rapport est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du
laboratoire.
Seul laboratoire participant et émetteur du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
DTA 164-01 rev 02

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO (070718-81864 EN DATE DU 06/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAUX)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de échantillons	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Ref dossier client : 91LAF0103-01 - 3 AVENUE DU CLOCHER 71700 SAISONNIÈRE / FRANCE Ref établissement client : 91LAF0103010 / LOGEMENTS COLLECTIFS - ... / Centre des Fêtes de ... * Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparée + ragréage gris en site.	DELTA	1	06/08/2018	Autant non détecté / -

La reproduction de ce rapport est autorisée sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation de
 l'émission.
 Seul Abréviation particulières et icône du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
 DTA 164-01 rev 02

Page 3/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0718-81845 EN DATE DU 06/08/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAUX)

Ce rapport ne concerne que les échantillons cités à l'exemple.

Client : AGENCY D&I INF. ECONOMIE MATERIAUX EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Trévintier 78180 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande COC : IT0718-81845 Réf. Commande Client : 91LAF0103-02
--	---

Prélevement(s) : Reçu au laboratoire le : 01/08/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

* Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
 * Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (METAT), brassage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)
 Technique Analytique(s) : * Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guidé HSG 248 - appendix 2)
 * Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-055)

Résultat(s) :


Fraction analysée	Technique analytique	Nb de échantillons	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : 91LAF0103-02 - 3 AVENUE DU CLOCHER 77176 SAINTEY LE TEMPLE	Réf identification COC :	1	06/08/2018	PP1506-0209
Réf échantillon client : 91LAF01030001 (COSMANTO COLLECTIF) - 1 Gypse Mu.C Ensf. - Pontons	Description COC :	Ensilé plusieurs sacs en vrac / Poudre / Carton		
* Enduit adhésif blanc en vrac + poutre non séparables + carton non séparables	META	1	06/08/2018	Amiante non détecté /

Validé par : Delphine JOSSET - Analyse



La reproduction de ce rapport client autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
 Seul échantillon particulièrement et échantillon du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
 DTA 164-01 rev 02

Page 1/1

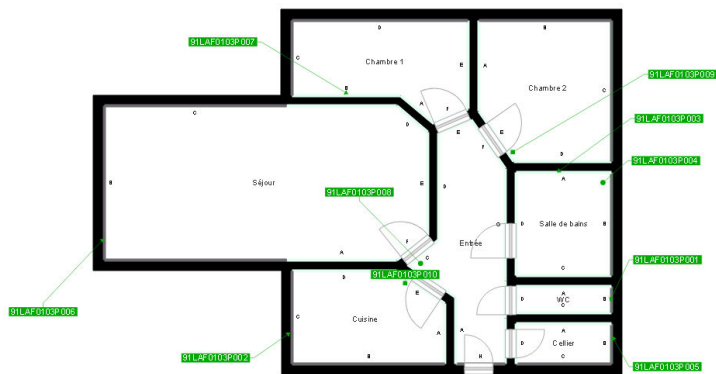

■	Murs périphériques / Plaques de plâtre
■	Murs Bois
■	Murs Brique
■	Murs Béton brut
■	Cloisons Plaques de plâtre
■	Murs carreaux de plâtre
■	Murs Béton / Enduit
■	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
■	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
■	Torchis
■	Murs Amiantés
■	Murs Brique / Enduit
■	Murs Brique plâtrière
■	Murs Pierre

■	Prélèvements de sol amiantés
■	Prélèvements de sol non amiantés
●	Prélèvements de plafonds amiantés
●	Prélèvements de plafonds non amiantés
→	Prélèvements de murs amiantés
→	Prélèvements de murs non amiantés
X	Autres types de prélèvements amiantés
X	Autres types de prélèvements non amiantés
▨	Sol amianté
▨	Plafond amianté
▨	Sol et Plafond amiantés
