Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2309159900
Rapport édité le : 11/10/2023

DONNEUR D'ORDRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE - MARICHAL OLIVIER
77002 MELUN

OPERATEUR DE REPERAGE

SAGET frédéric
06 64 29 51 79
Certification n° : CPDI3492
Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE
10 Avenue Charles Péguy
77000 Melun

LIEU D'INTERVENTION

1-8 square de lorient
77000 melun
Bat. N/A

Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : **SAGET frédéric**

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Révision	Date	Objet
Version initiale	25/09/2023	Établissement du Dossier Technique

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE - MARICHAL OLIVIER	10 AVENUE CHARLES PEGUY BP 114 77002 MELUN
Propriétaire	HABITAT 77 OPH DE SEINE ET MARNE	10 Avenue Charles Péguy 77000 Melun
Accompagnateur	Sans accompagnateur	

OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.

NOM	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
SAGET frédéric	I.Cert	CPDI3492	28/04/2022	27/04/2029

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	01/01/2024

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx goupe

LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASYLAB	50503704400706	4 rue Maryse Bastié 44700 ORVAULT

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> SOMMAIRE

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS 2
2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS 4
3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS 5
4. CONCLUSIONS DU REPERAGE 17
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 53
6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES 55
7. RAPPORTS D'ANALYSES 237
8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION 279

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :

2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : *1-8 square de lorient*
77000 melun

Numéro de mission : MA2309159900

Références cadastrales :

Référence client : NC

PC / date de construction : Date du permis de construire non connue

Visite effectuée le : 25/09/2023

Numéro de lot : Bat. N/A

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Pièces :	Façade avant, Façade gauche, Façade arrière, Façade droite, autre loggia
Cage 1 Sous sol :	Cave
Cage 1 rez de chaussée :	Hall, Cage d'escalier, Auvent avant, Auvent arrière
Cage 1 1er étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 1 2ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 1 3ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 1 4ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 1 5ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 1 6ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 1 7ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 1 8ème étage :	Palier, Gaine technique
Cage 2 Sous sol :	Cave
Cage 2 rez de chaussée :	Hall, Cage d'escalier, Auvent avant, Auvent arrière
Cage 2 1er étage :	Palier, Cage d'escalier, loggia, Gaine technique
Cage 2 2ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 2 3ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 2 4ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 2 5ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 2 6ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 2 7ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 2 8ème étage :	Palier, Gaine technique
Cage 3 Sous sol :	Cave
Cage 3 rez de chaussée :	Hall, Cage d'escalier, Auvent avant, Auvent arrière
Cage 3 1er étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 3 2ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 3 3ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 3 4ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 3 5ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 3 6ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 3 7ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 3 8ème étage :	Palier, Gaine Technique
Cage 4 Sous sol :	Cave

Cage 4 rez de chaussée :	Hall, Cage d'escalier, Auvent avant, Auvent arrière, Local poubelle
Cage 4 1er étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 4 2ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 4 3ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 4 4ème étage :	Palier, Cage d'escalier, loggia, Gaine technique
Cage 4 5ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 4 6ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 4 7ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 4 8ème étage :	Palier, Gaine Technique
Cage 5 Sous sol :	Cave
Cage 5 rez de chaussée :	Hall, Cage d'escalier, Auvent avant, Auvent arrière
Cage 5 1er étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 5 2ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 5 3ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 5 4ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 5 5ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 5 6ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 5 7ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 5 8ème étage :	Palier, Gaine Technique
Cage 6 Sous sol :	Cave
Cage 6 rez de chaussée :	Hall, Cage d'escalier, Auvent avant, Auvent arrière
Cage 6 1er étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 6 2ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 6 3ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 6 4ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 6 5ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 6 6ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 6 7ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 6 8ème étage :	Palier, Gaine Technique
Cage 7 Sous sol :	Cave
Cage 7 rez de chaussée :	Hall, Cage d'escalier, Auvent avant, Auvent arrière
Cage 7 1er étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 7 2ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 7 3ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique

Cage 7 4ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 7 5ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 7 6ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 7 7ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 7 8ème étage :	Palier, Gaine Technique
Cage 8 Sous sol :	Cave
Cage 8 rez de chaussée :	Hall, Cage d'escalier, Auvent avant, Auvent arrière
Cage 8 1er étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 8 2ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 8 3ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 8 4ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 8 5ème étage :	Palier, Cage d'escalier, loggia, Gaine technique
Cage 8 6ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 8 7ème étage :	Palier, Cage d'escalier, Gaine technique
Cage 8 8ème étage :	Palier, Gaine Technique

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
Cage 1 rez de chaussée	Auvent avant	Sol
Cage 2 rez de chaussée	Auvent avant	Sol
Cage 3 rez de chaussée	Auvent avant	Sol
Cage 4 rez de chaussée	Auvent avant	Sol
Cage 5 rez de chaussée	Auvent avant	Sol
Cage 6 rez de chaussée	Auvent avant	Sol
Cage 7 rez de chaussée	Auvent avant	Sol
Cage 8 rez de chaussée	Auvent avant	Sol
Cage 1 rez de chaussée	Auvent arrière	Sol
Cage 2 rez de chaussée	Auvent arrière	Sol
Cage 3 rez de chaussée	Auvent arrière	Sol
Cage 4 rez de chaussée	Auvent arrière	Sol
Cage 5 rez de chaussée	Auvent arrière	Sol
Cage 6 rez de chaussée	Auvent arrière	Sol
Cage 7 rez de chaussée	Auvent arrière	Sol
Cage 8 rez de chaussée	Auvent arrière	Sol
Façade avant	Façade avant	facade
Façade gauche	Façade gauche	facade
Façade arrière	Façade arrière	facade
Façade droite	Façade droite	facade
Façade gauche	Façade gauche	facade
Cage 1 rez de chaussée	Auvent avant	facade
Cage 2 rez de chaussée	Auvent avant	facade
Cage 3 rez de chaussée	Auvent avant	facade
Cage 4 rez de chaussée	Auvent avant	facade
Cage 5 rez de chaussée	Auvent avant	facade
Cage 6 rez de chaussée	Auvent avant	facade
Cage 7 rez de chaussée	Auvent avant	facade
Cage 8 rez de chaussée	Auvent avant	facade
Cage 1 rez de chaussée	Auvent arrière	facade
Cage 2 rez de chaussée	Auvent arrière	facade
Cage 3 rez de chaussée	Auvent arrière	facade

Niveau	Pièce	Zone
Cage 4 rez de chaussée	Auvent arrière	facade
Cage 5 rez de chaussée	Auvent arrière	facade
Cage 6 rez de chaussée	Auvent arrière	facade
Cage 7 rez de chaussée	Auvent arrière	facade
Cage 8 rez de chaussée	Auvent arrière	facade
Façade avant	Façade avant	facade
Façade gauche	Façade gauche	facade
Façade arrière	Façade arrière	facade
Façade droite	Façade droite	facade
Façade avant	Façade avant	facade
Façade gauche	Façade gauche	facade
Façade arrière	Façade arrière	facade
Façade droite	Façade droite	facade
Cage 8 5ème étage	loggia	facade
Cage 4 4ème étage	loggia	facade
Cage 2 1er étage	loggia	facade
autre loggia	autre loggia	facade
Cage 8 5ème étage	loggia	Plafond
Cage 4 4ème étage	loggia	Plafond
Cage 2 1er étage	loggia	Plafond
autre loggia	autre loggia	Plafond
Cage 1 rez de chaussée	Hall	Mur A,B,C,D
	Hall	Plafond
	Hall	Sol
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 1 1er étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 1 2ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 1 3ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 1 4ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 1 5ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 1 6ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 1 7ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 1 8ème étage	Palier	Mur de refend
Cage 1 rez de chaussée	Cage d'escalier	Plafond
Cage 1 1er étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 1 2ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 1 3ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 1 4ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 1 5ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 1 6ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 1 7ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 1 rez de chaussée	Hall	Plafond
Cage 1 1er étage	Palier	Plafond
Cage 1 2ème étage	Palier	Plafond
Cage 1 3ème étage	Palier	Plafond
Cage 1 4ème étage	Palier	Plafond
Cage 1 5ème étage	Palier	Plafond
Cage 1 6ème étage	Palier	Plafond
Cage 1 7ème étage	Palier	Plafond
Cage 1 8ème étage	Palier	Plafond
Cage 1 rez de chaussée	Cage d'escalier	Sol
Cage 1 1er étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 1 2ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 1 3ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol

Niveau	Pièce	Zone
Cage 1 4ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 1 5ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 1 6ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 1 7ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 1 8ème étage	Palier	Sol
Cage 1 1er étage	Gaine technique	Sol; Plafond
Cage 1 2ème étage	Gaine technique	Sol; Plafond
Cage 1 3ème étage	Gaine technique	Sol; Plafond
Cage 1 4ème étage	Gaine technique	Sol; Plafond
Cage 1 5ème étage	Gaine technique	Sol; Plafond
Cage 1 6ème étage	Gaine technique	Sol; Plafond
Cage 1 7ème étage	Gaine technique	Sol; Plafond
Cage 2 rez de chaussée	Hall	Mur A,B,C,D
	Hall	Plafond
	Hall	Sol
	Hall	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 2 1er étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 2 2ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 2 3ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 2 4ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 2 5ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 2 6ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 2 7ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 2 8ème étage	Palier	Mur de refend
Cage 2 rez de chaussée	Cage d'escalier	Plafond
Cage 2 1er étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 2 2ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 2 3ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 2 4ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 2 5ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 2 6ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 2 7ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 2 1er étage	Palier	Plafond
Cage 2 2ème étage	Palier	Plafond
Cage 2 3ème étage	Palier	Plafond
Cage 2 4ème étage	Palier	Plafond
Cage 2 5ème étage	Palier	Plafond
Cage 2 6ème étage	Palier	Plafond
Cage 2 rez de chaussée	Cage d'escalier	Sol
Cage 2 1er étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 2 2ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 2 3ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 2 4ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 2 5ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 2 6ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 2 7ème étage	Palier	Sol

Niveau	Pièce	Zone
	Cage d'escalier	Sol
Cage 2 8ème étage	Palier	Sol
Cage 2 1er étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 2 2ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 2 3ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 2 4ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 2 5ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 2 6ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 2 7ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 2 8ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 3 rez de chaussée	Hall	Mur A,B,C,D
	Hall	Plafond
	Hall	Sol
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 3 1er étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 3 2ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 3 3ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 3 4ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 3 5ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 3 6ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 3 7ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 3 8ème étage	Palier	Mur de refend
Cage 3 1er étage	Palier	Plafond
Cage 3 2ème étage	Palier	Plafond
Cage 3 3ème étage	Palier	Plafond
Cage 3 4ème étage	Palier	Plafond
Cage 3 5ème étage	Palier	Plafond
Cage 3 6ème étage	Palier	Plafond
Cage 3 7ème étage	Palier	Plafond
Cage 3 8ème étage	Palier	Plafond
Cage 3 rez de chaussée	Cage d'escalier	Plafond
Cage 3 1er étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 3 2ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 3 3ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 3 4ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 3 5ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 3 6ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 3 7ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 3 rez de chaussée	Cage d'escalier	Sol
Cage 3 1er étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 3 2ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 3 3ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 3 4ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 3 5ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 3 6ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 3 7ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 3 8ème étage	Palier	Sol
Cage 3 1er étage	Gaine technique	Vide ordure
Cage 3 2ème étage	Gaine technique	Vide ordure
Cage 3 3ème étage	Gaine technique	Vide ordure

Niveau	Pièce	Zone
Cage 3 4ème étage	Gaine technique	Vide ordure
Cage 3 5ème étage	Gaine technique	Vide ordure
Cage 3 6ème étage	Gaine technique	Vide ordure
Cage 3 7ème étage	Gaine technique	Vide ordure
Cage 3 8ème étage	Gaine Technique	Vide ordure
Cage 4 rez de chaussée	Hall	Mur A,B,C,D
	Hall	Plafond
	Hall	Sol
	Hall	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 4 1er étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 4 2ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 4 3ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 4 4ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 4 5ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 4 6ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 4 7ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 4 8ème étage	Palier	Mur de refend
Cage 4 rez de chaussée	Cage d'escalier	Plafond
Cage 4 1er étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 4 2ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 4 3ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 4 4ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 4 5ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 4 6ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 4 7ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 4 1er étage	Palier	Plafond
Cage 4 2ème étage	Palier	Plafond
Cage 4 3ème étage	Palier	Plafond
Cage 4 4ème étage	Palier	Plafond
Cage 4 5ème étage	Palier	Plafond
Cage 4 6ème étage	Palier	Plafond
Cage 4 7ème étage	Palier	Plafond
Cage 4 8ème étage	Palier	Plafond
Cage 4 rez de chaussée	Cage d'escalier	Sol
Cage 4 1er étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 4 2ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 4 3ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 4 4ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 4 5ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 4 6ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 4 7ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 4 8ème étage	Palier	Sol
Cage 4 1er étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 4 2ème étage	Gaine technique	
Cage 4 3ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 4 4ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 4 5ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 4 6ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 4 7ème étage	Gaine technique	vide ordure

Niveau	Pièce	Zone
Cage 4 8ème étage	Palier; Cage 4 8ème étage - Gaine Technique	vide ordure
Cage 4 rez de chaussée	Local poubelle	Mur A,B,C,D
Cage 5 rez de chaussée	Hall	Plafond
	Hall	Plafond
	Hall	Sol
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 5 1er étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 5 2ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 5 3ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 5 4ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 5 5ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 5 6ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 5 7ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 5 8ème étage	Palier	Mur de refend
Cage 5 rez de chaussée	Cage d'escalier	Plafond
Cage 5 1er étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 5 2ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 5 3ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 5 4ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 5 5ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 5 6ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 5 7ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 5 1er étage	Palier	Plafond
Cage 5 2ème étage	Palier	Plafond
Cage 5 3ème étage	Palier	Plafond
Cage 5 4ème étage	Palier	Plafond
Cage 5 5ème étage	Palier	Plafond
Cage 5 6ème étage	Palier	Plafond
Cage 5 7ème étage	Palier	Plafond
Cage 5 8ème étage	Palier	Plafond
Cage 5 rez de chaussée	Cage d'escalier	Sol
Cage 5 1er étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 5 2ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 5 3ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 5 4ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 5 5ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 5 6ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 5 7ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 5 8ème étage	Palier	Sol
Cage 5 1er étage	Gaine technique	Vide ordure
Cage 5 2ème étage	Gaine technique	Vide ordure
Cage 5 3ème étage	Gaine technique	Vide ordure
Cage 5 4ème étage	Gaine technique	Vide ordure
Cage 5 5ème étage	Gaine technique	Vide ordure
Cage 5 6ème étage	Gaine technique	Vide ordure
Cage 5 7ème étage	Gaine technique	Vide ordure
Cage 6 rez de chaussée	Hall	Mur A,B,C,D
	Hall	Plafond
	Hall	Sol

Niveau	Pièce	Zone
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 6 1er étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 6 2ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 6 3ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 6 4ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 6 5ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 6 6ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 6 7ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 6 8ème étage	Palier	Mur de refend
Cage 6 rez de chaussée	Cage d'escalier	Plafond
Cage 6 1er étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 6 2ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 6 3ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 6 4ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 6 5ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 6 6ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 6 7ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 6 1er étage	Palier	Plafond
Cage 6 2ème étage	Palier	Plafond
Cage 6 3ème étage	Palier	Plafond
Cage 6 4ème étage	Palier	Plafond
Cage 6 5ème étage	Palier	Plafond
Cage 6 6ème étage	Palier	Plafond
Cage 6 7ème étage	Palier	Plafond
Cage 6 8ème étage	Palier	Plafond
Cage 6 rez de chaussée	Cage d'escalier	Sol
Cage 6 1er étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 6 2ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 6 3ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 6 4ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 6 5ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 6 6ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 6 7ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 6 8ème étage	Palier	Sol
Cage 6 1er étage	Gaine technique	Doublage cloison; vide ordure
Cage 6 2ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 6 3ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 6 4ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 6 5ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 6 6ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 6 7ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 6 8ème étage	Gaine Technique	vide ordure
Cage 7 rez de chaussée	Hall	Mur A,B,C,D
	Hall	Plafond
	Hall	Sol
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 7 1er étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 7 2ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend

Niveau	Pièce	Zone
Cage 7 3ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 7 4ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 7 5ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 7 6ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 7 7ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 7 8ème étage	Palier	Mur de refend
Cage 7 rez de chaussée	Cage d'escalier	Plafond
Cage 7 1er étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 7 2ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 7 3ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 7 4ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 7 5ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 7 6ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 7 7ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 7 1er étage	Palier	Plafond
Cage 7 2ème étage	Palier	Plafond
Cage 7 3ème étage	Palier	Plafond
Cage 7 4ème étage	Palier	Plafond
Cage 7 5ème étage	Palier	Plafond
Cage 7 6ème étage	Palier	Plafond
Cage 7 7ème étage	Palier	Plafond
Cage 7 8ème étage	Palier	Plafond
Cage 7 rez de chaussée	Cage d'escalier	Sol
Cage 7 1er étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 7 2ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 7 3ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 7 4ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 7 5ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 7 6ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 7 7ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 7 8ème étage	Palier	Sol
Cage 7 1er étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 7 2ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 7 3ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 7 4ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 7 5ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 7 6ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 7 7ème étage	Gaine technique	vide ordure
Cage 7 8ème étage	Gaine Technique	vide ordure
Cage 8 rez de chaussée	Hall	Mur A,B,C,D
	Hall	Plafond
	Hall	Sol
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 8 1er étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 8 2ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 8 3ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 8 4ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 8 5ème étage	Palier	Mur de refend

Niveau	Pièce	Zone
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 8 6ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 8 7ème étage	Palier	Mur de refend
	Cage d'escalier	Mur de refend
Cage 8 8ème étage	Palier	Mur de refend
Cage 8 rez de chaussée	Cage d'escalier	Plafond
Cage 8 1er étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 8 2ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 8 3ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 8 4ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 8 5ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 8 6ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 8 7ème étage	Cage d'escalier	Plafond
Cage 8 1er étage	Palier	Plafond
Cage 8 2ème étage	Palier	Plafond
Cage 8 3ème étage	Palier	Plafond
Cage 8 4ème étage	Palier	Plafond
Cage 8 5ème étage	Palier	Plafond
Cage 8 6ème étage	Palier	Plafond
Cage 8 7ème étage	Palier	Plafond
Cage 8 8ème étage	Palier	Plafond
Cage 8 rez de chaussée	Cage d'escalier	Sol
Cage 8 1er étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 8 2ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 8 3ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 8 4ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 8 5ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 8 6ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 8 7ème étage	Palier	Sol
	Cage d'escalier	Sol
Cage 8 8ème étage	Palier	Sol
Cage 8 1er étage	Gaine technique	Vide ordure
Cage 8 2ème étage	Gaine technique	Vide ordure
Cage 8 3ème étage	Gaine technique	Vide ordure
Cage 8 4ème étage	Gaine technique	Vide ordure
Cage 8 5ème étage	Gaine technique	Vide ordure
Cage 8 6ème étage	Gaine technique	Vide ordure
Cage 8 7ème étage	Gaine technique	Vide ordure
Cage 8 8ème étage	Gaine Technique	Vide ordure

Descriptif des travaux :

Réfection complète des façade, des halls et cages d'escaliers.

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.
Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visitées

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la règlementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
ZPSO016	Cage 1 1er étage -- Cage 1 2ème étage -- Cage 1 3ème étage -- Cage 1 4ème étage -- Cage 1 5ème étage -- Cage 1 6ème étage -- Cage 1 7ème étage	Gaine technique	Sol; Plafond	Analyse : P043 - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	20ml
ZPSO024	Cage 2 1er étage -- Cage 2 2ème étage -- Cage 2 3ème étage -- Cage 2 4ème étage -- Cage 2 5ème étage -- Cage 2 6ème étage -- Cage 2 7ème étage -- Cage 2 8ème étage	Gaine technique	vide ordure	Analyse : P059 - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	20ml
ZPSO032	Cage 3 1er étage -- Cage 3 2ème étage -- Cage 3 3ème étage -- Cage 3 4ème étage -- Cage 3 5ème étage -- Cage 3 6ème étage -- Cage 3 7ème étage -- Cage 3 8ème étage	Gaine technique	Vide ordure	Analyse : P075 - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	20ml
ZPSO040	Cage 4 1er étage -- Cage 4 2ème étage -- Cage 4 3ème étage -- Cage 4 4ème étage -- Cage 4 5ème étage -- Cage 4 6ème étage -- Cage 4 7ème étage -- Cage 4 8ème étage	Gaine technique -- Palier; Gaine Technique	vide ordure	Analyse : P091 - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	20ml

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Surface indicative
ZPSO049	Cage 5 1er étage -- Cage 5 2ème étage -- Cage 5 3ème étage -- Cage 5 4ème étage -- Cage 5 5ème étage -- Cage 5 6ème étage -- Cage 5 7ème étage	Gaine technique	Vide ordure	Analyse : P108 - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	20ml
ZPSO057	Cage 6 1er étage -- Cage 6 2ème étage -- Cage 6 3ème étage -- Cage 6 4ème étage -- Cage 6 5ème étage -- Cage 6 6ème étage -- Cage 6 7ème étage -- Cage 6 8ème étage	Gaine technique	Doublage cloison; vide ordure	Analyse : P124 - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	20ml
ZPSO065	Cage 7 1er étage -- Cage 7 2ème étage -- Cage 7 3ème étage -- Cage 7 4ème étage -- Cage 7 5ème étage -- Cage 7 6ème étage -- Cage 7 7ème étage -- Cage 7 8ème étage	Gaine technique	vide ordure	Analyse : P140 - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	20ml
ZPSO073	Cage 8 1er étage -- Cage 8 2ème étage -- Cage 8 3ème étage -- Cage 8 4ème étage -- Cage 8 5ème étage -- Cage 8 6ème étage -- Cage 8 7ème étage -- Cage 8 8ème étage	Gaine technique	Vide ordure	Analyse : P156 - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	20ml

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
a Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

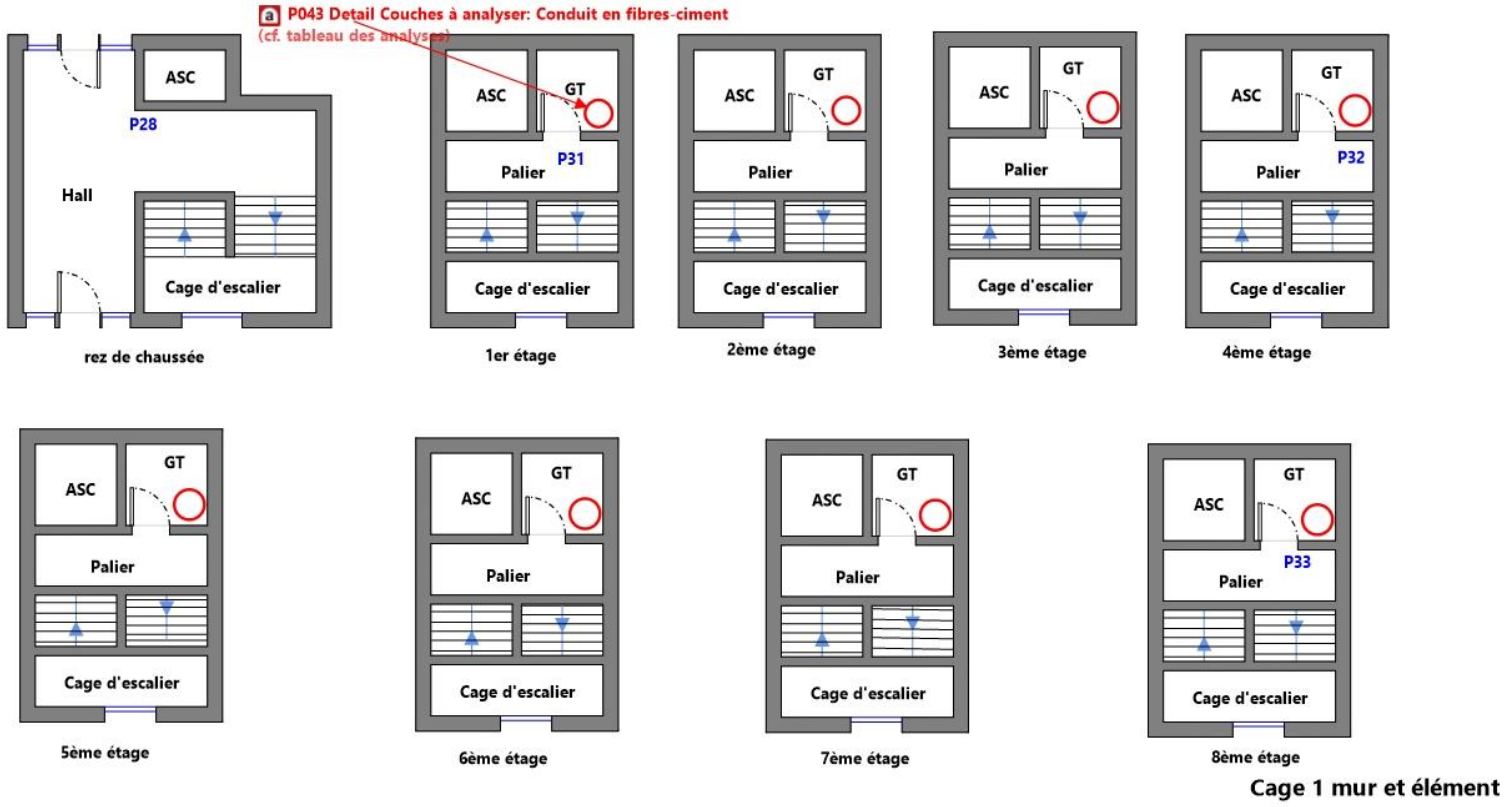

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

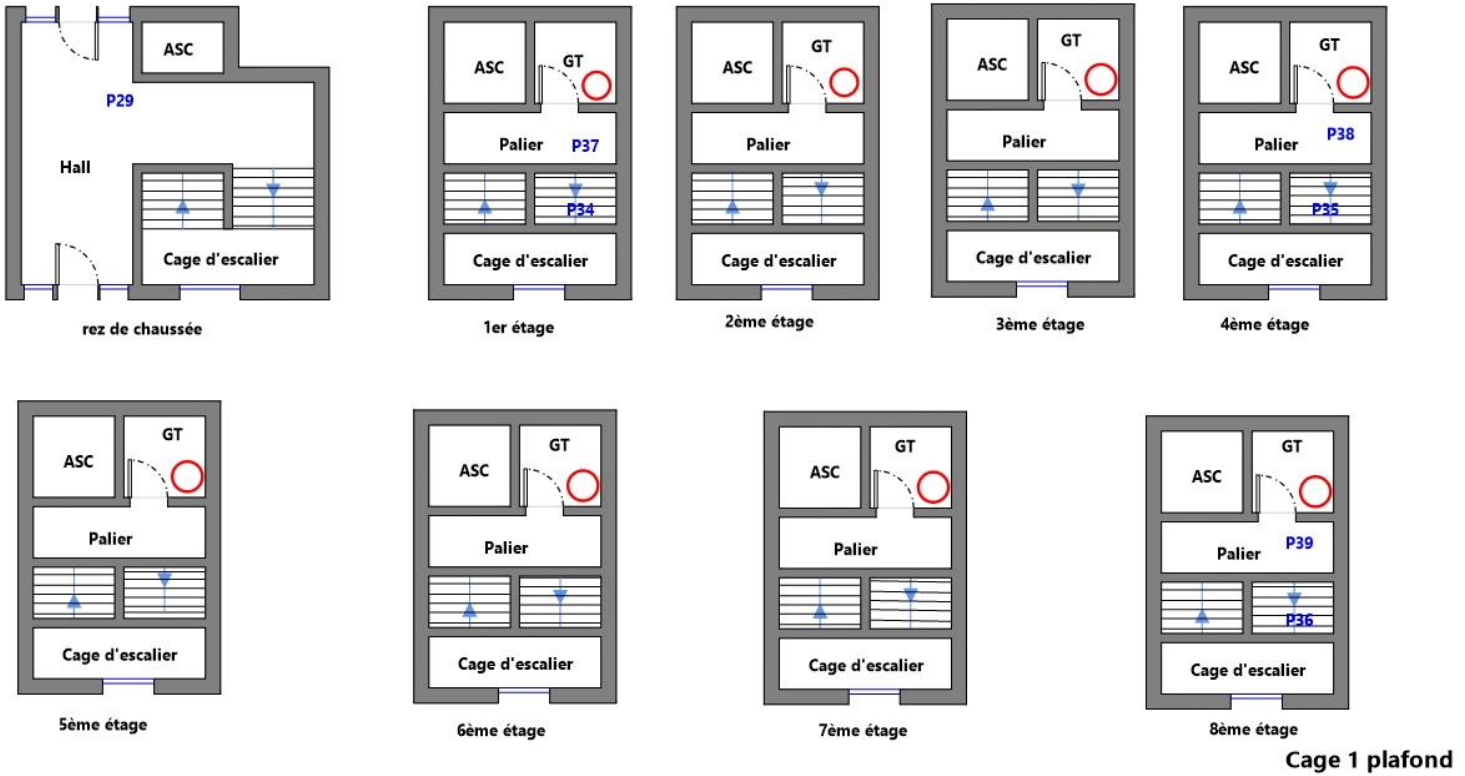

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

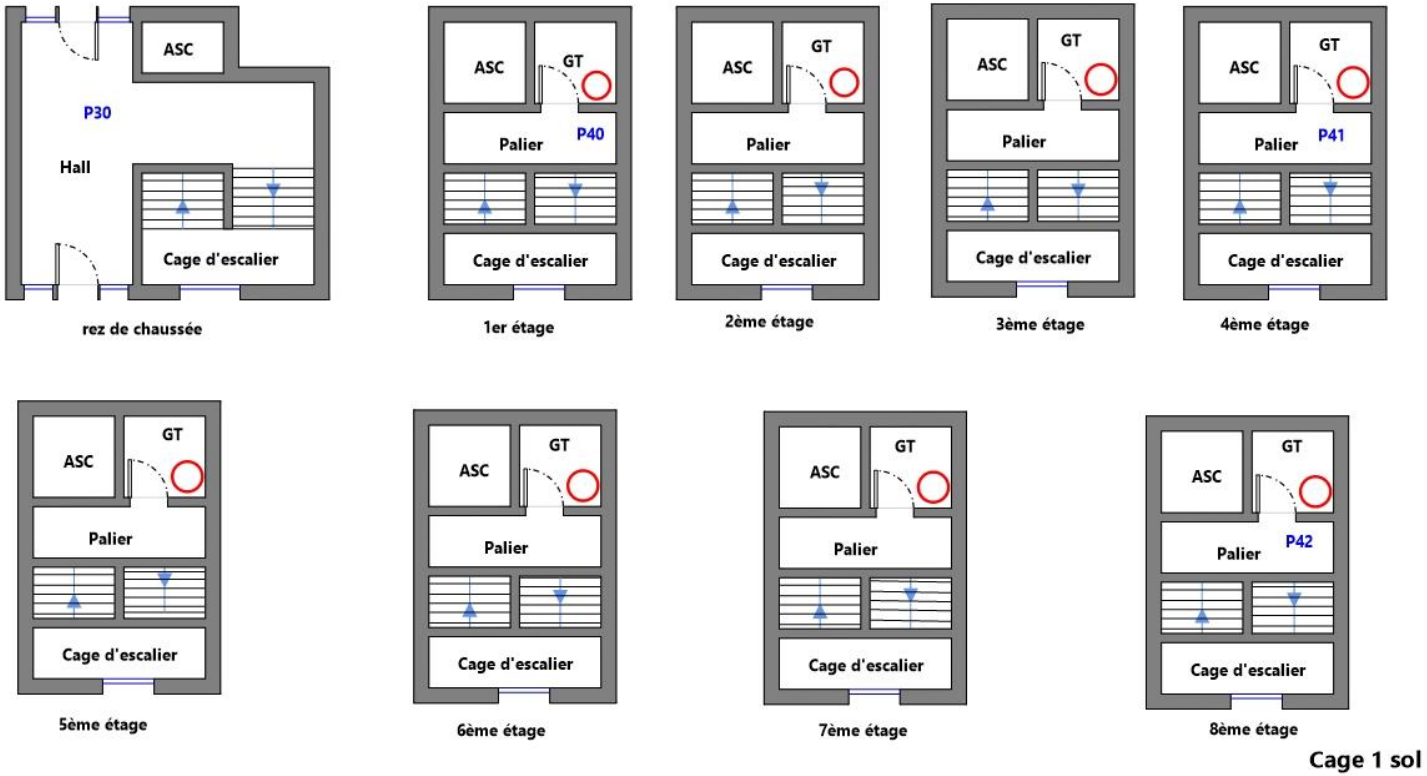

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

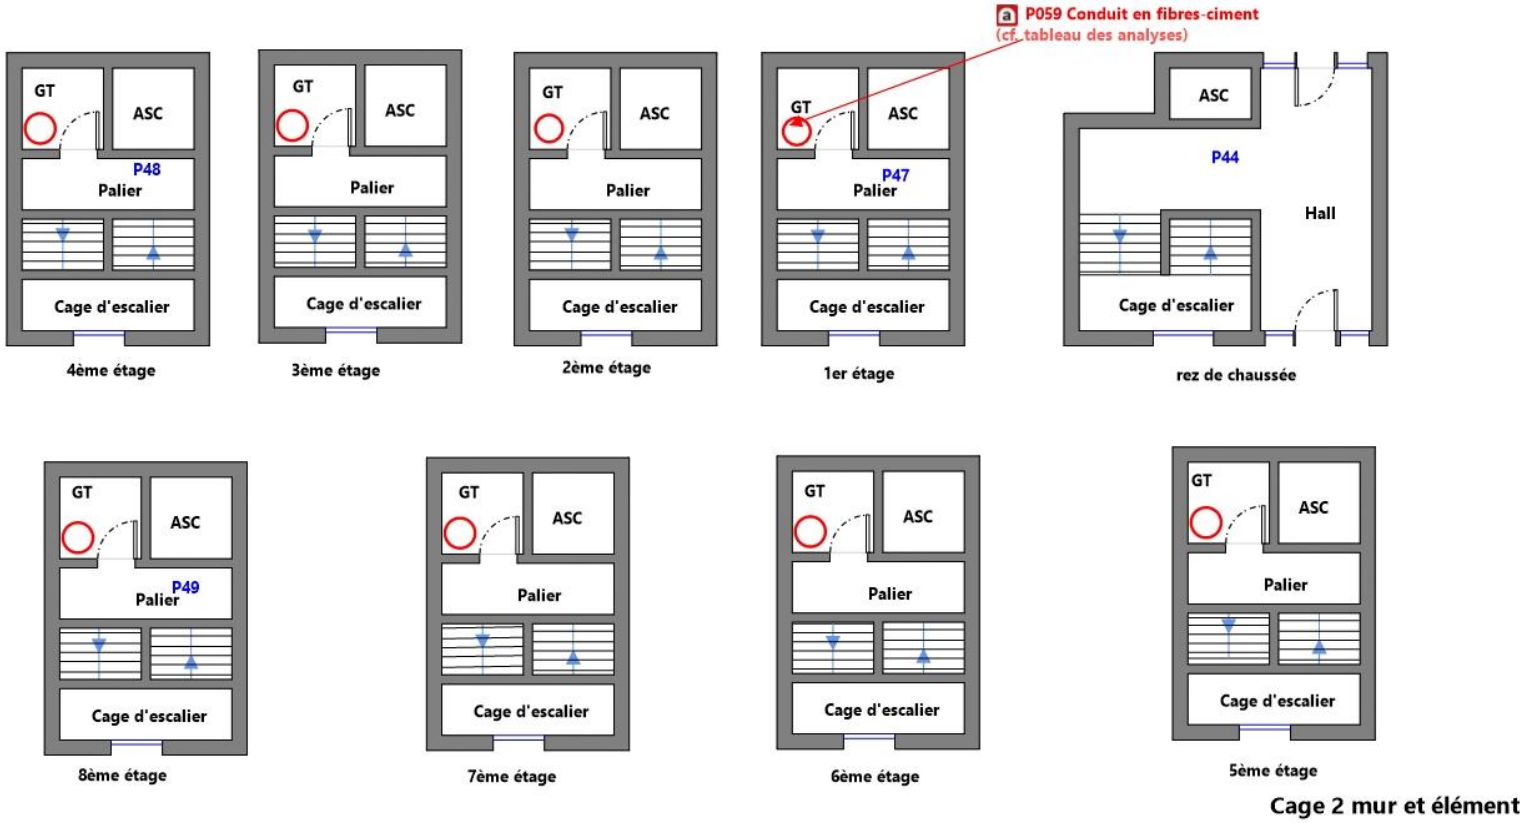

Cage 2 mur et élément

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

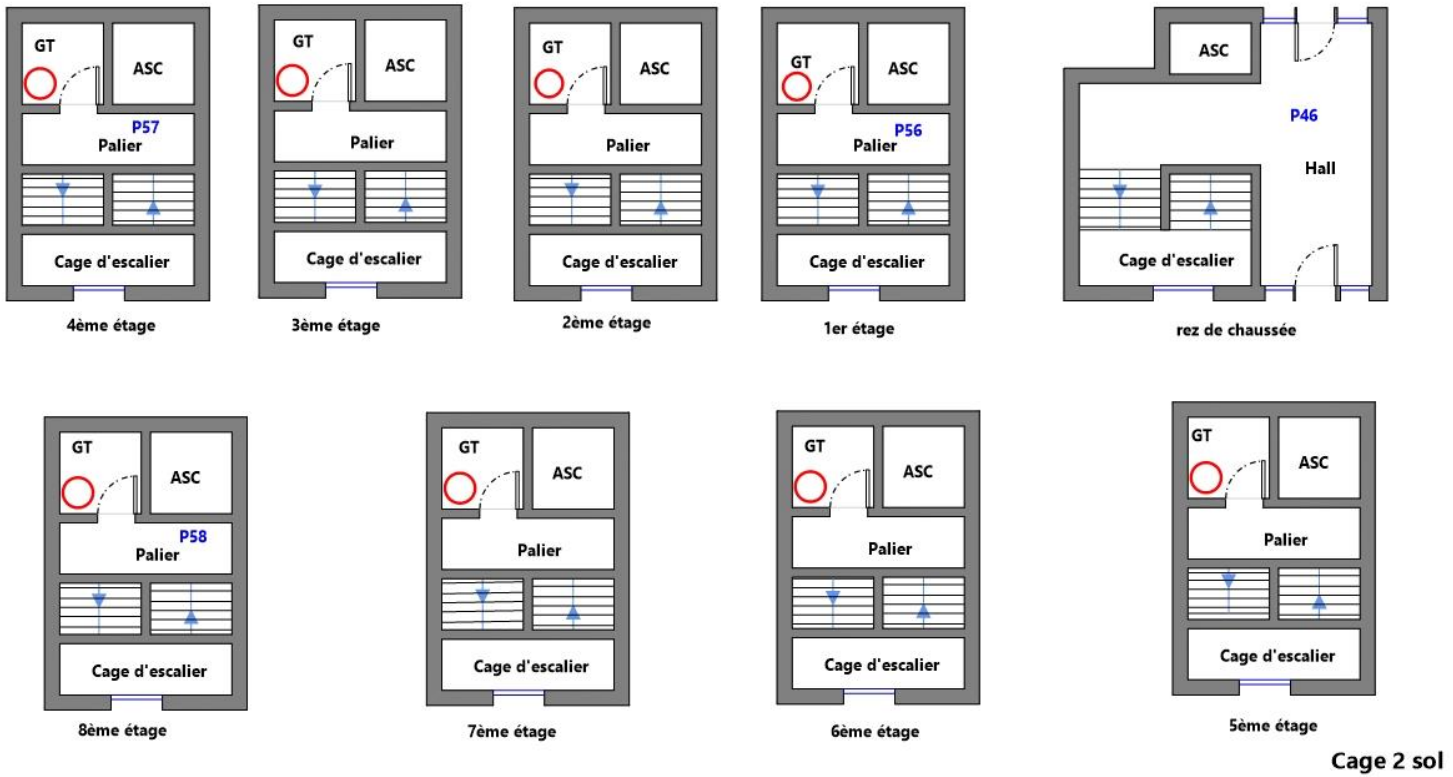

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
a Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité

Cage 3 mur et élément

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

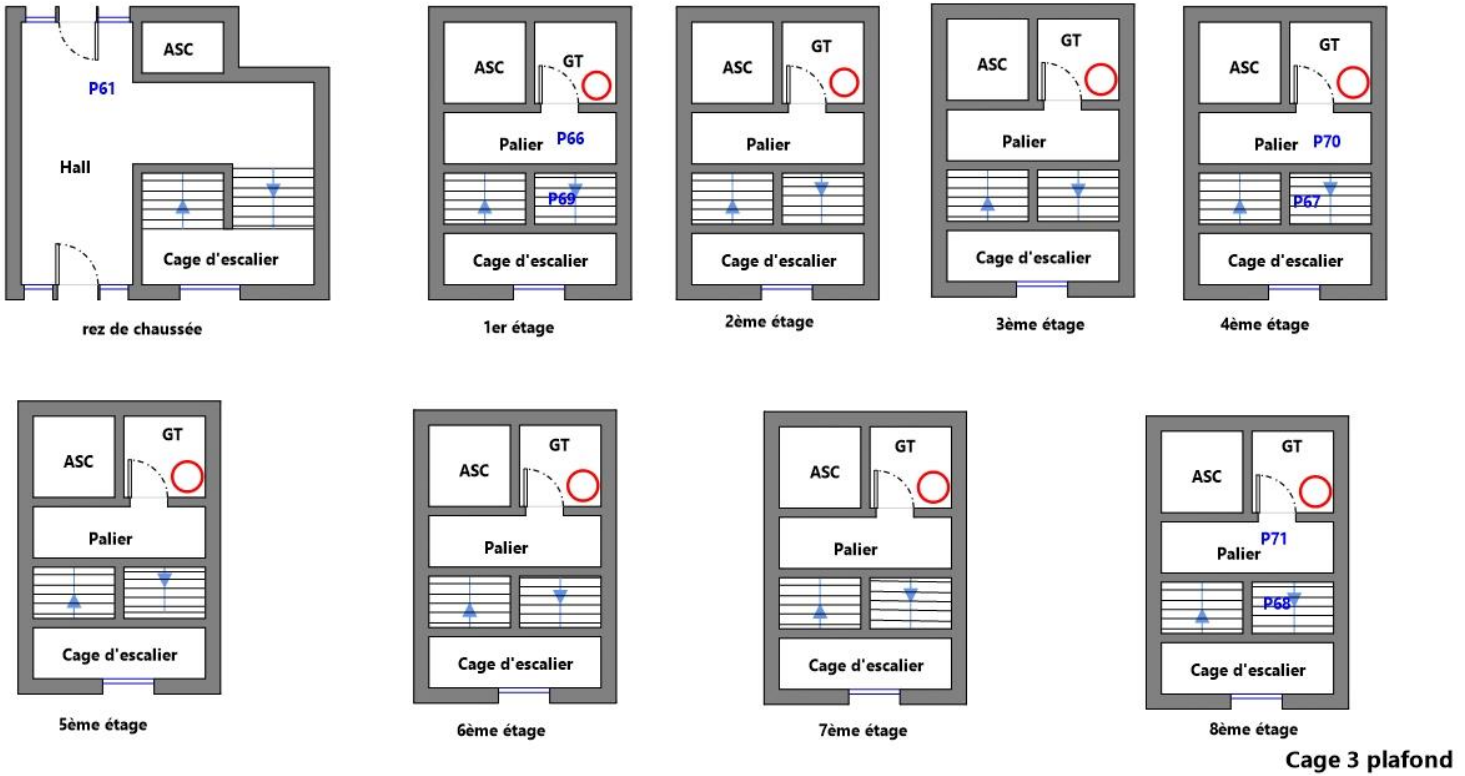

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

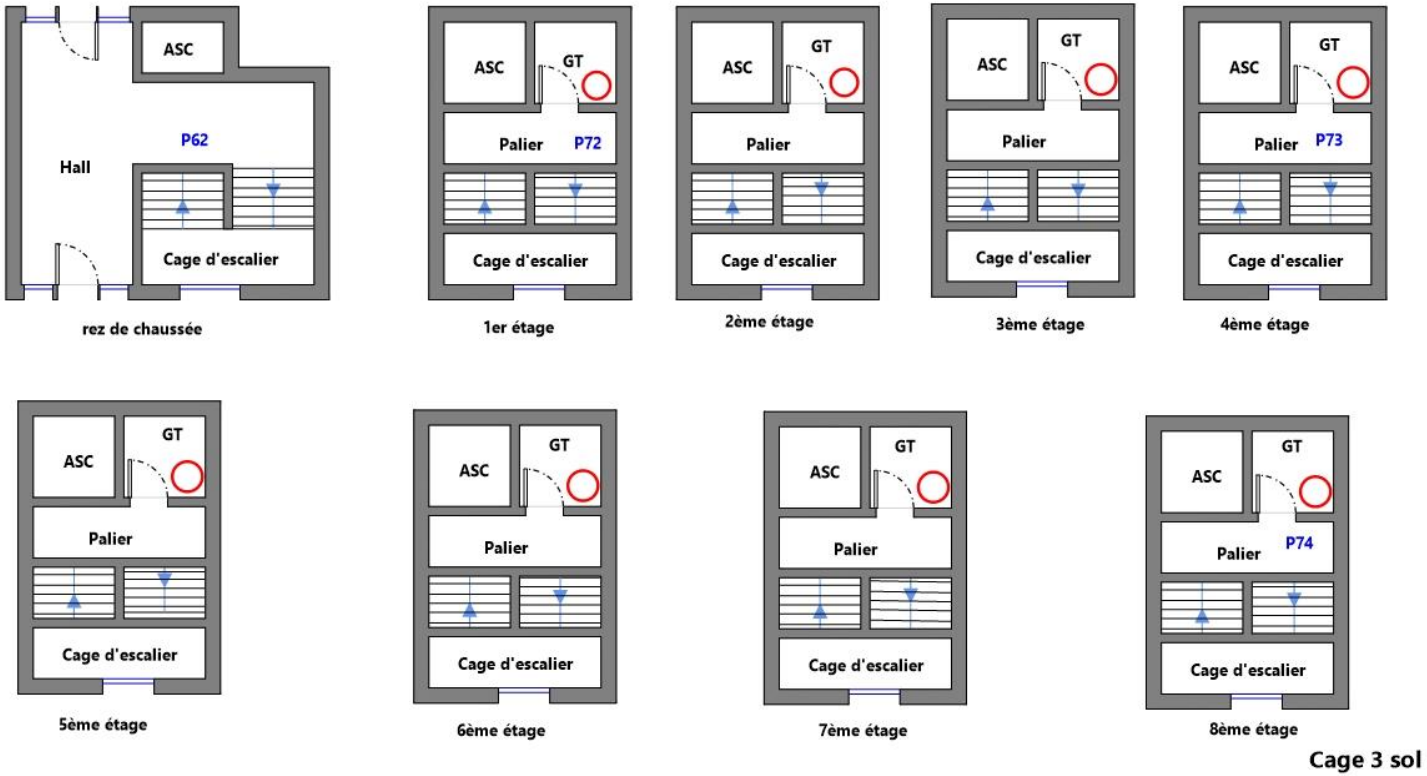

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

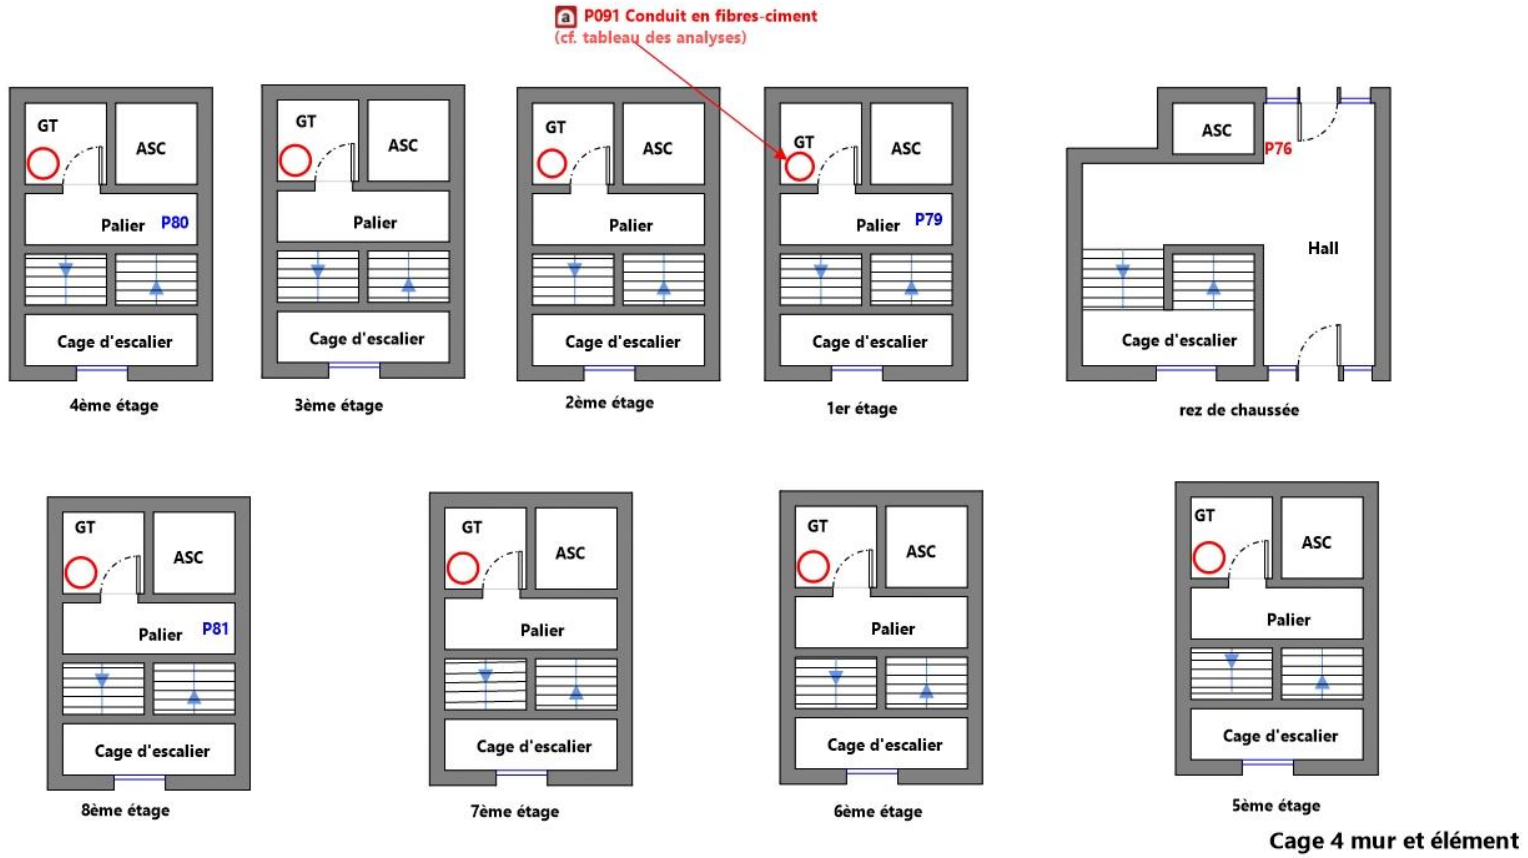

Cage 4 mur et élément

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

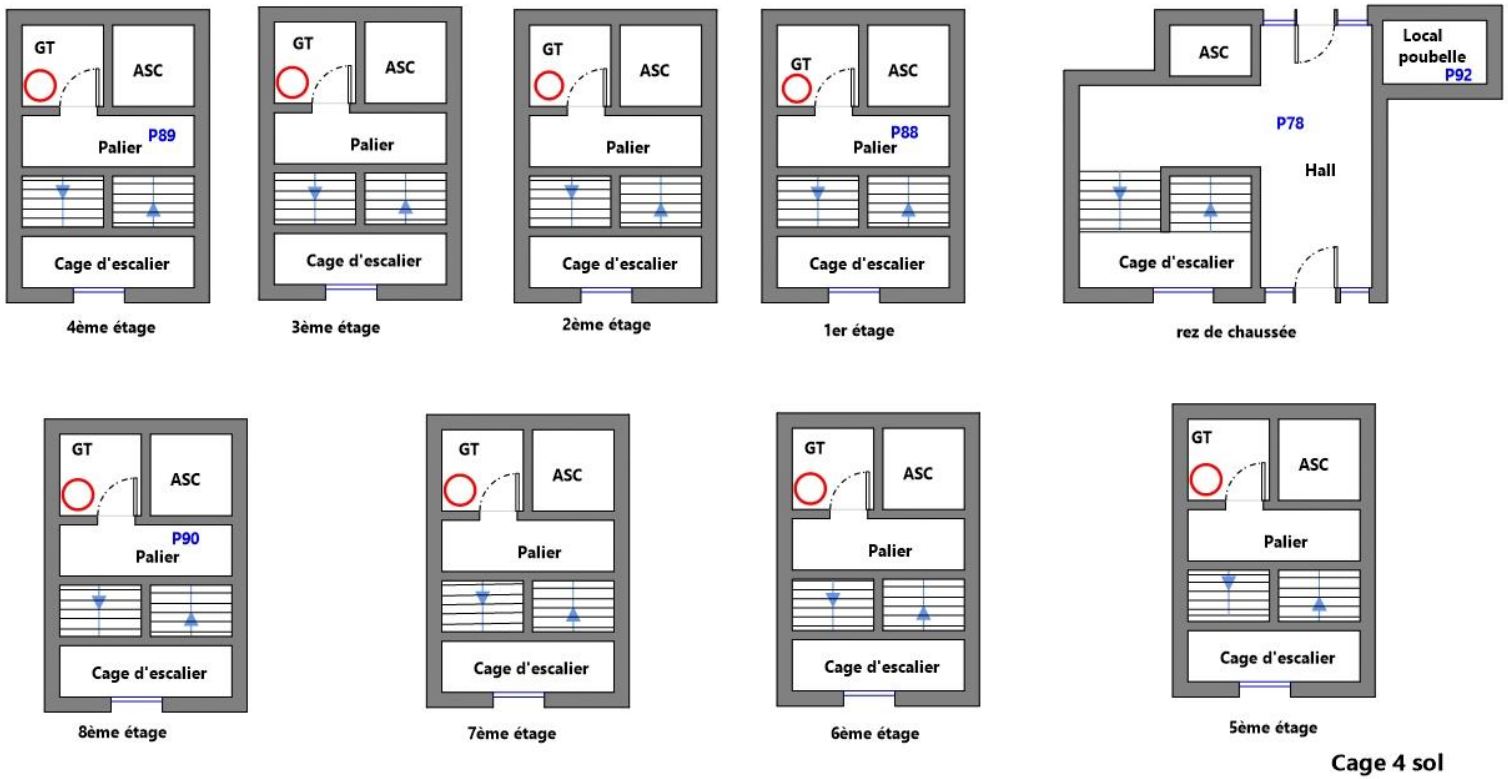

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

Cage 5 mur et élément

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

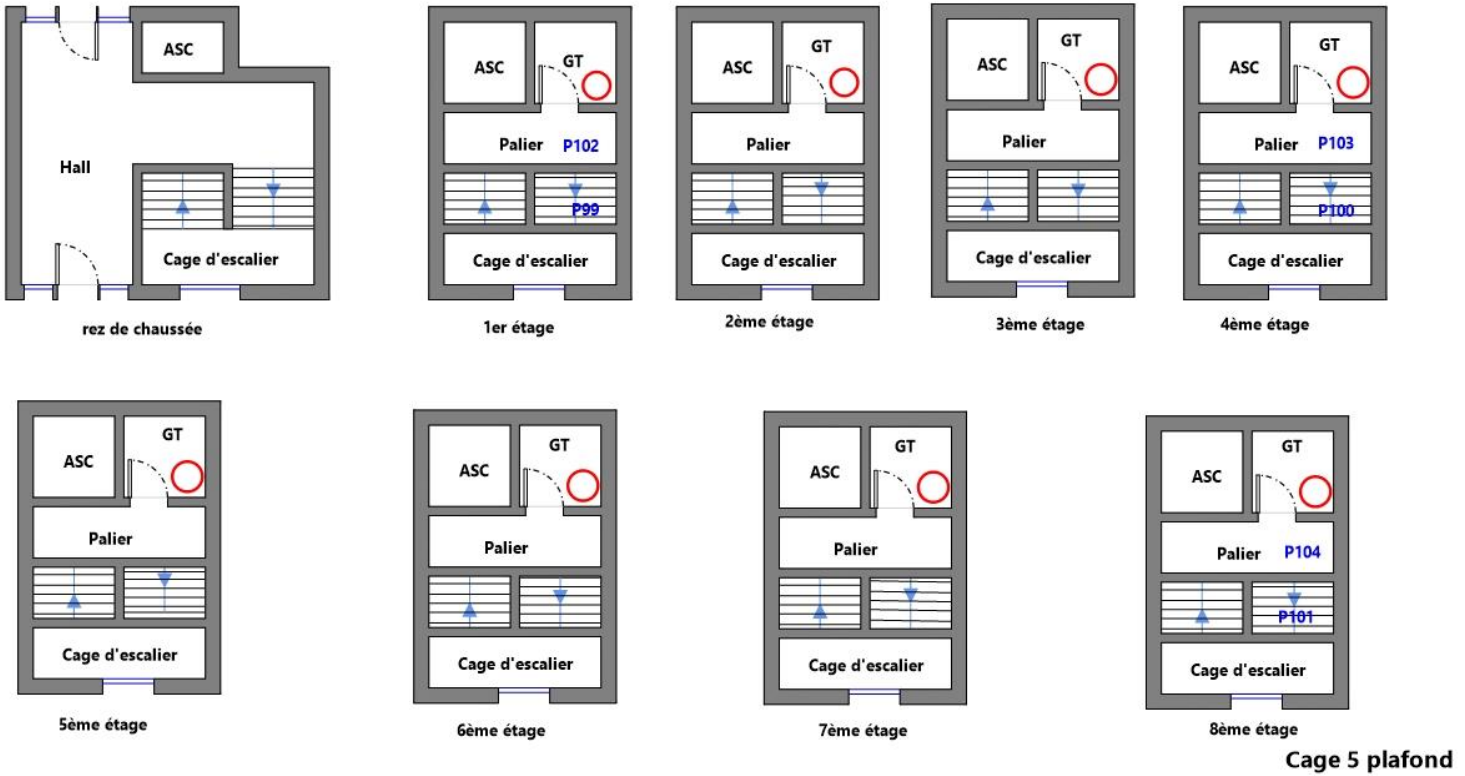

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

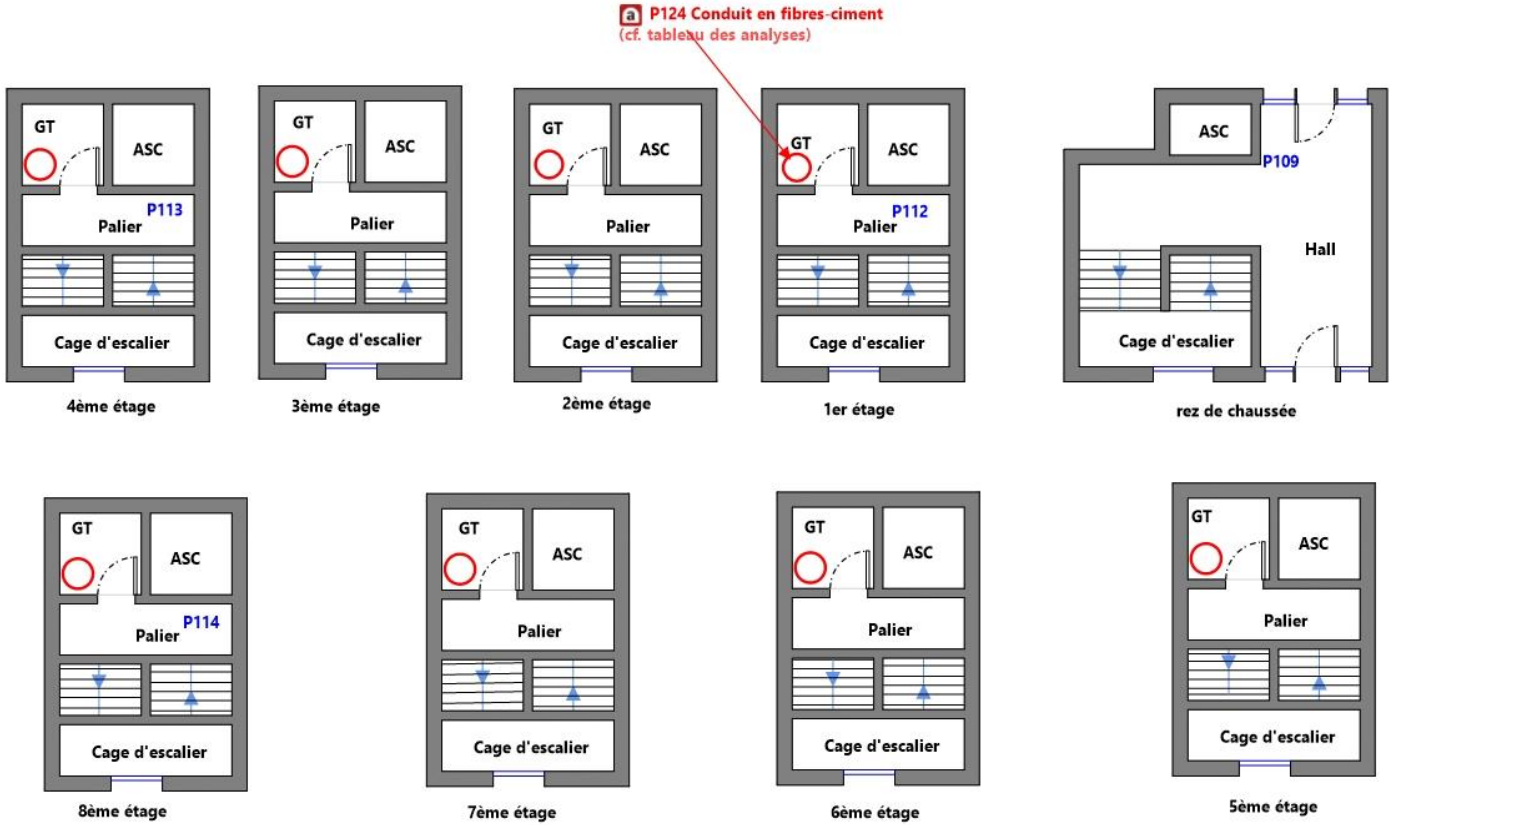

Cage 6 mur et élément

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

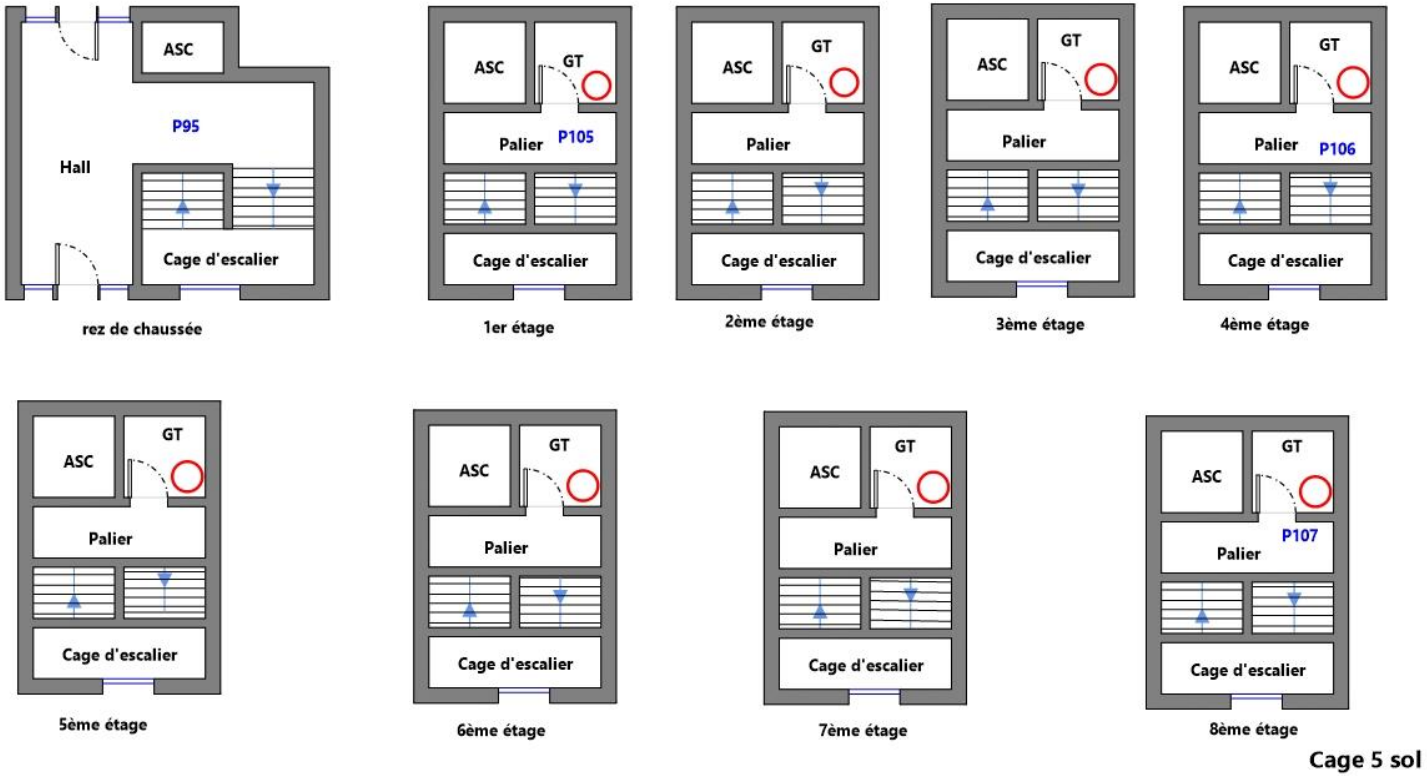

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

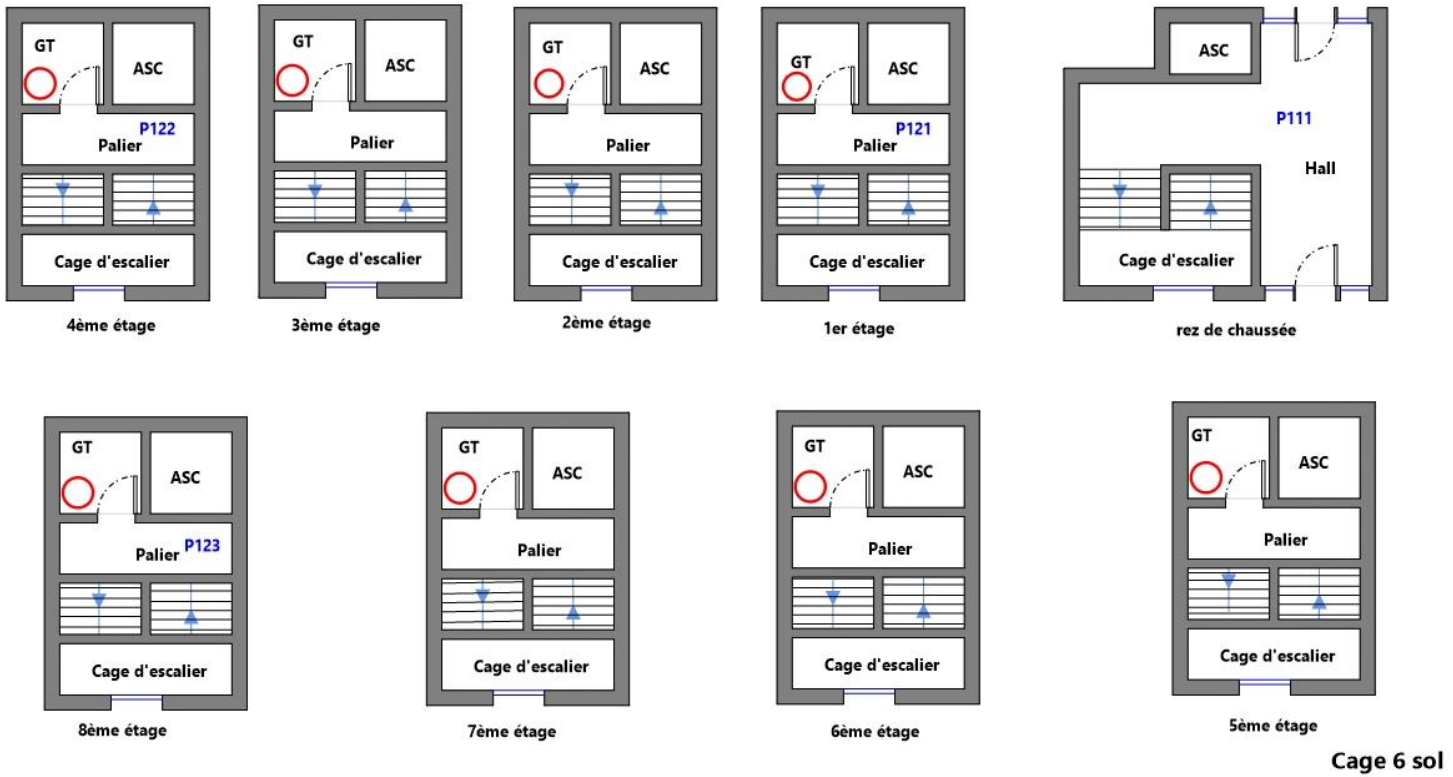

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

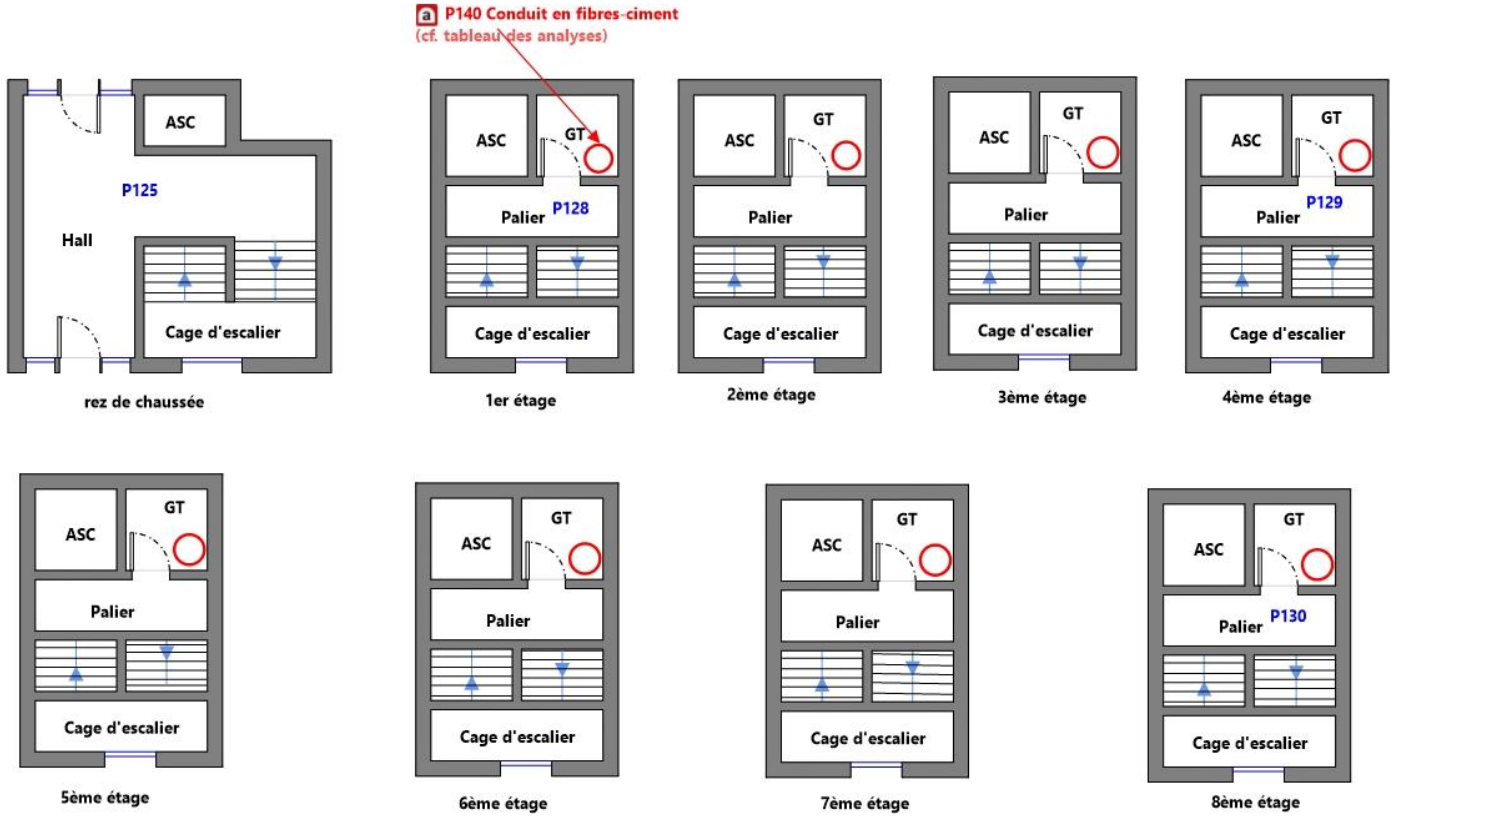

Cage 7 mur et élément

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

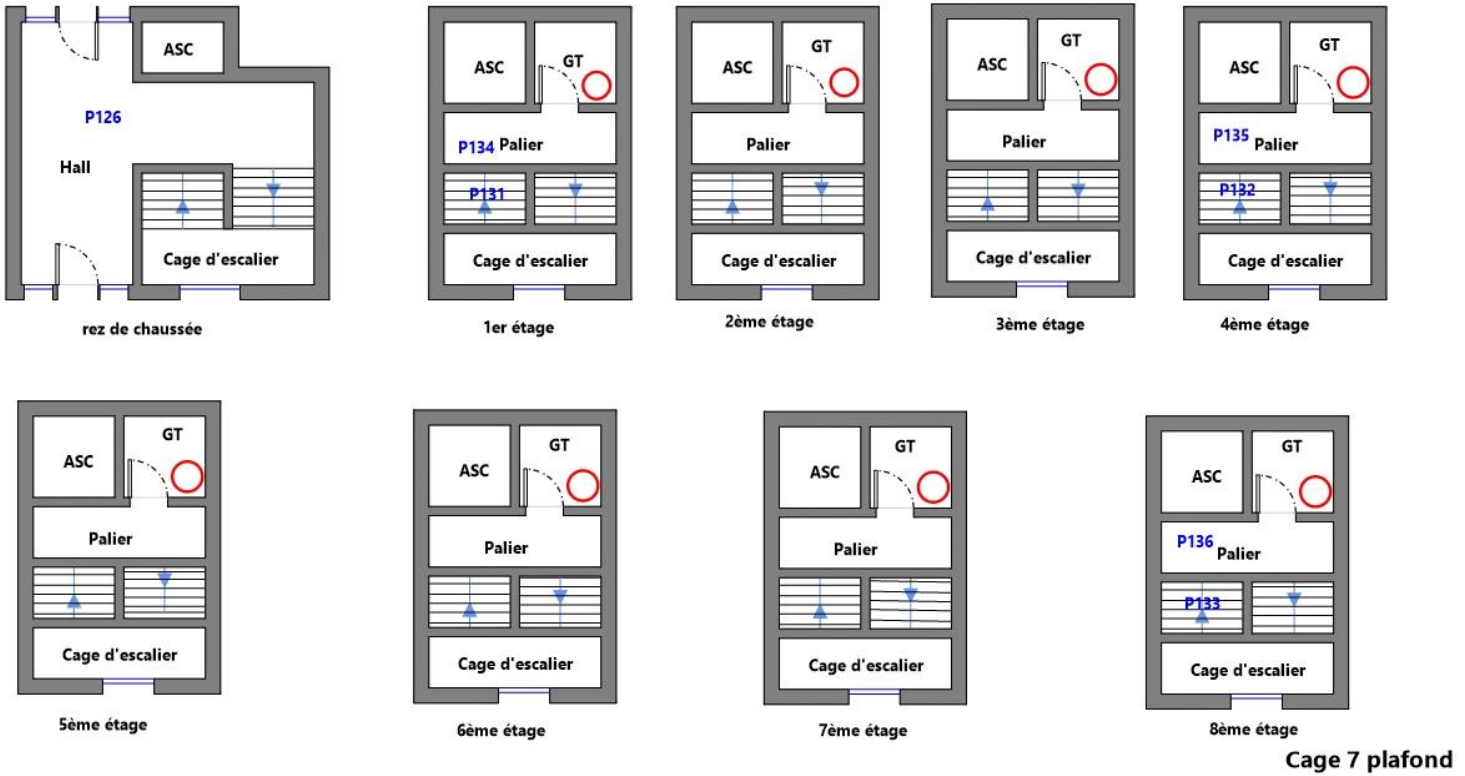

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

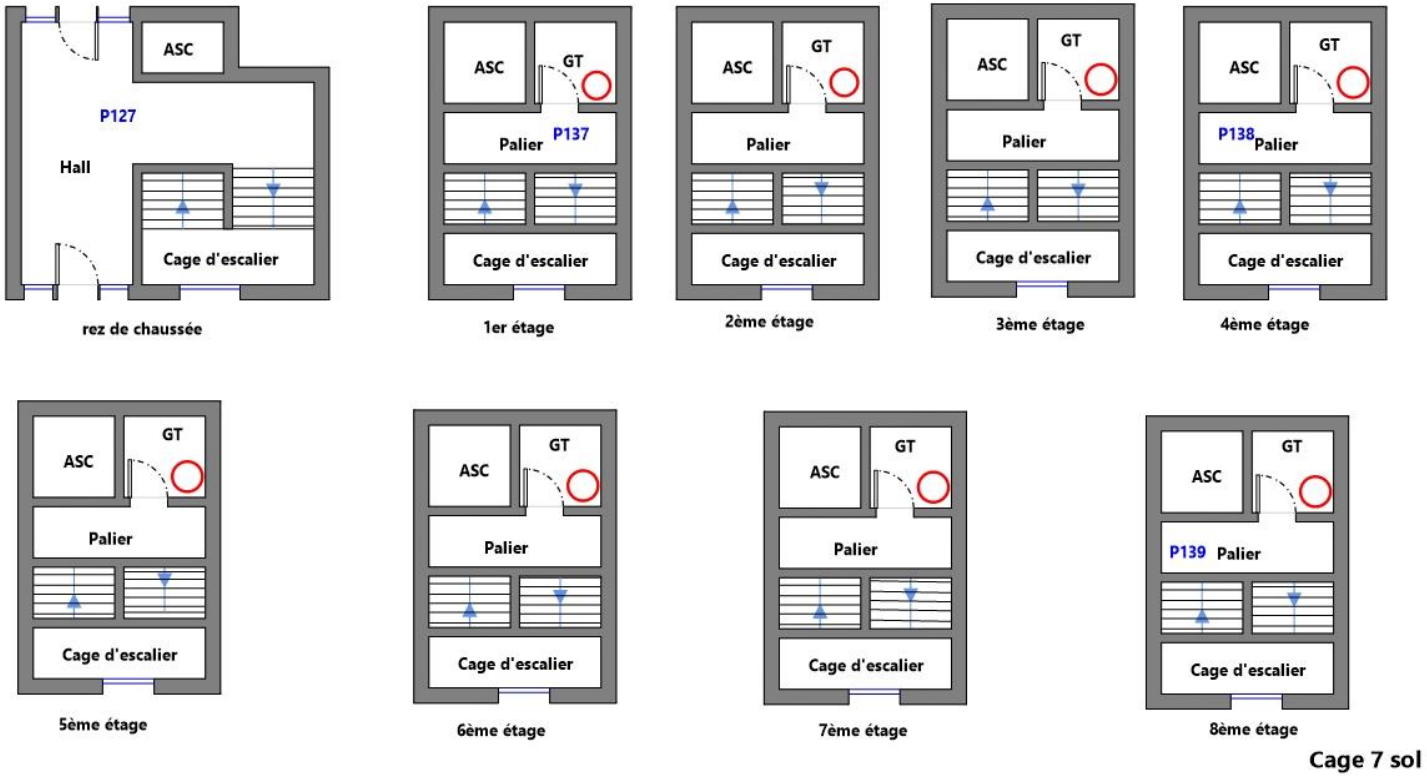

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
LOCAL NON VISITÉ	Local non visité
ÉLÉMENT NON VISITÉ	Elément non visité

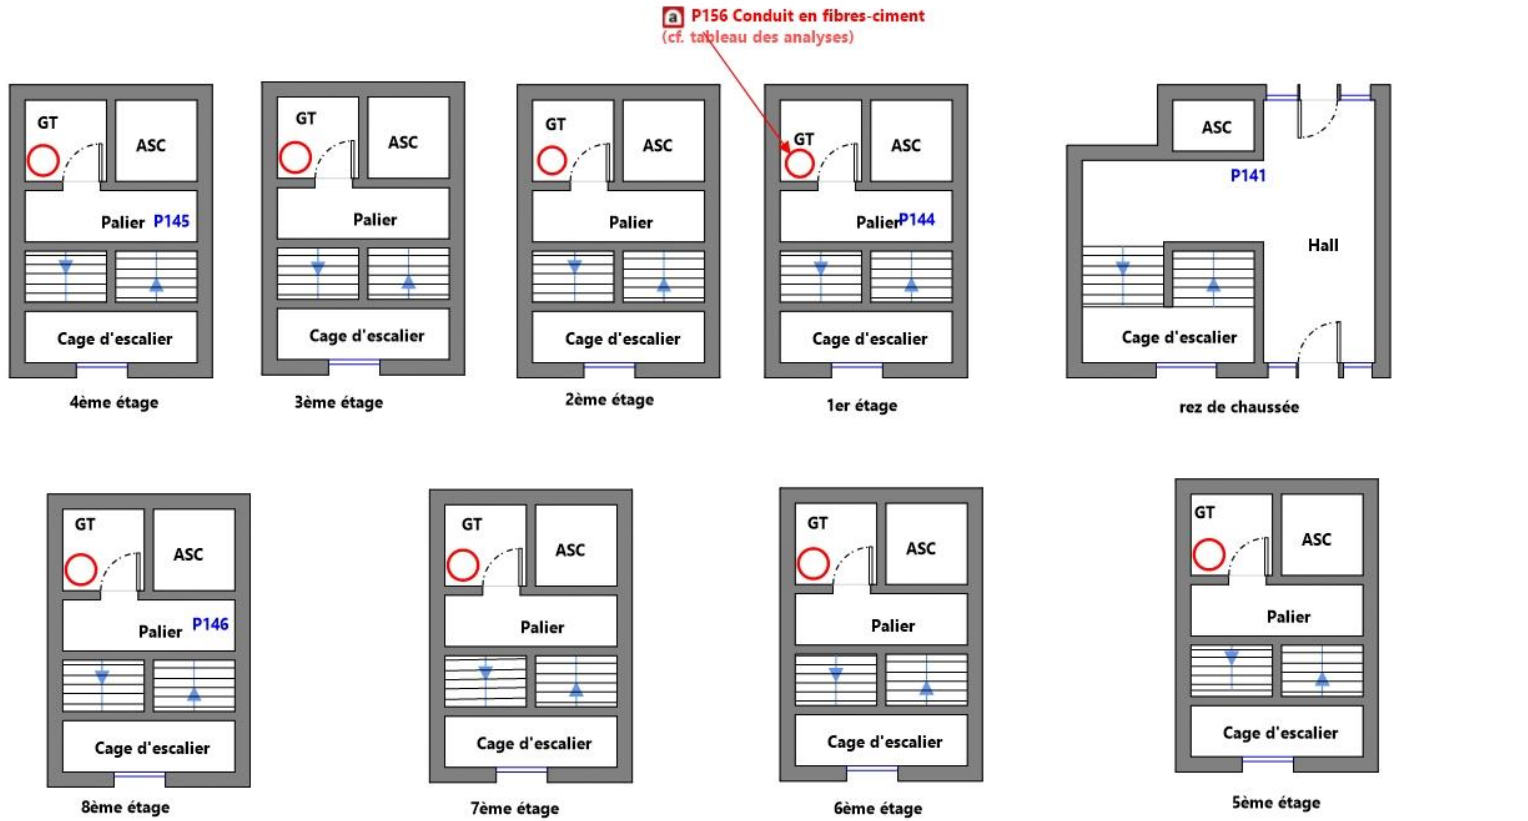

Cage 8 mur et élément

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



4ème étage



3ème étage



2ème étage



1er étage

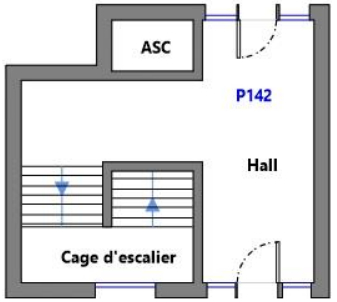

rez de chaussée



8ème étage



7ème étage



6ème étage



5ème étage

Cage 8 plafond

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900
Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

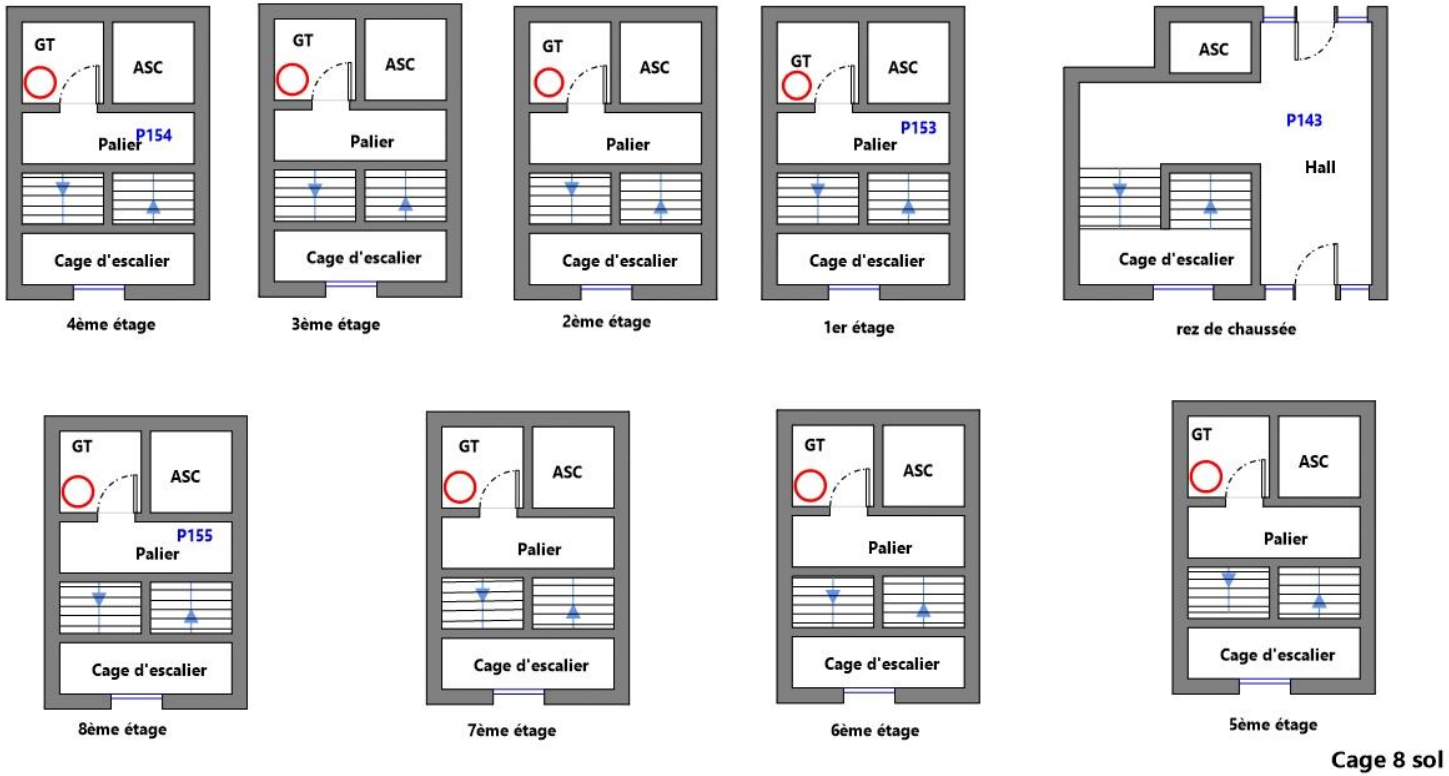

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2309159900

Opération	SAGET frédéric
Site	1-8 square de lorient 77000 melun
Date de réalisation	11/10/2023
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

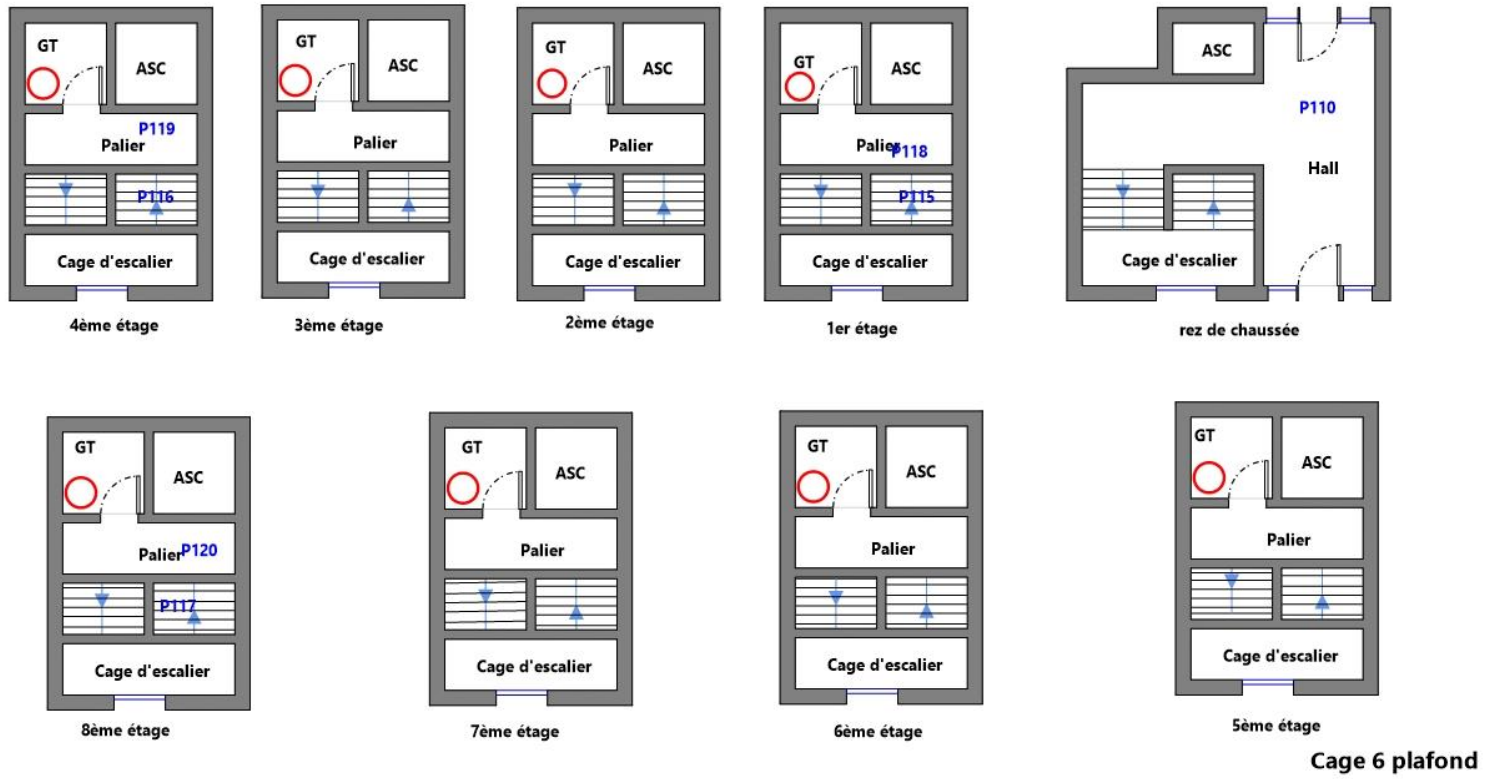

Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	Identifiant: ZPSO001 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur (granulaire) (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	Identifiant: ZPSO001 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur (granulaire) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	Identifiant: ZPSO001 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Phase 2 Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur (granulaire) (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	Identifiant: ZPSO001 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	- Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur (granulaire) (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	Identifiant: ZPSO002 Description: Joint de dilatation	- Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau souple de type joint (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	Identifiant: ZPSO002 Description: Joint de dilatation	- Matériau semi-dur (jaune) en traces ; matériau souple de type joint (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	Identifiant: ZPSO002 Description: Joint de dilatation	- Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau souple de type joint (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	Identifiant: ZPSO002 Description: Joint de dilatation	- Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau souple de type joint (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	Identifiant: ZPSO003 Description: crépi	- Phase 2 Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	Identifiant: ZPSO004 Description: Peinture sur béton	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	Identifiant: ZPSO004 Description: Peinture sur béton	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	Identifiant: ZPSO004 Description: Peinture sur béton	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	Identifiant: ZPSO004 Description: Peinture sur béton	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture sur béton	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture sur béton	- Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture sur béton	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau (bitumineux) (noir) ; matériau dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	Identifiant: ZPSO005 Description: Peinture sur béton	- Phase 2 Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	Identifiant: ZPSO006 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence	- Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	Identifiant: ZPSO006 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence	- Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	Identifiant: ZPSO006 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence	- Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	Identifiant: ZPSO006 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	Identifiant: ZPSO007 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	Identifiant: ZPSO007 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	Identifiant: ZPSO007 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	Identifiant: ZPSO008 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	Identifiant: ZPSO008 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	Identifiant: ZPSO008 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	- Matériau souple (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	Identifiant: ZPSO009 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence	- Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029	Identifiant: ZPSO010 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante

		- Phase 3 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	
P030	Identifiant: ZPSO011 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P031	Identifiant: ZPSO012 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P032	Identifiant: ZPSO012 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P033	Identifiant: ZPSO012 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P034	Identifiant: ZPSO013 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P035	Identifiant: ZPSO013 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P036	Identifiant: ZPSO013 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P037	Identifiant: ZPSO014 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	Identifiant: ZPSO014 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	Identifiant: ZPSO014 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P040	Identifiant: ZPSO015 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P041	Identifiant: ZPSO015 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P042	Identifiant: ZPSO015 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P043	Identifiant: ZPSO016 Description: Conduit en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P044	Identifiant: ZPSO017 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence	- Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P045	Identifiant: ZPSO018 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot	- Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P046	Identifiant: ZPSO019 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P047	Identifiant: ZPSO020 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P048	Identifiant: ZPSO020 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P049	Identifiant: ZPSO020 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P050	Identifiant: ZPSO021 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P051	Identifiant: ZPSO021 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P052	Identifiant: ZPSO021 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P053	Identifiant: ZPSO022 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P054	Identifiant: ZPSO022 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P055	Identifiant: ZPSO022 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P056	Identifiant: ZPSO023 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P057	Identifiant: ZPSO023 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P058	Identifiant: ZPSO023 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P059	Identifiant: ZPSO024 Description: Conduit en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P060	Identifiant: ZPSO025 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence	- Matériau dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P061	Identifiant: ZPSO026 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P062	Identifiant: ZPSO027 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P063	Identifiant: ZPSO028 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P064	Identifiant: ZPSO028 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P065	Identifiant: ZPSO028 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P066	Identifiant: ZPSO029 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P067	Identifiant: ZPSO029 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P068	Identifiant: ZPSO029 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P069	Identifiant: ZPSO030 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P070	Identifiant: ZPSO030 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P071	Identifiant: ZPSO030 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P072	Identifiant: ZPSO031 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P073	Identifiant: ZPSO031 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P074	Identifiant: ZPSO031 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P075	Identifiant: ZPSO032 Description: Conduit en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P076	Identifiant: ZPSO033 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence	- Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P077	Identifiant: ZPSO034 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P078	Identifiant: ZPSO035 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P079	Identifiant: ZPSO036 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P080	Identifiant: ZPSO036 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P081	Identifiant: ZPSO036 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P082	Identifiant: ZPSO037 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P083	Identifiant: ZPSO037 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P084	Identifiant: ZPSO037 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P085	Identifiant: ZPSO038 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P086	Identifiant: ZPSO038 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P087	Identifiant: ZPSO038 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P088	Identifiant: ZPSO039 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante

P089	Identifiant: ZPSO039 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P090	Identifiant: ZPSO039 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P091	Identifiant: ZPSO040 Description: Conduit en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P092	Identifiant: ZPSO041 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P093	Identifiant: ZPSO042 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence	- Phase 1 Matériau semi-dur (granulaire) (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P094	Identifiant: ZPSO043 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P095	Identifiant: ZPSO044 Description: Couche1:Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur (beige) ; matériau dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P096	Identifiant: ZPSO045 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P097	Identifiant: ZPSO045 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P098	Identifiant: ZPSO045 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P099	Identifiant: ZPSO046 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P100	Identifiant: ZPSO046 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P101	Identifiant: ZPSO046 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P102	Identifiant: ZPSO047 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P103	Identifiant: ZPSO047 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P104	Identifiant: ZPSO047 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P105	Identifiant: ZPSO048 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P106	Identifiant: ZPSO048 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P107	Identifiant: ZPSO048 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P108	Identifiant: ZPSO049 Description: Conduit en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P109	Identifiant: ZPSO050 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence	- Matériau dur (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P110	Identifiant: ZPSO051 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P111	Identifiant: ZPSO052 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur (gris) ; matériau dur (granulaire) (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P112	Identifiant: ZPSO053 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P113	Identifiant: ZPSO053 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P114	Identifiant: ZPSO053 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P115	Identifiant: ZPSO054 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P116	Identifiant: ZPSO054 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P117	Identifiant: ZPSO054 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P118	Identifiant: ZPSO055 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P119	Identifiant: ZPSO055 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P120	Identifiant: ZPSO055 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P121	Identifiant: ZPSO056 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P122	Identifiant: ZPSO056 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P123	Identifiant: ZPSO056 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P124	Identifiant: ZPSO057 Description: Conduit en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P125	Identifiant: ZPSO058 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence	- Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P126	Identifiant: ZPSO059 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot	- Phase 1 Matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P127	Identifiant: ZPSO060 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Phase 1 Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P128	Identifiant: ZPSO061 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P129	Identifiant: ZPSO061 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P130	Identifiant: ZPSO061 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P131	Identifiant: ZPSO062 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P132	Identifiant: ZPSO062 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P133	Identifiant: ZPSO062 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P134	Identifiant: ZPSO063 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P135	Identifiant: ZPSO063 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P136	Identifiant: ZPSO063 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P137	Identifiant: ZPSO064 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P138	Identifiant: ZPSO064 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P139	Identifiant: ZPSO064 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P140	Identifiant: ZPSO065 Description: Conduit en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P141	Identifiant: ZPSO066 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P142	Identifiant: ZPSO067 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P143	Identifiant: ZPSO068 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P144	Identifiant: ZPSO069 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P145	Identifiant: ZPSO069 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P146	Identifiant: ZPSO069 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P147	Identifiant: ZPSO070 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P148	Identifiant: ZPSO070 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P149	Identifiant: ZPSO070 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P150	Identifiant: ZPSO071 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P151	Identifiant: ZPSO071	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante

	Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre		
P152	Identifiant: ZPSO071 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P153	Identifiant: ZPSO072 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P154	Identifiant: ZPSO072 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P155	Identifiant: ZPSO072 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P156	Identifiant: ZPSO073 Description: Conduit en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterré

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront-être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.

Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

ZPSO001 : Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…)

Niveau : Cage 1 rez de chaussée, Cage 2 rez de chaussée, Cage 3 rez de chaussée, Cage 4 rez de chaussée, Cage 5 rez de chaussée, Cage 6 rez de chaussée, Cage 7 rez de chaussée, Cage 8 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Auvent avant	Discontinue	1	Sol	Oui Cage 1 rez de chaussée - Avent avant : Sol	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2309159900/P001, réf. labo.: 23EK073017-001 MA2309159900/P002, réf. labo.: 23EK073017-002 MA2309159900/P003, réf. labo.: 23EK073017-003 MA2309159900/P004, réf. labo.: 23EK073017-004 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur (granulaire) (noir) : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P003, P004	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2309159900/P001, réf. labo.: 23EK073017-001 MA2309159900/P002, réf. labo.: 23EK073017-002 MA2309159900/P003, réf. labo.: 23EK073017-003 MA2309159900/P004, réf. labo.: 23EK073017-004 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001, P002, P003, P004	Idem photo : P001; P002; P003; P004

Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P003, P004	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2309159900/P001, réf. labo.: 23EK073017-001 MA2309159900/P002, réf. labo.: 23EK073017-002 MA2309159900/P003, réf. labo.: 23EK073017-003 MA2309159900/P004, réf. labo.: 23EK073017-004 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001, P002, P003, P004	Idem photo : P001; P002; P003; P004
Discontinue	4	Sol	Oui Cage 4 rez de chaussée - Avent avant : Sol	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2309159900/P001, réf. labo.: 23EK073017-001 MA2309159900/P002, réf. labo.: 23EK073017-002 MA2309159900/P003, réf. labo.: 23EK073017-003 MA2309159900/P004, réf. labo.: 23EK073017-004 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P002 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur (granulaire) (noir) Absence d'amiante	
Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P003, P004	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2309159900/P001, réf. labo.: 23EK073017-001 MA2309159900/P002, réf. labo.: 23EK073017-002 MA2309159900/P003, réf. labo.: 23EK073017-003 MA2309159900/P004, réf. labo.: 23EK073017-004 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001, P002, P003, P004	Idem photo : P001; P002; P003; P004

Discontinue	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P003, P004	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2309159900/P001, réf. labo.: 23EK073017-001 MA2309159900/P002, réf. labo.: 23EK073017-002 MA2309159900/P003, réf. labo.: 23EK073017-003 MA2309159900/P004, réf. labo.: 23EK073017-004 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001, P002, P003, P004	Idem photo : P001; P002; P003; P004
Discontinue	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P003, P004	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2309159900/P001, réf. labo.: 23EK073017-001 MA2309159900/P002, réf. labo.: 23EK073017-002 MA2309159900/P003, réf. labo.: 23EK073017-003 MA2309159900/P004, réf. labo.: 23EK073017-004 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001, P002, P003, P004	Idem photo : P001; P002; P003; P004
Discontinue	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P003, P004	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2309159900/P001, réf. labo.: 23EK073017-001 MA2309159900/P002, réf. labo.: 23EK073017-002 MA2309159900/P003, réf. labo.: 23EK073017-003 MA2309159900/P004, réf. labo.: 23EK073017-004 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001, P002, P003, P004	Idem photo : P001; P002; P003; P004

Auvent arrière	Discontinue	9	Sol	Oui Cage 1 rez de chaussée - Avent arrière : Sol	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2309159900/P001, réf. labo.: 23EK073017-001 MA2309159900/P002, réf. labo.: 23EK073017-002 MA2309159900/P003, réf. labo.: 23EK073017-003 MA2309159900/P004, réf. labo.: 23EK073017-004 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P003 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur (granulaire) (jaune) Absence d'amiante	
	Discontinue	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P003, P004	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2309159900/P001, réf. labo.: 23EK073017-001 MA2309159900/P002, réf. labo.: 23EK073017-002 MA2309159900/P003, réf. labo.: 23EK073017-003 MA2309159900/P004, réf. labo.: 23EK073017-004 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001, P002, P003, P004	Idem photo : P001; P002; P003; P004
	Discontinue	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P003, P004	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2309159900/P001, réf. labo.: 23EK073017-001 MA2309159900/P002, réf. labo.: 23EK073017-002 MA2309159900/P003, réf. labo.: 23EK073017-003 MA2309159900/P004, réf. labo.: 23EK073017-004 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001, P002, P003, P004	Idem photo : P001; P002; P003; P004

Discontinue	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P003, P004	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2309159900/P001, réf. labo.: 23EK073017-001 MA2309159900/P002, réf. labo.: 23EK073017-002 MA2309159900/P003, réf. labo.: 23EK073017-003 MA2309159900/P004, réf. labo.: 23EK073017-004 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001, P002, P003, P004	Idem photo : P001; P002; P003; P004
Discontinue	13	Sol	Oui Cage 5 rez de chaussée - Avent arrière : Sol	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2309159900/P001, réf. labo.: 23EK073017-001 MA2309159900/P002, réf. labo.: 23EK073017-002 MA2309159900/P003, réf. labo.: 23EK073017-003 MA2309159900/P004, réf. labo.: 23EK073017-004 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P004 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur (granulaire) (noir) : Absence d'amiante	
Discontinue	14	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P003, P004	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2309159900/P001, réf. labo.: 23EK073017-001 MA2309159900/P002, réf. labo.: 23EK073017-002 MA2309159900/P003, réf. labo.: 23EK073017-003 MA2309159900/P004, réf. labo.: 23EK073017-004 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001, P002, P003, P004	Idem photo : P001; P002; P003; P004

	Discontinue	15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P003, P004	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2309159900/P001, réf. labo.: 23EK073017-001 MA2309159900/P002, réf. labo.: 23EK073017-002 MA2309159900/P003, réf. labo.: 23EK073017-003 MA2309159900/P004, réf. labo.: 23EK073017-004 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001, P002, P003, P004	Idem photo : P001; P002; P003; P004
	Discontinue	16	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P003, P004	Identifiant: ZPSO001 Echantillon: MA2309159900/P001, réf. labo.: 23EK073017-001 MA2309159900/P002, réf. labo.: 23EK073017-002 MA2309159900/P003, réf. labo.: 23EK073017-003 MA2309159900/P004, réf. labo.: 23EK073017-004 Description: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Composant de la construction: 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse Partie à sonder: Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés…) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P001, P002, P003, P004	Idem photo : P001; P002; P003; P004

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO002 : Joint de dilatation

Pièces : Façade avant, Façade gauche, Façade arrière, Façade droite

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo

Façade avant	Discontinue	1	facade	Oui Façade avant : facade	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2309159900/P005, réf. labo.: 23EK073017-005 MA2309159900/P006, réf. labo.: 23EK073017-006 MA2309159900/P007, réf. labo.: 23EK073017-007 MA2309159900/P008, réf. labo.: 23EK073017-008 Description: Joint de dilatation Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich Partie à sonder: Joint de dilatation Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau souple de type joint (gris) : Absence d'amiante	
Façade gauche	Discontinue	2	facade	Oui Façade gauche : facade	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2309159900/P005, réf. labo.: 23EK073017-005 MA2309159900/P006, réf. labo.: 23EK073017-006 MA2309159900/P007, réf. labo.: 23EK073017-007 MA2309159900/P008, réf. labo.: 23EK073017-008 Description: Joint de dilatation Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich Partie à sonder: Joint de dilatation Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P006 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (jaune) en traces ; matériau souple de type joint (gris) : Absence d'amiante	
Façade arrière	Discontinue	3	facade	Oui Façade arrière : facade	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2309159900/P005, réf. labo.: 23EK073017-005 MA2309159900/P006, réf. labo.: 23EK073017-006 MA2309159900/P007, réf. labo.: 23EK073017-007 MA2309159900/P008, réf. labo.: 23EK073017-008 Description: Joint de dilatation Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich Partie à sonder: Joint de dilatation Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P007 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau souple de type joint (gris) : Absence d'amiante	
Façade droite	Discontinue	4	facade	Oui Façade droite : facade	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2309159900/P005, réf. labo.: 23EK073017-005 MA2309159900/P006, réf. labo.: 23EK073017-006 MA2309159900/P007, réf. labo.: 23EK073017-007 MA2309159900/P008, réf. labo.: 23EK073017-008 Description: Joint de dilatation Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich Partie à sonder: Joint de dilatation Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P008 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau souple de type joint (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO003 : crépi

Pièces : Façade gauche

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade gauche	Unique	1	facade	Oui Façade gauche : facade	Identifiant: ZPSO003 Réf. échantillon: MA2309159900/P009 Réf. laboratoire: 23EK073017-009 Description: crépi Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich Partie à sonder: crépi Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P009 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris) Absence d'amiante	

ZPSO004 : Peinture sur béton

Niveau : Cage 1 rez de chaussée, Cage 2 rez de chaussée, Cage 3 rez de chaussée, Cage 4 rez de chaussée, Cage 5 rez de chaussée, Cage 6 rez de chaussée, Cage 7 rez de chaussée, Cage 8 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Auvent avant	Discontinue	1	facade	Oui Cage 1 rez de chaussée - Avent avant : facade	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2309159900/P010, réf. labo.: 23EK073017-010 MA2309159900/P011, réf. labo.: 23EK073017-011 MA2309159900/P012, réf. labo.: 23EK073017-012 MA2309159900/P013, réf. labo.: 23EK073017-013 Description: Peinture sur béton Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Peinture sur béton Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P010 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
	Discontinue	2	facade	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010, P011, P012, P013	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2309159900/P010, réf. labo.: 23EK073017-010 MA2309159900/P011, réf. labo.: 23EK073017-011 MA2309159900/P012, réf. labo.: 23EK073017-012 MA2309159900/P013, réf. labo.: 23EK073017-013 Description: Peinture sur béton Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Peinture sur béton Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P010, P011, P012, P013	Idem photo : P010; P012; P011; P013
	Discontinue	3	facade	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010, P011, P012, P013	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2309159900/P010, réf. labo.: 23EK073017-010 MA2309159900/P011, réf. labo.: 23EK073017-011 MA2309159900/P012, réf. labo.: 23EK073017-012 MA2309159900/P013, réf. labo.: 23EK073017-013 Description: Peinture sur béton Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Peinture sur béton Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P010, P011, P012, P013	Idem photo : P010; P012; P011; P013

Discontinue	4	facade	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010, P011, P012, P013	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2309159900/P010, réf. labo.: 23EK073017-010 MA2309159900/P011, réf. labo.: 23EK073017-011 MA2309159900/P012, réf. labo.: 23EK073017-012 MA2309159900/P013, réf. labo.: 23EK073017-013 Description: Peinture sur béton Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Peinture sur béton Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P010, P011, P012, P013	Idem photo : P010; P012; P011; P013
Discontinue	5	facade	Oui Cage 5 rez de chaussée - Avent avant : facade	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2309159900/P010, réf. labo.: 23EK073017-010 MA2309159900/P011, réf. labo.: 23EK073017-011 MA2309159900/P012, réf. labo.: 23EK073017-012 MA2309159900/P013, réf. labo.: 23EK073017-013 Description: Peinture sur béton Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Peinture sur béton Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P012 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Discontinue	6	facade	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010, P011, P012, P013	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2309159900/P010, réf. labo.: 23EK073017-010 MA2309159900/P011, réf. labo.: 23EK073017-011 MA2309159900/P012, réf. labo.: 23EK073017-012 MA2309159900/P013, réf. labo.: 23EK073017-013 Description: Peinture sur béton Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Peinture sur béton Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P010, P011, P012, P013	Idem photo : P010; P012; P011; P013
Discontinue	7	facade	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010, P011, P012, P013	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2309159900/P010, réf. labo.: 23EK073017-010 MA2309159900/P011, réf. labo.: 23EK073017-011 MA2309159900/P012, réf. labo.: 23EK073017-012 MA2309159900/P013, réf. labo.: 23EK073017-013 Description: Peinture sur béton Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Peinture sur béton Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P010, P011, P012, P013	Idem photo : P010; P012; P011; P013

	Discontinue	8	facade	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010, P011, P012, P013	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2309159900/P010, réf. labo.: 23EK073017-010 MA2309159900/P011, réf. labo.: 23EK073017-011 MA2309159900/P012, réf. labo.: 23EK073017-012 MA2309159900/P013, réf. labo.: 23EK073017-013 Description: Peinture sur béton Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Peinture sur béton Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P010, P011, P012, P013	Idem photo : P010; P012; P011; P013
Auvent arrière	Discontinue	9	facade	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010, P011, P012, P013	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2309159900/P010, réf. labo.: 23EK073017-010 MA2309159900/P011, réf. labo.: 23EK073017-011 MA2309159900/P012, réf. labo.: 23EK073017-012 MA2309159900/P013, réf. labo.: 23EK073017-013 Description: Peinture sur béton Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Peinture sur béton Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P010, P011, P012, P013	Idem photo : P010; P012; P011; P013
	Discontinue	10	facade	Oui Cage 2 rez de chaussée - Avent arrière : facade	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2309159900/P010, réf. labo.: 23EK073017-010 MA2309159900/P011, réf. labo.: 23EK073017-011 MA2309159900/P012, réf. labo.: 23EK073017-012 MA2309159900/P013, réf. labo.: 23EK073017-013 Description: Peinture sur béton Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Peinture sur béton Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P011 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
	Discontinue	11	facade	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010, P011, P012, P013	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2309159900/P010, réf. labo.: 23EK073017-010 MA2309159900/P011, réf. labo.: 23EK073017-011 MA2309159900/P012, réf. labo.: 23EK073017-012 MA2309159900/P013, réf. labo.: 23EK073017-013 Description: Peinture sur béton Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Peinture sur béton Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P010, P011, P012, P013	Idem photo : P010; P012; P011; P013

Discontinue	12	facade	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010, P011, P012, P013	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2309159900/P010, réf. labo.: 23EK073017-010 MA2309159900/P011, réf. labo.: 23EK073017-011 MA2309159900/P012, réf. labo.: 23EK073017-012 MA2309159900/P013, réf. labo.: 23EK073017-013 Description: Peinture sur béton Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Peinture sur béton Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P010, P011, P012, P013	Idem photo : P010; P012; P011; P013
Discontinue	13	facade	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010, P011, P012, P013	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2309159900/P010, réf. labo.: 23EK073017-010 MA2309159900/P011, réf. labo.: 23EK073017-011 MA2309159900/P012, réf. labo.: 23EK073017-012 MA2309159900/P013, réf. labo.: 23EK073017-013 Description: Peinture sur béton Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Peinture sur béton Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P010, P011, P012, P013	Idem photo : P010; P012; P011; P013
Discontinue	14	facade	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010, P011, P012, P013	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2309159900/P010, réf. labo.: 23EK073017-010 MA2309159900/P011, réf. labo.: 23EK073017-011 MA2309159900/P012, réf. labo.: 23EK073017-012 MA2309159900/P013, réf. labo.: 23EK073017-013 Description: Peinture sur béton Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Peinture sur béton Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P010, P011, P012, P013	Idem photo : P010; P012; P011; P013
Discontinue	15	facade	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010, P011, P012, P013	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2309159900/P010, réf. labo.: 23EK073017-010 MA2309159900/P011, réf. labo.: 23EK073017-011 MA2309159900/P012, réf. labo.: 23EK073017-012 MA2309159900/P013, réf. labo.: 23EK073017-013 Description: Peinture sur béton Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Peinture sur béton Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P010, P011, P012, P013	Idem photo : P010; P012; P011; P013

	Discontinue	16	facade	Oui Cage 8 rez de chaussée - Avent arrière : facade	Identifiant: ZPSO004 Echantillon: MA2309159900/P010, réf. labo.: 23EK073017-010 MA2309159900/P011, réf. labo.: 23EK073017-011 MA2309159900/P012, réf. labo.: 23EK073017-012 MA2309159900/P013, réf. labo.: 23EK073017-013 Description: Peinture sur béton Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Peinture sur béton Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P013 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO005 : Peinture sur béton

Pièces : Façade avant, Façade gauche, Façade arrière, Façade droite

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade avant		1	facade	Oui Façade avant : facade	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2309159900/P014, réf. labo.: 23EK073017-014 MA2309159900/P015, réf. labo.: 23EK073017-015 MA2309159900/P016, réf. labo.: 23EK073017-016 MA2309159900/P017, réf. labo.: 23EK073017-017 Description: Peinture sur béton Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Peinture sur béton Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P014 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
Façade gauche		2	facade	Oui Façade gauche : facade	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2309159900/P014, réf. labo.: 23EK073017-014 MA2309159900/P015, réf. labo.: 23EK073017-015 MA2309159900/P016, réf. labo.: 23EK073017-016 MA2309159900/P017, réf. labo.: 23EK073017-017 Description: Peinture sur béton Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Peinture sur béton Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P015 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	
Façade arrière		3	facade	Oui Façade arrière : facade	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2309159900/P014, réf. labo.: 23EK073017-014 MA2309159900/P015, réf. labo.: 23EK073017-015 MA2309159900/P016, réf. labo.: 23EK073017-016 MA2309159900/P017, réf. labo.: 23EK073017-017 Description: Peinture sur béton Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Peinture sur béton Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P016 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau (bitumineux) (noir) ; matériau dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	

Façade droite		4	facade	Oui Façade droite : facade	Identifiant: ZPSO005 Echantillon: MA2309159900/P014, réf. labo.: 23EK073017-014 MA2309159900/P015, réf. labo.: 23EK073017-015 MA2309159900/P016, réf. labo.: 23EK073017-016 MA2309159900/P017, réf. labo.: 23EK073017-017 Description: Peinture sur béton Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Peinture sur béton Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P017 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

ZPSO007 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Cage 8 5ème étage, Cage 4 4ème étage, Cage 2 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
loggia	Discontinue	1	facade	Oui Cage 8 5ème étage - loggia : facade	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: MA2309159900/P022, réf. labo.: 23EK073017-022 MA2309159900/P023, réf. labo.: 23EK073017-023 MA2309159900/P024, réf. labo.: 23EK073017-024 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P024 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
	Discontinue	2	facade	Oui Cage 4 4ème étage - loggia : facade	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: MA2309159900/P022, réf. labo.: 23EK073017-022 MA2309159900/P023, réf. labo.: 23EK073017-023 MA2309159900/P024, réf. labo.: 23EK073017-024 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P023 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
	Discontinue	3	facade	Oui Cage 2 1er étage - loggia : facade	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: MA2309159900/P022, réf. labo.: 23EK073017-022 MA2309159900/P023, réf. labo.: 23EK073017-023 MA2309159900/P024, réf. labo.: 23EK073017-024 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P022 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	

autre loggia	Discontinue	4	facade	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022, P023, P024	Identifiant: ZPSO007 Echantillon: MA2309159900/P022, réf. labo.: 23EK073017-022 MA2309159900/P023, réf. labo.: 23EK073017-023 MA2309159900/P024, réf. labo.: 23EK073017-024 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P022, P023, P024	Idem photo : P022; P023; P024

ZPSO008 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Niveau : Cage 8 5ème étage, Cage 4 4ème étage, Cage 2 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
loggia	Discontinue	1	Plafond	Oui Cage 8 5ème étage - loggia : Plafond	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: MA2309159900/P025, réf. labo.: 23EK073017-025 MA2309159900/P026, réf. labo.: 23EK073017-026 MA2309159900/P027, réf. labo.: 23EK073017-027 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P025 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (noir) : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Plafond	Oui Cage 4 4ème étage - loggia : Plafond	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: MA2309159900/P025, réf. labo.: 23EK073017-025 MA2309159900/P026, réf. labo.: 23EK073017-026 MA2309159900/P027, réf. labo.: 23EK073017-027 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P026 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
	Discontinue	3	Plafond	Oui Cage 2 1er étage - loggia : Plafond	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: MA2309159900/P025, réf. labo.: 23EK073017-025 MA2309159900/P026, réf. labo.: 23EK073017-026 MA2309159900/P027, réf. labo.: 23EK073017-027 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P027 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau souple (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	

autre loggia	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P026, P027	Identifiant: ZPSO008 Echantillon: MA2309159900/P025, réf. labo.: 23EK073017-025 MA2309159900/P026, réf. labo.: 23EK073017-026 MA2309159900/P027, réf. labo.: 23EK073017-027 Description: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Composant de la construction: 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie à sonder: Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P025, P026, P027	Idem photo : P025; P026; P027

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO006 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence

Pièces : Façade avant, Façade gauche, Façade arrière, Façade droite

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade avant	Discontinue	1	facade	Oui Façade avant : facade	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: MA2309159900/P018, réf. labo.: 23EK073017-018 MA2309159900/P019, réf. labo.: 23EK073017-019 MA2309159900/P020, réf. labo.: 23EK073017-020 MA2309159900/P021, réf. labo.: 23EK073017-021 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P018 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	

Façade gauche	Discontinue	2	facade	Oui Façade gauche : facade	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: MA2309159900/P018, réf. labo.: 23EK073017-018 MA2309159900/P019, réf. labo.: 23EK073017-019 MA2309159900/P020, réf. labo.: 23EK073017-020 MA2309159900/P021, réf. labo.: 23EK073017-021 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P019 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	
Façade arrière	Discontinue	3	facade	Oui Façade arrière : facade	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: MA2309159900/P018, réf. labo.: 23EK073017-018 MA2309159900/P019, réf. labo.: 23EK073017-019 MA2309159900/P020, réf. labo.: 23EK073017-020 MA2309159900/P021, réf. labo.: 23EK073017-021 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P020 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	
Façade droite	Discontinue	4	facade	Oui Façade droite : facade	Identifiant: ZPSO006 Echantillon: MA2309159900/P018, réf. labo.: 23EK073017-018 MA2309159900/P019, réf. labo.: 23EK073017-019 MA2309159900/P020, réf. labo.: 23EK073017-020 MA2309159900/P021, réf. labo.: 23EK073017-021 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P021 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO009 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence

Niveau : Cage 1 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall		1	Mur A,B,C,D	Oui Cage 1 rez de chaussée - Hall : Mur A,B,C,D	Identifiant: ZPSO009 Réf. échantillon: MA2309159900/P028 Réf. laboratoire: 23EK073017-028 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P028 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO012 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment

Niveau : Cage 1 rez de chaussée, Cage 1 1er étage, Cage 1 2ème étage, Cage 1 3ème étage, Cage 1 4ème étage, Cage 1 5ème étage, Cage 1 6ème étage, Cage 1 7ème étage, Cage 1 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	Mur de refend	Oui Cage 1 rez de chaussée - Cage d'escalier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO012 Echantillon: MA2309159900/P031, réf. labo.: 23EK073017-031 MA2309159900/P032, réf. labo.: 23EK073017-032 MA2309159900/P033, réf. labo.: 23EK073017-033 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P031 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	
Palier	Discontinue	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031, P032, P033	Identifiant: ZPSO012 Echantillon: MA2309159900/P031, réf. labo.: 23EK073017-031 MA2309159900/P032, réf. labo.: 23EK073017-032 MA2309159900/P033, réf. labo.: 23EK073017-033 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P031, P032, P033	Idem photo : P031; P032; P033

Cage d'escalier	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031, P032, P033	Identifiant: ZPSO012 Echantillon: MA2309159900/P031, réf. labo.: 23EK073017-031 MA2309159900/P032, réf. labo.: 23EK073017-032 MA2309159900/P033, réf. labo.: 23EK073017-033 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P031, P032, P033	Idem photo : P031; P032; P033
Palier	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031, P032, P033	Identifiant: ZPSO012 Echantillon: MA2309159900/P031, réf. labo.: 23EK073017-031 MA2309159900/P032, réf. labo.: 23EK073017-032 MA2309159900/P033, réf. labo.: 23EK073017-033 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P031, P032, P033	Idem photo : P031; P032; P033
Cage d'escalier	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031, P032, P033	Identifiant: ZPSO012 Echantillon: MA2309159900/P031, réf. labo.: 23EK073017-031 MA2309159900/P032, réf. labo.: 23EK073017-032 MA2309159900/P033, réf. labo.: 23EK073017-033 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P031, P032, P033	Idem photo : P031; P032; P033

Palier	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031, P032, P033	Identifiant: ZPSO012 Echantillon: MA2309159900/P031, réf. labo.: 23EK073017-031 MA2309159900/P032, réf. labo.: 23EK073017-032 MA2309159900/P033, réf. labo.: 23EK073017-033 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P031, P032, P033	Idem photo : P031; P032; P033
Cage d'escalier	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031, P032, P033	Identifiant: ZPSO012 Echantillon: MA2309159900/P031, réf. labo.: 23EK073017-031 MA2309159900/P032, réf. labo.: 23EK073017-032 MA2309159900/P033, réf. labo.: 23EK073017-033 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P031, P032, P033	Idem photo : P031; P032; P033
Palier	Discontinue	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031, P032, P033	Identifiant: ZPSO012 Echantillon: MA2309159900/P031, réf. labo.: 23EK073017-031 MA2309159900/P032, réf. labo.: 23EK073017-032 MA2309159900/P033, réf. labo.: 23EK073017-033 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P031, P032, P033	Idem photo : P031; P032; P033

Cage d'escalier	Discontinue	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031, P032, P033	Identifiant: ZPSO012 Echantillon: MA2309159900/P031, réf. labo.: 23EK073017-031 MA2309159900/P032, réf. labo.: 23EK073017-032 MA2309159900/P033, réf. labo.: 23EK073017-033 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P031, P032, P033	Idem photo : P031; P032; P033
Palier	Discontinue	10	Mur de refend	Oui Cage 1 5ème étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO012 Echantillon: MA2309159900/P031, réf. labo.: 23EK073017-031 MA2309159900/P032, réf. labo.: 23EK073017-032 MA2309159900/P033, réf. labo.: 23EK073017-033 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P032 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier	Discontinue	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031, P032, P033	Identifiant: ZPSO012 Echantillon: MA2309159900/P031, réf. labo.: 23EK073017-031 MA2309159900/P032, réf. labo.: 23EK073017-032 MA2309159900/P033, réf. labo.: 23EK073017-033 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P031, P032, P033	Idem photo : P031; P032; P033

Palier	Discontinue	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031, P032, P033	Identifiant: ZPSO012 Echantillon: MA2309159900/P031, réf. labo.: 23EK073017-031 MA2309159900/P032, réf. labo.: 23EK073017-032 MA2309159900/P033, réf. labo.: 23EK073017-033 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P031, P032, P033	Idem photo : P031; P032; P033
Cage d'escalier	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031, P032, P033	Identifiant: ZPSO012 Echantillon: MA2309159900/P031, réf. labo.: 23EK073017-031 MA2309159900/P032, réf. labo.: 23EK073017-032 MA2309159900/P033, réf. labo.: 23EK073017-033 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P031, P032, P033	Idem photo : P031; P032; P033
Palier	Discontinue	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031, P032, P033	Identifiant: ZPSO012 Echantillon: MA2309159900/P031, réf. labo.: 23EK073017-031 MA2309159900/P032, réf. labo.: 23EK073017-032 MA2309159900/P033, réf. labo.: 23EK073017-033 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P031, P032, P033	Idem photo : P031; P032; P033

Cage d'escalier	Discontinue	15	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031, P032, P033	Identifiant: ZPSO012 Echantillon: MA2309159900/P031, réf. labo.: 23EK073017-031 MA2309159900/P032, réf. labo.: 23EK073017-032 MA2309159900/P033, réf. labo.: 23EK073017-033 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P031, P032, P033	Idem photo : P031; P032; P033
Palier	Discontinue	16	Mur de refend	Oui Cage 1 8ème étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO012 Echantillon: MA2309159900/P031, réf. labo.: 23EK073017-031 MA2309159900/P032, réf. labo.: 23EK073017-032 MA2309159900/P033, réf. labo.: 23EK073017-033 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P033 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO017 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence

Niveau : Cage 2 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall		1	Mur A,B,C,D	Oui Cage 2 rez de chaussée - Hall : Mur A,B,C,D	Identifiant: ZPSO017 Réf. échantillon: MA2309159900/P044 Réf. laboratoire: 23EK073017-044 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P044 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO020 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment

Niveau : Cage 2 rez de chaussée, Cage 2 1er étage, Cage 2 2ème étage, Cage 2 3ème étage, Cage 2 4ème étage, Cage 2 5ème étage, Cage 2 6ème étage, Cage 2 7ème étage, Cage 2 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P048, P049	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: MA2309159900/P047, réf. labo.: 23EK074490-001 MA2309159900/P048, réf. labo.: 23EK074490-002 MA2309159900/P049, réf. labo.: 23EK074490-003 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P047, P048, P049	Idem photo : P047; P048; P049
Cage d'escalier	Discontinue	2	Mur de refend	Oui Cage 2 rez de chaussée - Cage d'escalier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: MA2309159900/P047, réf. labo.: 23EK074490-001 MA2309159900/P048, réf. labo.: 23EK074490-002 MA2309159900/P049, réf. labo.: 23EK074490-003 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P047 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

Palier	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P048, P049	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: MA2309159900/P047, réf. labo.: 23EK074490-001 MA2309159900/P048, réf. labo.: 23EK074490-002 MA2309159900/P049, réf. labo.: 23EK074490-003 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P047, P048, P049	Idem photo : P047; P048; P049
Cage d'escalier	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P048, P049	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: MA2309159900/P047, réf. labo.: 23EK074490-001 MA2309159900/P048, réf. labo.: 23EK074490-002 MA2309159900/P049, réf. labo.: 23EK074490-003 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P047, P048, P049	Idem photo : P047; P048; P049
Palier	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P048, P049	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: MA2309159900/P047, réf. labo.: 23EK074490-001 MA2309159900/P048, réf. labo.: 23EK074490-002 MA2309159900/P049, réf. labo.: 23EK074490-003 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P047, P048, P049	Idem photo : P047; P048; P049

Cage d'escalier	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P048, P049	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: MA2309159900/P047, réf. labo.: 23EK074490-001 MA2309159900/P048, réf. labo.: 23EK074490-002 MA2309159900/P049, réf. labo.: 23EK074490-003 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P047, P048, P049	Idem photo : P047; P048; P049
Palier	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P048, P049	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: MA2309159900/P047, réf. labo.: 23EK074490-001 MA2309159900/P048, réf. labo.: 23EK074490-002 MA2309159900/P049, réf. labo.: 23EK074490-003 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P047, P048, P049	Idem photo : P047; P048; P049
Cage d'escalier	Discontinue	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P048, P049	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: MA2309159900/P047, réf. labo.: 23EK074490-001 MA2309159900/P048, réf. labo.: 23EK074490-002 MA2309159900/P049, réf. labo.: 23EK074490-003 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P047, P048, P049	Idem photo : P047; P048; P049

Palier	Discontinue	9	Mur de refend	Oui Cage 2 4ème étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: MA2309159900/P047, réf. labo.: 23EK074490-001 MA2309159900/P048, réf. labo.: 23EK074490-002 MA2309159900/P049, réf. labo.: 23EK074490-003 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P048 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier	Discontinue	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P048, P049	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: MA2309159900/P047, réf. labo.: 23EK074490-001 MA2309159900/P048, réf. labo.: 23EK074490-002 MA2309159900/P049, réf. labo.: 23EK074490-003 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P047, P048, P049	Idem photo : P047; P048; P049
Palier	Discontinue	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P048, P049	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: MA2309159900/P047, réf. labo.: 23EK074490-001 MA2309159900/P048, réf. labo.: 23EK074490-002 MA2309159900/P049, réf. labo.: 23EK074490-003 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P047, P048, P049	Idem photo : P047; P048; P049

Cage d'escalier	Discontinue	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P048, P049	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: MA2309159900/P047, réf. labo.: 23EK074490-001 MA2309159900/P048, réf. labo.: 23EK074490-002 MA2309159900/P049, réf. labo.: 23EK074490-003 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P047, P048, P049	Idem photo : P047; P048; P049
Palier	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P048, P049	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: MA2309159900/P047, réf. labo.: 23EK074490-001 MA2309159900/P048, réf. labo.: 23EK074490-002 MA2309159900/P049, réf. labo.: 23EK074490-003 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P047, P048, P049	Idem photo : P047; P048; P049
Cage d'escalier	Discontinue	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P048, P049	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: MA2309159900/P047, réf. labo.: 23EK074490-001 MA2309159900/P048, réf. labo.: 23EK074490-002 MA2309159900/P049, réf. labo.: 23EK074490-003 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P047, P048, P049	Idem photo : P047; P048; P049

Palier	Discontinue	15	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P048, P049	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: MA2309159900/P047, réf. labo.: 23EK074490-001 MA2309159900/P048, réf. labo.: 23EK074490-002 MA2309159900/P049, réf. labo.: 23EK074490-003 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P047, P048, P049	Idem photo : P047; P048; P049
Cage d'escalier	Discontinue	16	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047, P048, P049	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: MA2309159900/P047, réf. labo.: 23EK074490-001 MA2309159900/P048, réf. labo.: 23EK074490-002 MA2309159900/P049, réf. labo.: 23EK074490-003 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P047, P048, P049	Idem photo : P047; P048; P049
Palier	Discontinue	17	Mur de refend	Oui Cage 2 8ème étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO020 Echantillon: MA2309159900/P047, réf. labo.: 23EK074490-001 MA2309159900/P048, réf. labo.: 23EK074490-002 MA2309159900/P049, réf. labo.: 23EK074490-003 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P049 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO025 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence

Niveau : Cage 3 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall		1	Mur A,B,C,D	Oui Cage 3 rez de chaussée - Hall : Mur A,B,C,D	Identifiant: ZPSO025 Réf. échantillon: MA2309159900/P060 Réf. laboratoire: 23EK074490-014 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P060 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

ZPSO028 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment

Niveau : Cage 3 rez de chaussée, Cage 3 1er étage, Cage 3 2ème étage, Cage 3 3ème étage, Cage 3 4ème étage, Cage 3 5ème étage, Cage 3 6ème étage, Cage 3 7ème étage, Cage 3 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064, P065	Identifiant: ZPSO028 Echantillon: MA2309159900/P063, réf. labo.: 23EK074490-017 MA2309159900/P064, réf. labo.: 23EK074490-018 MA2309159900/P065, réf. labo.: 23EK074490-019 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P063, P064, P065	Idem photo : P063; P064; P065
Palier	Discontinue	2	Mur de refend	Oui Cage 3 1er étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO028 Echantillon: MA2309159900/P063, réf. labo.: 23EK074490-017 MA2309159900/P064, réf. labo.: 23EK074490-018 MA2309159900/P065, réf. labo.: 23EK074490-019 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P063 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	

Cage d'escalier	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064, P065	Identifiant: ZPSO028 Echantillon: MA2309159900/P063, réf. labo.: 23EK074490-017 MA2309159900/P064, réf. labo.: 23EK074490-018 MA2309159900/P065, réf. labo.: 23EK074490-019 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P063, P064, P065	Idem photo : P063; P064; P065
Palier	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064, P065	Identifiant: ZPSO028 Echantillon: MA2309159900/P063, réf. labo.: 23EK074490-017 MA2309159900/P064, réf. labo.: 23EK074490-018 MA2309159900/P065, réf. labo.: 23EK074490-019 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P063, P064, P065	Idem photo : P063; P064; P065
Cage d'escalier	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064, P065	Identifiant: ZPSO028 Echantillon: MA2309159900/P063, réf. labo.: 23EK074490-017 MA2309159900/P064, réf. labo.: 23EK074490-018 MA2309159900/P065, réf. labo.: 23EK074490-019 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P063, P064, P065	Idem photo : P063; P064; P065

Palier	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064, P065	Identifiant: ZPSO028 Echantillon: MA2309159900/P063, réf. labo.: 23EK074490-017 MA2309159900/P064, réf. labo.: 23EK074490-018 MA2309159900/P065, réf. labo.: 23EK074490-019 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P063, P064, P065	Idem photo : P063; P064; P065
Cage d'escalier	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064, P065	Identifiant: ZPSO028 Echantillon: MA2309159900/P063, réf. labo.: 23EK074490-017 MA2309159900/P064, réf. labo.: 23EK074490-018 MA2309159900/P065, réf. labo.: 23EK074490-019 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P063, P064, P065	Idem photo : P063; P064; P065
Palier	Discontinue	8	Mur de refend	Oui Cage 3 4ème étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO028 Echantillon: MA2309159900/P063, réf. labo.: 23EK074490-017 MA2309159900/P064, réf. labo.: 23EK074490-018 MA2309159900/P065, réf. labo.: 23EK074490-019 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P064 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	

Cage d'escalier	Discontinue	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064, P065	Identifiant: ZPSO028 Echantillon: MA2309159900/P063, réf. labo.: 23EK074490-017 MA2309159900/P064, réf. labo.: 23EK074490-018 MA2309159900/P065, réf. labo.: 23EK074490-019 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P063, P064, P065	Idem photo : P063; P064; P065
Palier	Discontinue	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064, P065	Identifiant: ZPSO028 Echantillon: MA2309159900/P063, réf. labo.: 23EK074490-017 MA2309159900/P064, réf. labo.: 23EK074490-018 MA2309159900/P065, réf. labo.: 23EK074490-019 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P063, P064, P065	Idem photo : P063; P064; P065
Cage d'escalier	Discontinue	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064, P065	Identifiant: ZPSO028 Echantillon: MA2309159900/P063, réf. labo.: 23EK074490-017 MA2309159900/P064, réf. labo.: 23EK074490-018 MA2309159900/P065, réf. labo.: 23EK074490-019 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P063, P064, P065	Idem photo : P063; P064; P065

Palier	Discontinue	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064, P065	Identifiant: ZPSO028 Echantillon: MA2309159900/P063, réf. labo.: 23EK074490-017 MA2309159900/P064, réf. labo.: 23EK074490-018 MA2309159900/P065, réf. labo.: 23EK074490-019 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P063, P064, P065	Idem photo : P063; P064; P065
Cage d'escalier	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064, P065	Identifiant: ZPSO028 Echantillon: MA2309159900/P063, réf. labo.: 23EK074490-017 MA2309159900/P064, réf. labo.: 23EK074490-018 MA2309159900/P065, réf. labo.: 23EK074490-019 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P063, P064, P065	Idem photo : P063; P064; P065
Palier	Discontinue	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064, P065	Identifiant: ZPSO028 Echantillon: MA2309159900/P063, réf. labo.: 23EK074490-017 MA2309159900/P064, réf. labo.: 23EK074490-018 MA2309159900/P065, réf. labo.: 23EK074490-019 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P063, P064, P065	Idem photo : P063; P064; P065

Cage d'escalier	Discontinue	15	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P063, P064, P065	Identifiant: ZPSO028 Echantillon: MA2309159900/P063, réf. labo.: 23EK074490-017 MA2309159900/P064, réf. labo.: 23EK074490-018 MA2309159900/P065, réf. labo.: 23EK074490-019 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P063, P064, P065	Idem photo : P063; P064; P065
Palier	Discontinue	16	Mur de refend	Oui Cage 3 8ème étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO028 Echantillon: MA2309159900/P063, réf. labo.: 23EK074490-017 MA2309159900/P064, réf. labo.: 23EK074490-018 MA2309159900/P065, réf. labo.: 23EK074490-019 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P065 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO033 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence

Niveau : Cage 4 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Mur A,B,C,D	Oui Cage 4 rez de chaussée - Hall : Mur de refend	Identifiant: ZPSO033 Réf. échantillon: MA2309159900/P076 Réf. laboratoire: 23EK074898-001 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P076 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO036 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment

Niveau : Cage 4 rez de chaussée, Cage 4 1er étage, Cage 4 2ème étage, Cage 4 3ème étage, Cage 4 4ème étage, Cage 4 5ème étage, Cage 4 6ème étage, Cage 4 7ème étage, Cage 4 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P079, P080, P081	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2309159900/P079, réf. labo.: 23EK074898-004 MA2309159900/P080, réf. labo.: 23EK074898-005 MA2309159900/P081, réf. labo.: 23EK074898-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P079, P080, P081	Idem photo : P079; P080; P081
Cage d'escalier	Discontinue	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P079, P080, P081	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2309159900/P079, réf. labo.: 23EK074898-004 MA2309159900/P080, réf. labo.: 23EK074898-005 MA2309159900/P081, réf. labo.: 23EK074898-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P079, P080, P081	Idem photo : P079; P080; P081

Palier	Discontinue	3	Mur de refend	Oui Cage 4 1er étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2309159900/P079, réf. labo.: 23EK074898-004 MA2309159900/P080, réf. labo.: 23EK074898-005 MA2309159900/P081, réf. labo.: 23EK074898-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P079 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P079, P080, P081	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2309159900/P079, réf. labo.: 23EK074898-004 MA2309159900/P080, réf. labo.: 23EK074898-005 MA2309159900/P081, réf. labo.: 23EK074898-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P079, P080, P081	Idem photo : P079; P080; P081
Palier	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P079, P080, P081	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2309159900/P079, réf. labo.: 23EK074898-004 MA2309159900/P080, réf. labo.: 23EK074898-005 MA2309159900/P081, réf. labo.: 23EK074898-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P079, P080, P081	Idem photo : P079; P080; P081

Cage d'escalier	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P079, P080, P081	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2309159900/P079, réf. labo.: 23EK074898-004 MA2309159900/P080, réf. labo.: 23EK074898-005 MA2309159900/P081, réf. labo.: 23EK074898-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P079, P080, P081	Idem photo : P079; P080; P081
Palier	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P079, P080, P081	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2309159900/P079, réf. labo.: 23EK074898-004 MA2309159900/P080, réf. labo.: 23EK074898-005 MA2309159900/P081, réf. labo.: 23EK074898-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P079, P080, P081	Idem photo : P079; P080; P081
Cage d'escalier	Discontinue	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P079, P080, P081	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2309159900/P079, réf. labo.: 23EK074898-004 MA2309159900/P080, réf. labo.: 23EK074898-005 MA2309159900/P081, réf. labo.: 23EK074898-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P079, P080, P081	Idem photo : P079; P080; P081

Palier	Discontinue	9	Mur de refend	Oui Cage 4 4ème étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2309159900/P079, réf. labo.: 23EK074898-004 MA2309159900/P080, réf. labo.: 23EK074898-005 MA2309159900/P081, réf. labo.: 23EK074898-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P080 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier	Discontinue	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P079, P080, P081	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2309159900/P079, réf. labo.: 23EK074898-004 MA2309159900/P080, réf. labo.: 23EK074898-005 MA2309159900/P081, réf. labo.: 23EK074898-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P079, P080, P081	Idem photo : P079; P080; P081
Palier	Discontinue	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P079, P080, P081	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2309159900/P079, réf. labo.: 23EK074898-004 MA2309159900/P080, réf. labo.: 23EK074898-005 MA2309159900/P081, réf. labo.: 23EK074898-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P079, P080, P081	Idem photo : P079; P080; P081

Cage d'escalier	Discontinue	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P079, P080, P081	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2309159900/P079, réf. labo.: 23EK074898-004 MA2309159900/P080, réf. labo.: 23EK074898-005 MA2309159900/P081, réf. labo.: 23EK074898-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P079, P080, P081	Idem photo : P079; P080; P081
Palier	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P079, P080, P081	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2309159900/P079, réf. labo.: 23EK074898-004 MA2309159900/P080, réf. labo.: 23EK074898-005 MA2309159900/P081, réf. labo.: 23EK074898-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P079, P080, P081	Idem photo : P079; P080; P081
Cage d'escalier	Discontinue	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P079, P080, P081	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2309159900/P079, réf. labo.: 23EK074898-004 MA2309159900/P080, réf. labo.: 23EK074898-005 MA2309159900/P081, réf. labo.: 23EK074898-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P079, P080, P081	Idem photo : P079; P080; P081

Palier	Discontinue	15	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P079, P080, P081	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2309159900/P079, réf. labo.: 23EK074898-004 MA2309159900/P080, réf. labo.: 23EK074898-005 MA2309159900/P081, réf. labo.: 23EK074898-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P079, P080, P081	Idem photo : P079; P080; P081
Cage d'escalier	Discontinue	16	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P079, P080, P081	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2309159900/P079, réf. labo.: 23EK074898-004 MA2309159900/P080, réf. labo.: 23EK074898-005 MA2309159900/P081, réf. labo.: 23EK074898-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P079, P080, P081	Idem photo : P079; P080; P081
Palier	Discontinue	17	Mur de refend	Oui Cage 4 8ème étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO036 Echantillon: MA2309159900/P079, réf. labo.: 23EK074898-004 MA2309159900/P080, réf. labo.: 23EK074898-005 MA2309159900/P081, réf. labo.: 23EK074898-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P081 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO042 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence

Niveau : Cage 5 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Plafond	Oui Cage 5 rez de chaussée - Hall : Plafond	Identifiant: ZPSO042 Réf. échantillon: MA2309159900/P093 Réf. laboratoire: 23EK074898-018 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau semi-dur (granulaire) (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO044 : Couche1:Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage

Niveau : Cage 5 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Discontinue	1	Sol	Oui Cage 5 rez de chaussée - Cage d'escalier : Sol	Identifiant: ZPSO044 Réf. échantillon: MA2309159900/P095 Réf. laboratoire: 23EK074898-020 Description: Couche1:Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P095 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur (beige) ; matériau dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO045 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment

Niveau : Cage 5 rez de chaussée, Cage 5 1er étage, Cage 5 2ème étage, Cage 5 3ème étage, Cage 5 4ème étage, Cage 5 5ème étage, Cage 5 6ème étage, Cage 5 7ème étage, Cage 5 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P096, P097, P098	Identifiant: ZPSO045 Echantillon: MA2309159900/P096, réf. labo.: 23EK074898-021 MA2309159900/P097, réf. labo.: 23EK074898-022 MA2309159900/P098, réf. labo.: 23EK074898-023 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P096, P097, P098	Idem photo : P096; P097; P098
Palier	Discontinue	2	Mur de refend	Oui Cage 5 1er étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO045 Echantillon: MA2309159900/P096, réf. labo.: 23EK074898-021 MA2309159900/P097, réf. labo.: 23EK074898-022 MA2309159900/P098, réf. labo.: 23EK074898-023 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P096 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

Cage d'escalier	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P096, P097, P098	Identifiant: ZPSO045 Echantillon: MA2309159900/P096, réf. labo.: 23EK074898-021 MA2309159900/P097, réf. labo.: 23EK074898-022 MA2309159900/P098, réf. labo.: 23EK074898-023 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P096, P097, P098	Idem photo : P096; P097; P098
Palier	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P096, P097, P098	Identifiant: ZPSO045 Echantillon: MA2309159900/P096, réf. labo.: 23EK074898-021 MA2309159900/P097, réf. labo.: 23EK074898-022 MA2309159900/P098, réf. labo.: 23EK074898-023 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P096, P097, P098	Idem photo : P096; P097; P098
Cage d'escalier	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P096, P097, P098	Identifiant: ZPSO045 Echantillon: MA2309159900/P096, réf. labo.: 23EK074898-021 MA2309159900/P097, réf. labo.: 23EK074898-022 MA2309159900/P098, réf. labo.: 23EK074898-023 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P096, P097, P098	Idem photo : P096; P097; P098

Palier	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P096, P097, P098	Identifiant: ZPSO045 Echantillon: MA2309159900/P096, réf. labo.: 23EK074898-021 MA2309159900/P097, réf. labo.: 23EK074898-022 MA2309159900/P098, réf. labo.: 23EK074898-023 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P096, P097, P098	Idem photo : P096; P097; P098
Cage d'escalier	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P096, P097, P098	Identifiant: ZPSO045 Echantillon: MA2309159900/P096, réf. labo.: 23EK074898-021 MA2309159900/P097, réf. labo.: 23EK074898-022 MA2309159900/P098, réf. labo.: 23EK074898-023 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P096, P097, P098	Idem photo : P096; P097; P098
Palier	Discontinue	8	Mur de refend	Oui Cage 5 4ème étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO045 Echantillon: MA2309159900/P096, réf. labo.: 23EK074898-021 MA2309159900/P097, réf. labo.: 23EK074898-022 MA2309159900/P098, réf. labo.: 23EK074898-023 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P097 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

Cage d'escalier	Discontinue	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P096, P097, P098	Identifiant: ZPSO045 Echantillon: MA2309159900/P096, réf. labo.: 23EK074898-021 MA2309159900/P097, réf. labo.: 23EK074898-022 MA2309159900/P098, réf. labo.: 23EK074898-023 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P096, P097, P098	Idem photo : P096; P097; P098
Palier	Discontinue	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P096, P097, P098	Identifiant: ZPSO045 Echantillon: MA2309159900/P096, réf. labo.: 23EK074898-021 MA2309159900/P097, réf. labo.: 23EK074898-022 MA2309159900/P098, réf. labo.: 23EK074898-023 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P096, P097, P098	Idem photo : P096; P097; P098
Cage d'escalier	Discontinue	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P096, P097, P098	Identifiant: ZPSO045 Echantillon: MA2309159900/P096, réf. labo.: 23EK074898-021 MA2309159900/P097, réf. labo.: 23EK074898-022 MA2309159900/P098, réf. labo.: 23EK074898-023 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P096, P097, P098	Idem photo : P096; P097; P098

Palier	Discontinue	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P096, P097, P098	Identifiant: ZPSO045 Echantillon: MA2309159900/P096, réf. labo.: 23EK074898-021 MA2309159900/P097, réf. labo.: 23EK074898-022 MA2309159900/P098, réf. labo.: 23EK074898-023 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P096, P097, P098	Idem photo : P096; P097; P098
Cage d'escalier	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P096, P097, P098	Identifiant: ZPSO045 Echantillon: MA2309159900/P096, réf. labo.: 23EK074898-021 MA2309159900/P097, réf. labo.: 23EK074898-022 MA2309159900/P098, réf. labo.: 23EK074898-023 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P096, P097, P098	Idem photo : P096; P097; P098
Palier	Discontinue	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P096, P097, P098	Identifiant: ZPSO045 Echantillon: MA2309159900/P096, réf. labo.: 23EK074898-021 MA2309159900/P097, réf. labo.: 23EK074898-022 MA2309159900/P098, réf. labo.: 23EK074898-023 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P096, P097, P098	Idem photo : P096; P097; P098

Cage d'escalier	Discontinue	15	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P096, P097, P098	Identifiant: ZPSO045 Echantillon: MA2309159900/P096, réf. labo.: 23EK074898-021 MA2309159900/P097, réf. labo.: 23EK074898-022 MA2309159900/P098, réf. labo.: 23EK074898-023 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P096, P097, P098	Idem photo : P096; P097; P098
Palier	Discontinue	16	Mur de refend	Oui Cage 5 8ème étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO045 Echantillon: MA2309159900/P096, réf. labo.: 23EK074898-021 MA2309159900/P097, réf. labo.: 23EK074898-022 MA2309159900/P098, réf. labo.: 23EK074898-023 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P098 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	

ZPSO050 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence

Niveau : Cage 6 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Mur A,B,C,D	Oui Cage 6 rez de chaussée - Hall : Mur A,B,C,D	Identifiant: ZPSO050 Réf. échantillon: MA2309159900/P109 Réf. laboratoire: 23EK074898-034 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P109 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO053 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment

Niveau : Cage 6 rez de chaussée, Cage 6 1er étage, Cage 6 2ème étage, Cage 6 3ème étage, Cage 6 4ème étage, Cage 6 5ème étage, Cage 6 6ème étage, Cage 6 7ème étage, Cage 6 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P113, P114	Identifiant: ZPSO053 Echantillon: MA2309159900/P112, réf. labo.: 23EK074898-037 MA2309159900/P113, réf. labo.: 23EK074898-038 MA2309159900/P114, réf. labo.: 23EK074898-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P112, P113, P114	Idem photo : P112; P113; P114
Palier	Discontinue	2	Mur de refend	Oui Cage 6 1er étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO053 Echantillon: MA2309159900/P112, réf. labo.: 23EK074898-037 MA2309159900/P113, réf. labo.: 23EK074898-038 MA2309159900/P114, réf. labo.: 23EK074898-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P112 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

Cage d'escalier	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P113, P114	Identifiant: ZPSO053 Echantillon: MA2309159900/P112, réf. labo.: 23EK074898-037 MA2309159900/P113, réf. labo.: 23EK074898-038 MA2309159900/P114, réf. labo.: 23EK074898-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P112, P113, P114	Idem photo : P112; P113; P114
Palier	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P113, P114	Identifiant: ZPSO053 Echantillon: MA2309159900/P112, réf. labo.: 23EK074898-037 MA2309159900/P113, réf. labo.: 23EK074898-038 MA2309159900/P114, réf. labo.: 23EK074898-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P112, P113, P114	Idem photo : P112; P113; P114
Cage d'escalier	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P113, P114	Identifiant: ZPSO053 Echantillon: MA2309159900/P112, réf. labo.: 23EK074898-037 MA2309159900/P113, réf. labo.: 23EK074898-038 MA2309159900/P114, réf. labo.: 23EK074898-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P112, P113, P114	Idem photo : P112; P113; P114

Palier	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P113, P114	Identifiant: ZPSO053 Echantillon: MA2309159900/P112, réf. labo.: 23EK074898-037 MA2309159900/P113, réf. labo.: 23EK074898-038 MA2309159900/P114, réf. labo.: 23EK074898-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P112, P113, P114	Idem photo : P112; P113; P114
Cage d'escalier	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P113, P114	Identifiant: ZPSO053 Echantillon: MA2309159900/P112, réf. labo.: 23EK074898-037 MA2309159900/P113, réf. labo.: 23EK074898-038 MA2309159900/P114, réf. labo.: 23EK074898-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P112, P113, P114	Idem photo : P112; P113; P114
Palier	Discontinue	8	Mur de refend	Oui Cage 6 4ème étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO053 Echantillon: MA2309159900/P112, réf. labo.: 23EK074898-037 MA2309159900/P113, réf. labo.: 23EK074898-038 MA2309159900/P114, réf. labo.: 23EK074898-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P113 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

Cage d'escalier	Discontinue	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P113, P114	Identifiant: ZPSO053 Echantillon: MA2309159900/P112, réf. labo.: 23EK074898-037 MA2309159900/P113, réf. labo.: 23EK074898-038 MA2309159900/P114, réf. labo.: 23EK074898-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P112, P113, P114	Idem photo : P112; P113; P114
Palier	Discontinue	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P113, P114	Identifiant: ZPSO053 Echantillon: MA2309159900/P112, réf. labo.: 23EK074898-037 MA2309159900/P113, réf. labo.: 23EK074898-038 MA2309159900/P114, réf. labo.: 23EK074898-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P112, P113, P114	Idem photo : P112; P113; P114
Cage d'escalier	Discontinue	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P113, P114	Identifiant: ZPSO053 Echantillon: MA2309159900/P112, réf. labo.: 23EK074898-037 MA2309159900/P113, réf. labo.: 23EK074898-038 MA2309159900/P114, réf. labo.: 23EK074898-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P112, P113, P114	Idem photo : P112; P113; P114

Palier	Discontinue	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P113, P114	Identifiant: ZPSO053 Echantillon: MA2309159900/P112, réf. labo.: 23EK074898-037 MA2309159900/P113, réf. labo.: 23EK074898-038 MA2309159900/P114, réf. labo.: 23EK074898-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P112, P113, P114	Idem photo : P112; P113; P114
Cage d'escalier	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P113, P114	Identifiant: ZPSO053 Echantillon: MA2309159900/P112, réf. labo.: 23EK074898-037 MA2309159900/P113, réf. labo.: 23EK074898-038 MA2309159900/P114, réf. labo.: 23EK074898-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P112, P113, P114	Idem photo : P112; P113; P114
Palier	Discontinue	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P113, P114	Identifiant: ZPSO053 Echantillon: MA2309159900/P112, réf. labo.: 23EK074898-037 MA2309159900/P113, réf. labo.: 23EK074898-038 MA2309159900/P114, réf. labo.: 23EK074898-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P112, P113, P114	Idem photo : P112; P113; P114

Cage d'escalier	Discontinue	15	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P113, P114	Identifiant: ZPSO053 Echantillon: MA2309159900/P112, réf. labo.: 23EK074898-037 MA2309159900/P113, réf. labo.: 23EK074898-038 MA2309159900/P114, réf. labo.: 23EK074898-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P112, P113, P114	Idem photo : P112; P113; P114
Palier	Discontinue	16	Mur de refend	Oui Cage 6 8ème étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO053 Echantillon: MA2309159900/P112, réf. labo.: 23EK074898-037 MA2309159900/P113, réf. labo.: 23EK074898-038 MA2309159900/P114, réf. labo.: 23EK074898-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P114 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO058 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence

Niveau : Cage 7 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall		1	Mur A,B,C,D	Oui Cage 7 rez de chaussée - Hall : Mur A,B,C,D	Identifiant: ZPSO058 Réf. échantillon: MA2309159900/P125 Réf. laboratoire: 23EK074898-050 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P125 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir) : Absence d'amiante	

ZPSO061 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment

Niveau : Cage 7 rez de chaussée, Cage 7 1er étage, Cage 7 2ème étage, Cage 7 3ème étage, Cage 7 4ème étage, Cage 7 5ème étage, Cage 7 6ème étage, Cage 7 7ème étage, Cage 7 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P128, P129, P130	Identifiant: ZPSO061 Echantillon: MA2309159900/P128, réf. labo.: 23EK074898-053 MA2309159900/P129, réf. labo.: 23EK074898-054 MA2309159900/P130, réf. labo.: 23EK074898-055 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P128, P129, P130	Idem photo : P128; P129; P130
Palier	Discontinue	2	Mur de refend	Oui Cage 7 1er étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO061 Echantillon: MA2309159900/P128, réf. labo.: 23EK074898-053 MA2309159900/P129, réf. labo.: 23EK074898-054 MA2309159900/P130, réf. labo.: 23EK074898-055 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P128 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) : Absence d'amiante	

Cage d'escalier	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P128, P129, P130	Identifiant: ZPSO061 Echantillon: MA2309159900/P128, réf. labo.: 23EK074898-053 MA2309159900/P129, réf. labo.: 23EK074898-054 MA2309159900/P130, réf. labo.: 23EK074898-055 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P128, P129, P130	Idem photo : P128; P129; P130
Palier	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P128, P129, P130	Identifiant: ZPSO061 Echantillon: MA2309159900/P128, réf. labo.: 23EK074898-053 MA2309159900/P129, réf. labo.: 23EK074898-054 MA2309159900/P130, réf. labo.: 23EK074898-055 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P128, P129, P130	Idem photo : P128; P129; P130
Cage d'escalier	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P128, P129, P130	Identifiant: ZPSO061 Echantillon: MA2309159900/P128, réf. labo.: 23EK074898-053 MA2309159900/P129, réf. labo.: 23EK074898-054 MA2309159900/P130, réf. labo.: 23EK074898-055 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P128, P129, P130	Idem photo : P128; P129; P130

Palier	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P128, P129, P130	Identifiant: ZPSO061 Echantillon: MA2309159900/P128, réf. labo.: 23EK074898-053 MA2309159900/P129, réf. labo.: 23EK074898-054 MA2309159900/P130, réf. labo.: 23EK074898-055 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P128, P129, P130	Idem photo : P128; P129; P130
Cage d'escalier	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P128, P129, P130	Identifiant: ZPSO061 Echantillon: MA2309159900/P128, réf. labo.: 23EK074898-053 MA2309159900/P129, réf. labo.: 23EK074898-054 MA2309159900/P130, réf. labo.: 23EK074898-055 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P128, P129, P130	Idem photo : P128; P129; P130
Palier	Discontinue	8	Mur de refend	Oui Cage 7 4ème étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO061 Echantillon: MA2309159900/P128, réf. labo.: 23EK074898-053 MA2309159900/P129, réf. labo.: 23EK074898-054 MA2309159900/P130, réf. labo.: 23EK074898-055 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P129 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

Cage d'escalier	Discontinue	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P128, P129, P130	Identifiant: ZPSO061 Echantillon: MA2309159900/P128, réf. labo.: 23EK074898-053 MA2309159900/P129, réf. labo.: 23EK074898-054 MA2309159900/P130, réf. labo.: 23EK074898-055 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P128, P129, P130	Idem photo : P128; P129; P130
Palier	Discontinue	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P128, P129, P130	Identifiant: ZPSO061 Echantillon: MA2309159900/P128, réf. labo.: 23EK074898-053 MA2309159900/P129, réf. labo.: 23EK074898-054 MA2309159900/P130, réf. labo.: 23EK074898-055 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P128, P129, P130	Idem photo : P128; P129; P130
Cage d'escalier	Discontinue	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P128, P129, P130	Identifiant: ZPSO061 Echantillon: MA2309159900/P128, réf. labo.: 23EK074898-053 MA2309159900/P129, réf. labo.: 23EK074898-054 MA2309159900/P130, réf. labo.: 23EK074898-055 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P128, P129, P130	Idem photo : P128; P129; P130

Palier	Discontinue	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P128, P129, P130	Identifiant: ZPSO061 Echantillon: MA2309159900/P128, réf. labo.: 23EK074898-053 MA2309159900/P129, réf. labo.: 23EK074898-054 MA2309159900/P130, réf. labo.: 23EK074898-055 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P128, P129, P130	Idem photo : P128; P129; P130
Cage d'escalier	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P128, P129, P130	Identifiant: ZPSO061 Echantillon: MA2309159900/P128, réf. labo.: 23EK074898-053 MA2309159900/P129, réf. labo.: 23EK074898-054 MA2309159900/P130, réf. labo.: 23EK074898-055 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P128, P129, P130	Idem photo : P128; P129; P130
Palier	Discontinue	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P128, P129, P130	Identifiant: ZPSO061 Echantillon: MA2309159900/P128, réf. labo.: 23EK074898-053 MA2309159900/P129, réf. labo.: 23EK074898-054 MA2309159900/P130, réf. labo.: 23EK074898-055 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P128, P129, P130	Idem photo : P128; P129; P130

Cage d'escalier	Discontinue	15	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P128, P129, P130	Identifiant: ZPSO061 Echantillon: MA2309159900/P128, réf. labo.: 23EK074898-053 MA2309159900/P129, réf. labo.: 23EK074898-054 MA2309159900/P130, réf. labo.: 23EK074898-055 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P128, P129, P130	Idem photo : P128; P129; P130
Palier	Discontinue	16	Mur de refend	Oui Cage 7 8ème étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO061 Echantillon: MA2309159900/P128, réf. labo.: 23EK074898-053 MA2309159900/P129, réf. labo.: 23EK074898-054 MA2309159900/P130, réf. labo.: 23EK074898-055 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P130 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO066 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence

Niveau : Cage 8 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Mur A,B,C,D	Oui Cage 8 rez de chaussée - Hall : Mur A,B,C,D	Identifiant: ZPSO066 Réf. échantillon: MA2309159900/P141 Réf. laboratoire: 23EK074898-066 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P141 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO069 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment

Niveau : Cage 8 rez de chaussée, Cage 8 1er étage, Cage 8 2ème étage, Cage 8 3ème étage, Cage 8 4ème étage, Cage 8 5ème étage, Cage 8 6ème étage, Cage 8 7ème étage, Cage 8 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P144, P145, P146	Identifiant: ZPSO069 Echantillon: MA2309159900/P144, réf. labo.: 23EK074898-069 MA2309159900/P145, réf. labo.: 23EK074898-070 MA2309159900/P146, réf. labo.: 23EK074898-071 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P144, P145, P146	Idem photo : P144; P145; P146
Palier	Discontinue	2	Mur de refend	Oui Cage 8 1er étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO069 Echantillon: MA2309159900/P144, réf. labo.: 23EK074898-069 MA2309159900/P145, réf. labo.: 23EK074898-070 MA2309159900/P146, réf. labo.: 23EK074898-071 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P144 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

Cage d'escalier	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P144, P145, P146	Identifiant: ZPSO069 Echantillon: MA2309159900/P144, réf. labo.: 23EK074898-069 MA2309159900/P145, réf. labo.: 23EK074898-070 MA2309159900/P146, réf. labo.: 23EK074898-071 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P144, P145, P146	Idem photo : P144; P145; P146
Palier	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P144, P145, P146	Identifiant: ZPSO069 Echantillon: MA2309159900/P144, réf. labo.: 23EK074898-069 MA2309159900/P145, réf. labo.: 23EK074898-070 MA2309159900/P146, réf. labo.: 23EK074898-071 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P144, P145, P146	Idem photo : P144; P145; P146
Cage d'escalier	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P144, P145, P146	Identifiant: ZPSO069 Echantillon: MA2309159900/P144, réf. labo.: 23EK074898-069 MA2309159900/P145, réf. labo.: 23EK074898-070 MA2309159900/P146, réf. labo.: 23EK074898-071 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P144, P145, P146	Idem photo : P144; P145; P146

Palier	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P144, P145, P146	Identifiant: ZPSO069 Echantillon: MA2309159900/P144, réf. labo.: 23EK074898-069 MA2309159900/P145, réf. labo.: 23EK074898-070 MA2309159900/P146, réf. labo.: 23EK074898-071 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P144, P145, P146	Idem photo : P144; P145; P146
Cage d'escalier	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P144, P145, P146	Identifiant: ZPSO069 Echantillon: MA2309159900/P144, réf. labo.: 23EK074898-069 MA2309159900/P145, réf. labo.: 23EK074898-070 MA2309159900/P146, réf. labo.: 23EK074898-071 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P144, P145, P146	Idem photo : P144; P145; P146
Palier	Discontinue	8	Mur de refend	Oui Cage 8 4ème étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO069 Echantillon: MA2309159900/P144, réf. labo.: 23EK074898-069 MA2309159900/P145, réf. labo.: 23EK074898-070 MA2309159900/P146, réf. labo.: 23EK074898-071 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P145 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

Cage d'escalier	Discontinue	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P144, P145, P146	Identifiant: ZPSO069 Echantillon: MA2309159900/P144, réf. labo.: 23EK074898-069 MA2309159900/P145, réf. labo.: 23EK074898-070 MA2309159900/P146, réf. labo.: 23EK074898-071 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P144, P145, P146	Idem photo : P144; P145; P146
Palier	Discontinue	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P144, P145, P146	Identifiant: ZPSO069 Echantillon: MA2309159900/P144, réf. labo.: 23EK074898-069 MA2309159900/P145, réf. labo.: 23EK074898-070 MA2309159900/P146, réf. labo.: 23EK074898-071 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P144, P145, P146	Idem photo : P144; P145; P146
Cage d'escalier	Discontinue	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P144, P145, P146	Identifiant: ZPSO069 Echantillon: MA2309159900/P144, réf. labo.: 23EK074898-069 MA2309159900/P145, réf. labo.: 23EK074898-070 MA2309159900/P146, réf. labo.: 23EK074898-071 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P144, P145, P146	Idem photo : P144; P145; P146

Palier	Discontinue	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P144, P145, P146	Identifiant: ZPSO069 Echantillon: MA2309159900/P144, réf. labo.: 23EK074898-069 MA2309159900/P145, réf. labo.: 23EK074898-070 MA2309159900/P146, réf. labo.: 23EK074898-071 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P144, P145, P146	Idem photo : P144; P145; P146
Cage d'escalier	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P144, P145, P146	Identifiant: ZPSO069 Echantillon: MA2309159900/P144, réf. labo.: 23EK074898-069 MA2309159900/P145, réf. labo.: 23EK074898-070 MA2309159900/P146, réf. labo.: 23EK074898-071 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P144, P145, P146	Idem photo : P144; P145; P146
Palier	Discontinue	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P144, P145, P146	Identifiant: ZPSO069 Echantillon: MA2309159900/P144, réf. labo.: 23EK074898-069 MA2309159900/P145, réf. labo.: 23EK074898-070 MA2309159900/P146, réf. labo.: 23EK074898-071 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P144, P145, P146	Idem photo : P144; P145; P146

Cage d'escalier	Discontinue	15	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P144, P145, P146	Identifiant: ZPSO069 Echantillon: MA2309159900/P144, réf. labo.: 23EK074898-069 MA2309159900/P145, réf. labo.: 23EK074898-070 MA2309159900/P146, réf. labo.: 23EK074898-071 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P144, P145, P146	Idem photo : P144; P145; P146
Palier	Discontinue	16	Mur de refend	Oui Cage 8 8ème étage - Palier : Mur de refend	Identifiant: ZPSO069 Echantillon: MA2309159900/P144, réf. labo.: 23EK074898-069 MA2309159900/P145, réf. labo.: 23EK074898-070 MA2309159900/P146, réf. labo.: 23EK074898-071 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit à base de plâtre + Couche3: Enduit à base de ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P146 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO010 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot

Niveau : Cage 1 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo

Hall		1	Plafond	Oui Cage 1 rez de chaussée - Hall : Plafond	Identifiant: ZPSO010 Réf. échantillon: MA2309159900/P029 Réf. laboratoire: 23EK073017-029 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P029 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

ZPSO013 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre

Niveau : Cage 1 rez de chaussée, Cage 1 1er étage, Cage 1 2ème étage, Cage 1 3ème étage, Cage 1 4ème étage, Cage 1 5ème étage, Cage 1 6ème étage, Cage 1 7ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier		1	Plafond	Oui Cage 1 rez de chaussée - Cage d'escalier : Plafond	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2309159900/P034, réf. labo.: 23EK073017-034 MA2309159900/P035, réf. labo.: 23EK073017-035 MA2309159900/P036, réf. labo.: 23EK073017-036 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P034 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante	
		2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035, P036	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2309159900/P034, réf. labo.: 23EK073017-034 MA2309159900/P035, réf. labo.: 23EK073017-035 MA2309159900/P036, réf. labo.: 23EK073017-036 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P034, P035, P036	Idem photo : P034; P035; P036
		3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035, P036	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2309159900/P034, réf. labo.: 23EK073017-034 MA2309159900/P035, réf. labo.: 23EK073017-035 MA2309159900/P036, réf. labo.: 23EK073017-036 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P034, P035, P036	Idem photo : P034; P035; P036

	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035, P036	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2309159900/P034, réf. labo.: 23EK073017-034 MA2309159900/P035, réf. labo.: 23EK073017-035 MA2309159900/P036, réf. labo.: 23EK073017-036 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P034, P035, P036	Idem photo : P034; P035; P036
	5	Plafond	Oui Cage 1 4ème étage - Cage d'escalier : Plafond	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2309159900/P034, réf. labo.: 23EK073017-034 MA2309159900/P035, réf. labo.: 23EK073017-035 MA2309159900/P036, réf. labo.: 23EK073017-036 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P035 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035, P036	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2309159900/P034, réf. labo.: 23EK073017-034 MA2309159900/P035, réf. labo.: 23EK073017-035 MA2309159900/P036, réf. labo.: 23EK073017-036 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P034, P035, P036	Idem photo : P034; P035; P036
	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035, P036	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2309159900/P034, réf. labo.: 23EK073017-034 MA2309159900/P035, réf. labo.: 23EK073017-035 MA2309159900/P036, réf. labo.: 23EK073017-036 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P034, P035, P036	Idem photo : P034; P035; P036

		8	Plafond	Oui Cage 1 7ème étage - Cage d'escalier : Plafond	Identifiant: ZPSO013 Echantillon: MA2309159900/P034, réf. labo.: 23EK073017-034 MA2309159900/P035, réf. labo.: 23EK073017-035 MA2309159900/P036, réf. labo.: 23EK073017-036 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P036 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO014 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre

Niveau : Cage 1 rez de chaussée, Cage 1 1er étage, Cage 1 2ème étage, Cage 1 3ème étage, Cage 1 4ème étage, Cage 1 5ème étage, Cage 1 6ème étage, Cage 1 7ème étage, Cage 1 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall		1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P037, P038, P039	Identifiant: ZPSO014 Echantillon: MA2309159900/P037, réf. labo.: 23EK073017-037 MA2309159900/P038, réf. labo.: 23EK073017-038 MA2309159900/P039, réf. labo.: 23EK073017-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P037, P038, P039	Idem photo : P037; P038; P039
Palier		2	Plafond	Oui Cage 1 1er étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO014 Echantillon: MA2309159900/P037, réf. labo.: 23EK073017-037 MA2309159900/P038, réf. labo.: 23EK073017-038 MA2309159900/P039, réf. labo.: 23EK073017-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P037 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) : Absence d'amiante	
		3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P037, P038, P039	Identifiant: ZPSO014 Echantillon: MA2309159900/P037, réf. labo.: 23EK073017-037 MA2309159900/P038, réf. labo.: 23EK073017-038 MA2309159900/P039, réf. labo.: 23EK073017-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P037, P038, P039	Idem photo : P037; P038; P039

	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P037, P038, P039	Identifiant: ZPSO014 Echantillon: MA2309159900/P037, réf. labo.: 23EK073017-037 MA2309159900/P038, réf. labo.: 23EK073017-038 MA2309159900/P039, réf. labo.: 23EK073017-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P037, P038, P039	Idem photo : P037; P038; P039
	5	Plafond	Oui Cage 1 4ème étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO014 Echantillon: MA2309159900/P037, réf. labo.: 23EK073017-037 MA2309159900/P038, réf. labo.: 23EK073017-038 MA2309159900/P039, réf. labo.: 23EK073017-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P038 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	
	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P037, P038, P039	Identifiant: ZPSO014 Echantillon: MA2309159900/P037, réf. labo.: 23EK073017-037 MA2309159900/P038, réf. labo.: 23EK073017-038 MA2309159900/P039, réf. labo.: 23EK073017-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P037, P038, P039	Idem photo : P037; P038; P039
	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P037, P038, P039	Identifiant: ZPSO014 Echantillon: MA2309159900/P037, réf. labo.: 23EK073017-037 MA2309159900/P038, réf. labo.: 23EK073017-038 MA2309159900/P039, réf. labo.: 23EK073017-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P037, P038, P039	Idem photo : P037; P038; P039

		8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P037, P038, P039	Identifiant: ZPSO014 Echantillon: MA2309159900/P037, réf. labo.: 23EK073017-037 MA2309159900/P038, réf. labo.: 23EK073017-038 MA2309159900/P039, réf. labo.: 23EK073017-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P037, P038, P039	Idem photo : P037; P038; P039
		9	Plafond	Oui Cage 1 8ème étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO014 Echantillon: MA2309159900/P037, réf. labo.: 23EK073017-037 MA2309159900/P038, réf. labo.: 23EK073017-038 MA2309159900/P039, réf. labo.: 23EK073017-039 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P039 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO018 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot

Niveau : Cage 2 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall		1	Plafond	Oui Cage 2 rez de chaussée - Hall : Plafond	Identifiant: ZPSO018 Réf. échantillon: MA2309159900/P045 Réf. laboratoire: 23EK073017-045 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P045 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO021 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre

Niveau : Cage 2 rez de chaussée, Cage 2 1er étage, Cage 2 2ème étage, Cage 2 3ème étage, Cage 2 4ème étage, Cage 2 5ème étage, Cage 2 6ème étage, Cage 2 7ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier		1	Plafond	Oui Cage 2 rez de chaussée - Cage d'escalier : Plafond	Identifiant: ZPSO021 Echantillon: MA2309159900/P050, réf. labo.: 23EK074490-004 MA2309159900/P051, réf. labo.: 23EK074490-005 MA2309159900/P052, réf. labo.: 23EK074490-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P050 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	
		2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051, P052	Identifiant: ZPSO021 Echantillon: MA2309159900/P050, réf. labo.: 23EK074490-004 MA2309159900/P051, réf. labo.: 23EK074490-005 MA2309159900/P052, réf. labo.: 23EK074490-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P050, P051, P052	Idem photo : P050; P051; P052
		3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051, P052	Identifiant: ZPSO021 Echantillon: MA2309159900/P050, réf. labo.: 23EK074490-004 MA2309159900/P051, réf. labo.: 23EK074490-005 MA2309159900/P052, réf. labo.: 23EK074490-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P050, P051, P052	Idem photo : P050; P051; P052

	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051, P052	Identifiant: ZPSO021 Echantillon: MA2309159900/P050, réf. labo.: 23EK074490-004 MA2309159900/P051, réf. labo.: 23EK074490-005 MA2309159900/P052, réf. labo.: 23EK074490-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P050, P051, P052	Idem photo : P050; P051; P052
	5	Plafond	Oui Cage 2 4ème étage - Cage d'escalier : Plafond	Identifiant: ZPSO021 Echantillon: MA2309159900/P050, réf. labo.: 23EK074490-004 MA2309159900/P051, réf. labo.: 23EK074490-005 MA2309159900/P052, réf. labo.: 23EK074490-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P051 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051, P052	Identifiant: ZPSO021 Echantillon: MA2309159900/P050, réf. labo.: 23EK074490-004 MA2309159900/P051, réf. labo.: 23EK074490-005 MA2309159900/P052, réf. labo.: 23EK074490-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P050, P051, P052	Idem photo : P050; P051; P052
	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051, P052	Identifiant: ZPSO021 Echantillon: MA2309159900/P050, réf. labo.: 23EK074490-004 MA2309159900/P051, réf. labo.: 23EK074490-005 MA2309159900/P052, réf. labo.: 23EK074490-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P050, P051, P052	Idem photo : P050; P051; P052

		8	Plafond	Oui Cage 2 7ème étage - Cage d'escalier : Plafond	Identifiant: ZPSO021 Echantillon: MA2309159900/P050, réf. labo.: 23EK074490-004 MA2309159900/P051, réf. labo.: 23EK074490-005 MA2309159900/P052, réf. labo.: 23EK074490-006 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P052 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO022 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre

Niveau : Cage 2 1er étage, Cage 2 2ème étage, Cage 2 3ème étage, Cage 2 4ème étage, Cage 2 5ème étage, Cage 2 6ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier	Discontinue	1	Plafond	Oui Cage 2 1er étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO022 Echantillon: MA2309159900/P053, réf. labo.: 23EK074490-007 MA2309159900/P054, réf. labo.: 23EK074490-008 MA2309159900/P055, réf. labo.: 23EK074490-009 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P053 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P053, P054, P055	Identifiant: ZPSO022 Echantillon: MA2309159900/P053, réf. labo.: 23EK074490-007 MA2309159900/P054, réf. labo.: 23EK074490-008 MA2309159900/P055, réf. labo.: 23EK074490-009 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P053, P054, P055	Idem photo : P053; P054; P055
	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P053, P054, P055	Identifiant: ZPSO022 Echantillon: MA2309159900/P053, réf. labo.: 23EK074490-007 MA2309159900/P054, réf. labo.: 23EK074490-008 MA2309159900/P055, réf. labo.: 23EK074490-009 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P053, P054, P055	Idem photo : P053; P054; P055

Discontinue	4	Plafond	Oui Cage 2 4ème étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO022 Echantillon: MA2309159900/P053, réf. labo.: 23EK074490-007 MA2309159900/P054, réf. labo.: 23EK074490-008 MA2309159900/P055, réf. labo.: 23EK074490-009 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P054 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	
Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P053, P054, P055	Identifiant: ZPSO022 Echantillon: MA2309159900/P053, réf. labo.: 23EK074490-007 MA2309159900/P054, réf. labo.: 23EK074490-008 MA2309159900/P055, réf. labo.: 23EK074490-009 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P053, P054, P055	Idem photo : P053; P054; P055
Discontinue	6	Plafond	Oui Cage 2 6ème étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO022 Echantillon: MA2309159900/P053, réf. labo.: 23EK074490-007 MA2309159900/P054, réf. labo.: 23EK074490-008 MA2309159900/P055, réf. labo.: 23EK074490-009 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P055 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

ZPSO026 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot

Niveau : Cage 3 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall		1	Plafond	Oui Cage 3 rez de chaussée - Hall : Plafond	Identifiant: ZPSO026 Réf. échantillon: MA2309159900/P061 Réf. laboratoire: 23EK074490-015 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P061 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	

ZPSO029 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre

Niveau : Cage 3 1er étage, Cage 3 2ème étage, Cage 3 3ème étage, Cage 3 4ème étage, Cage 3 5ème étage, Cage 3 6ème étage, Cage 3 7ème étage, Cage 3 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier	Discontinue	1	Plafond	Oui Cage 3 1er étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2309159900/P066, réf. labo.: 23EK074490-020 MA2309159900/P067, réf. labo.: 23EK074490-021 MA2309159900/P068, réf. labo.: 23EK074490-022 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P066 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P066, P067, P068	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2309159900/P066, réf. labo.: 23EK074490-020 MA2309159900/P067, réf. labo.: 23EK074490-021 MA2309159900/P068, réf. labo.: 23EK074490-022 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P066, P067, P068	Idem photo : P066; P067; P068
	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P066, P067, P068	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2309159900/P066, réf. labo.: 23EK074490-020 MA2309159900/P067, réf. labo.: 23EK074490-021 MA2309159900/P068, réf. labo.: 23EK074490-022 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P066, P067, P068	Idem photo : P066; P067; P068

Discontinue	4	Plafond	Oui Cage 3 4ème étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2309159900/P066, réf. labo.: 23EK074490-020 MA2309159900/P067, réf. labo.: 23EK074490-021 MA2309159900/P068, réf. labo.: 23EK074490-022 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P067 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	
Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P066, P067, P068	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2309159900/P066, réf. labo.: 23EK074490-020 MA2309159900/P067, réf. labo.: 23EK074490-021 MA2309159900/P068, réf. labo.: 23EK074490-022 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P066, P067, P068	Idem photo : P066; P067; P068
Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P066, P067, P068	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2309159900/P066, réf. labo.: 23EK074490-020 MA2309159900/P067, réf. labo.: 23EK074490-021 MA2309159900/P068, réf. labo.: 23EK074490-022 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P066, P067, P068	Idem photo : P066; P067; P068
Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P066, P067, P068	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2309159900/P066, réf. labo.: 23EK074490-020 MA2309159900/P067, réf. labo.: 23EK074490-021 MA2309159900/P068, réf. labo.: 23EK074490-022 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P066, P067, P068	Idem photo : P066; P067; P068

	Discontinue	8	Plafond	Oui Cage 3 8ème étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO029 Echantillon: MA2309159900/P066, réf. labo.: 23EK074490-020 MA2309159900/P067, réf. labo.: 23EK074490-021 MA2309159900/P068, réf. labo.: 23EK074490-022 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P068 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO030 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre

Niveau : Cage 3 rez de chaussée, Cage 3 1er étage, Cage 3 2ème étage, Cage 3 3ème étage, Cage 3 4ème étage, Cage 3 5ème étage, Cage 3 6ème étage, Cage 3 7ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	Plafond	Oui Cage 3 rez de chaussée - Cage d'escalier : Sol	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2309159900/P069, réf. labo.: 23EK074490-023 MA2309159900/P070, réf. labo.: 23EK074490-024 MA2309159900/P071, réf. labo.: 23EK074490-025 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P069 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P071	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2309159900/P069, réf. labo.: 23EK074490-023 MA2309159900/P070, réf. labo.: 23EK074490-024 MA2309159900/P071, réf. labo.: 23EK074490-025 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P069, P070, P071	Idem photo : P069; P070; P071
	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P071	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2309159900/P069, réf. labo.: 23EK074490-023 MA2309159900/P070, réf. labo.: 23EK074490-024 MA2309159900/P071, réf. labo.: 23EK074490-025 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P069, P070, P071	Idem photo : P069; P070; P071

Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P071	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2309159900/P069, réf. labo.: 23EK074490-023 MA2309159900/P070, réf. labo.: 23EK074490-024 MA2309159900/P071, réf. labo.: 23EK074490-025 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P069, P070, P071	Idem photo : P069; P070; P071
Discontinue	5	Plafond	Oui Cage 3 4ème étage - Cage d'escalier : Sol	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2309159900/P069, réf. labo.: 23EK074490-023 MA2309159900/P070, réf. labo.: 23EK074490-024 MA2309159900/P071, réf. labo.: 23EK074490-025 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P070 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P071	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2309159900/P069, réf. labo.: 23EK074490-023 MA2309159900/P070, réf. labo.: 23EK074490-024 MA2309159900/P071, réf. labo.: 23EK074490-025 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P069, P070, P071	Idem photo : P069; P070; P071
Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P071	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2309159900/P069, réf. labo.: 23EK074490-023 MA2309159900/P070, réf. labo.: 23EK074490-024 MA2309159900/P071, réf. labo.: 23EK074490-025 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P069, P070, P071	Idem photo : P069; P070; P071

	Discontinue	8	Plafond	Oui Cage 3 7ème étage - Cage d'escalier : Sol	Identifiant: ZPSO030 Echantillon: MA2309159900/P069, réf. labo.: 23EK074490-023 MA2309159900/P070, réf. labo.: 23EK074490-024 MA2309159900/P071, réf. labo.: 23EK074490-025 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P071 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

ZPSO034 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot

Niveau : Cage 4 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Plafond	Oui Cage 4 rez de chaussée - Hall : Plafond	Identifiant: ZPSO034 Réf. échantillon: MA2309159900/P077 Réf. laboratoire: 23EK074898-002 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P077 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

ZPSO037 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre

Niveau : Cage 4 1er étage, Cage 4 2ème étage, Cage 4 3ème étage, Cage 4 4ème étage, Cage 4 5ème étage, Cage 4 6ème étage, Cage 4 7ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P082, P083, P084	Identifiant: ZPSO037 Echantillon: MA2309159900/P082, réf. labo.: 23EK074898-007 MA2309159900/P083, réf. labo.: 23EK074898-008 MA2309159900/P084, réf. labo.: 23EK074898-009 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P082, P083, P084	Idem photo : P083; P084; P082
	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P082, P083, P084	Identifiant: ZPSO037 Echantillon: MA2309159900/P082, réf. labo.: 23EK074898-007 MA2309159900/P083, réf. labo.: 23EK074898-008 MA2309159900/P084, réf. labo.: 23EK074898-009 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P082, P083, P084	Idem photo : P083; P084; P082
	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P082, P083, P084	Identifiant: ZPSO037 Echantillon: MA2309159900/P082, réf. labo.: 23EK074898-007 MA2309159900/P083, réf. labo.: 23EK074898-008 MA2309159900/P084, réf. labo.: 23EK074898-009 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P082, P083, P084	Idem photo : P083; P084; P082

Discontinue	4	Plafond	Oui Cage 4 4ème étage - Cage d'escalier : Plafond	Identifiant: ZPSO037 Echantillon: MA2309159900/P082, réf. labo.: 23EK074898-007 MA2309159900/P083, réf. labo.: 23EK074898-008 MA2309159900/P084, réf. labo.: 23EK074898-009 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P083 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris) : Absence d'amiante	
Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P082, P083, P084	Identifiant: ZPSO037 Echantillon: MA2309159900/P082, réf. labo.: 23EK074898-007 MA2309159900/P083, réf. labo.: 23EK074898-008 MA2309159900/P084, réf. labo.: 23EK074898-009 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P082, P083, P084	Idem photo : P083; P084; P082
Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P082, P083, P084	Identifiant: ZPSO037 Echantillon: MA2309159900/P082, réf. labo.: 23EK074898-007 MA2309159900/P083, réf. labo.: 23EK074898-008 MA2309159900/P084, réf. labo.: 23EK074898-009 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P082, P083, P084	Idem photo : P083; P084; P082
Discontinue	7	Plafond	Oui Cage 4 7ème étage - Cage d'escalier : Plafond	Identifiant: ZPSO037 Echantillon: MA2309159900/P082, réf. labo.: 23EK074898-007 MA2309159900/P083, réf. labo.: 23EK074898-008 MA2309159900/P084, réf. labo.: 23EK074898-009 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P084 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO038 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre

Niveau : Cage 4 1er étage, Cage 4 2ème étage, Cage 4 3ème étage, Cage 4 4ème étage, Cage 4 5ème étage, Cage 4 6ème étage, Cage 4 7ème étage, Cage 4 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier	Discontinue	1	Plafond	Oui Cage 4 1er étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO038 Echantillon: MA2309159900/P085, réf. labo.: 23EK074898-010 MA2309159900/P086, réf. labo.: 23EK074898-011 MA2309159900/P087, réf. labo.: 23EK074898-012 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (gris) : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P085, P086, P087	Identifiant: ZPSO038 Echantillon: MA2309159900/P085, réf. labo.: 23EK074898-010 MA2309159900/P086, réf. labo.: 23EK074898-011 MA2309159900/P087, réf. labo.: 23EK074898-012 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087	Idem photo : P085; P086; P087
	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P085, P086, P087	Identifiant: ZPSO038 Echantillon: MA2309159900/P085, réf. labo.: 23EK074898-010 MA2309159900/P086, réf. labo.: 23EK074898-011 MA2309159900/P087, réf. labo.: 23EK074898-012 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087	Idem photo : P085; P086; P087

Discontinue	4	Plafond	Oui Cage 4 4ème étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO038 Echantillon: MA2309159900/P085, réf. labo.: 23EK074898-010 MA2309159900/P086, réf. labo.: 23EK074898-011 MA2309159900/P087, réf. labo.: 23EK074898-012 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P086 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P085, P086, P087	Identifiant: ZPSO038 Echantillon: MA2309159900/P085, réf. labo.: 23EK074898-010 MA2309159900/P086, réf. labo.: 23EK074898-011 MA2309159900/P087, réf. labo.: 23EK074898-012 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087	Idem photo : P085; P086; P087
Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P085, P086, P087	Identifiant: ZPSO038 Echantillon: MA2309159900/P085, réf. labo.: 23EK074898-010 MA2309159900/P086, réf. labo.: 23EK074898-011 MA2309159900/P087, réf. labo.: 23EK074898-012 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087	Idem photo : P085; P086; P087
Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P085, P086, P087	Identifiant: ZPSO038 Echantillon: MA2309159900/P085, réf. labo.: 23EK074898-010 MA2309159900/P086, réf. labo.: 23EK074898-011 MA2309159900/P087, réf. labo.: 23EK074898-012 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P085, P086, P087	Idem photo : P085; P086; P087

	Discontinue	8	Plafond	Oui Cage 4 8ème étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO038 Echantillon: MA2309159900/P085, réf. labo.: 23EK074898-010 MA2309159900/P086, réf. labo.: 23EK074898-011 MA2309159900/P087, réf. labo.: 23EK074898-012 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P087 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO042 : Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence

Niveau : Cage 5 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Plafond	Oui Cage 5 rez de chaussée - Hall : Plafond	Identifiant: ZPSO042 Réf. échantillon: MA2309159900/P093 Réf. laboratoire: 23EK074898-018 Description: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Couche1: Colle de faïence + Couche2: joint de faïence Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P093 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau semi-dur (granulaire) (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO043 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot

Niveau : Cage 5 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Plafond	Oui Cage 5 rez de chaussée - Hall : Sol	Identifiant: ZPSO043 Réf. échantillon: MA2309159900/P094 Réf. laboratoire: 23EK074898-019 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols + 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P094 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

ZPSO046 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre

Niveau : Cage 5 rez de chaussée, Cage 5 1er étage, Cage 5 2ème étage, Cage 5 3ème étage, Cage 5 4ème étage, Cage 5 5ème étage, Cage 5 6ème étage, Cage 5 7ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	Plafond	Oui Cage 5 rez de chaussée - Cage d'escalier : Plafond	Identifiant: ZPSO046 Echantillon: MA2309159900/P099, réf. labo.: 23EK074898-024 MA2309159900/P100, réf. labo.: 23EK074898-025 MA2309159900/P101, réf. labo.: 23EK074898-026 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P099 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris) : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P099, P100, P101	Identifiant: ZPSO046 Echantillon: MA2309159900/P099, réf. labo.: 23EK074898-024 MA2309159900/P100, réf. labo.: 23EK074898-025 MA2309159900/P101, réf. labo.: 23EK074898-026 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P099, P100, P101	Idem photo : P099; P100; P101
	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P099, P100, P101	Identifiant: ZPSO046 Echantillon: MA2309159900/P099, réf. labo.: 23EK074898-024 MA2309159900/P100, réf. labo.: 23EK074898-025 MA2309159900/P101, réf. labo.: 23EK074898-026 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P099, P100, P101	Idem photo : P099; P100; P101

Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P099, P100, P101	Identifiant: ZPSO046 Echantillon: MA2309159900/P099, réf. labo.: 23EK074898-024 MA2309159900/P100, réf. labo.: 23EK074898-025 MA2309159900/P101, réf. labo.: 23EK074898-026 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P099, P100, P101	Idem photo : P099; P100; P101
Discontinue	5	Plafond	Oui Cage 5 4ème étage - Cage d'escalier : Plafond	Identifiant: ZPSO046 Echantillon: MA2309159900/P099, réf. labo.: 23EK074898-024 MA2309159900/P100, réf. labo.: 23EK074898-025 MA2309159900/P101, réf. labo.: 23EK074898-026 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P100 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	
Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P099, P100, P101	Identifiant: ZPSO046 Echantillon: MA2309159900/P099, réf. labo.: 23EK074898-024 MA2309159900/P100, réf. labo.: 23EK074898-025 MA2309159900/P101, réf. labo.: 23EK074898-026 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P099, P100, P101	Idem photo : P099; P100; P101
Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P099, P100, P101	Identifiant: ZPSO046 Echantillon: MA2309159900/P099, réf. labo.: 23EK074898-024 MA2309159900/P100, réf. labo.: 23EK074898-025 MA2309159900/P101, réf. labo.: 23EK074898-026 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P099, P100, P101	Idem photo : P099; P100; P101

	Discontinue	8	Plafond	Oui Cage 5 7ème étage - Cage d'escalier : Plafond	Identifiant: ZPSO046 Echantillon: MA2309159900/P099, réf. labo.: 23EK074898-024 MA2309159900/P100, réf. labo.: 23EK074898-025 MA2309159900/P101, réf. labo.: 23EK074898-026 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P101 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO047 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre

Niveau : Cage 5 1er étage, Cage 5 2ème étage, Cage 5 3ème étage, Cage 5 4ème étage, Cage 5 5ème étage, Cage 5 6ème étage, Cage 5 7ème étage, Cage 5 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier	Discontinue	1	Plafond	Oui Cage 5 1er étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO047 Echantillon: MA2309159900/P102, réf. labo.: 23EK074898-027 MA2309159900/P103, réf. labo.: 23EK074898-028 MA2309159900/P104, réf. labo.: 23EK074898-029 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P102 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P102, P103, P104	Identifiant: ZPSO047 Echantillon: MA2309159900/P102, réf. labo.: 23EK074898-027 MA2309159900/P103, réf. labo.: 23EK074898-028 MA2309159900/P104, réf. labo.: 23EK074898-029 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P102, P103, P104	Idem photo : P102; P103; P104
	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P102, P103, P104	Identifiant: ZPSO047 Echantillon: MA2309159900/P102, réf. labo.: 23EK074898-027 MA2309159900/P103, réf. labo.: 23EK074898-028 MA2309159900/P104, réf. labo.: 23EK074898-029 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P102, P103, P104	Idem photo : P102; P103; P104

Discontinue	4	Plafond	Oui Cage 5 4ème étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO047 Echantillon: MA2309159900/P102, réf. labo.: 23EK074898-027 MA2309159900/P103, réf. labo.: 23EK074898-028 MA2309159900/P104, réf. labo.: 23EK074898-029 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P103 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	
Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P102, P103, P104	Identifiant: ZPSO047 Echantillon: MA2309159900/P102, réf. labo.: 23EK074898-027 MA2309159900/P103, réf. labo.: 23EK074898-028 MA2309159900/P104, réf. labo.: 23EK074898-029 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P102, P103, P104	Idem photo : P102; P103; P104
Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P102, P103, P104	Identifiant: ZPSO047 Echantillon: MA2309159900/P102, réf. labo.: 23EK074898-027 MA2309159900/P103, réf. labo.: 23EK074898-028 MA2309159900/P104, réf. labo.: 23EK074898-029 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P102, P103, P104	Idem photo : P102; P103; P104
Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P102, P103, P104	Identifiant: ZPSO047 Echantillon: MA2309159900/P102, réf. labo.: 23EK074898-027 MA2309159900/P103, réf. labo.: 23EK074898-028 MA2309159900/P104, réf. labo.: 23EK074898-029 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P102, P103, P104	Idem photo : P102; P103; P104

	Discontinue	8	Plafond	Oui Cage 5 8ème étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO047 Echantillon: MA2309159900/P102, réf. labo.: 23EK074898-027 MA2309159900/P103, réf. labo.: 23EK074898-028 MA2309159900/P104, réf. labo.: 23EK074898-029 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P104 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris) en traces : Absence d'amiante	

ZPSO051 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot

Niveau : Cage 6 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Plafond	Oui Cage 6 rez de chaussée - Hall : Plafond	Identifiant: ZPSO051 Réf. échantillon: MA2309159900/P110 Réf. laboratoire: 23EK074898-035 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P110 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

ZPSO054 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre

Niveau : Cage 6 rez de chaussée, Cage 6 1er étage, Cage 6 2ème étage, Cage 6 3ème étage, Cage 6 4ème étage, Cage 6 5ème étage, Cage 6 6ème étage, Cage 6 7ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	Plafond	Oui Cage 6 rez de chaussée - Cage d'escalier : Plafond	Identifiant: ZPSO054 Echantillon: MA2309159900/P115, réf. labo.: 23EK074898-040 MA2309159900/P116, réf. labo.: 23EK074898-041 MA2309159900/P117, réf. labo.: 23EK074898-042 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P115 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris) en traces : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P115, P116, P117	Identifiant: ZPSO054 Echantillon: MA2309159900/P115, réf. labo.: 23EK074898-040 MA2309159900/P116, réf. labo.: 23EK074898-041 MA2309159900/P117, réf. labo.: 23EK074898-042 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P115, P116, P117	Idem photo : P115; P116; P117
	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P115, P116, P117	Identifiant: ZPSO054 Echantillon: MA2309159900/P115, réf. labo.: 23EK074898-040 MA2309159900/P116, réf. labo.: 23EK074898-041 MA2309159900/P117, réf. labo.: 23EK074898-042 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P115, P116, P117	Idem photo : P115; P116; P117

Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P115, P116, P117	Identifiant: ZPSO054 Echantillon: MA2309159900/P115, réf. labo.: 23EK074898-040 MA2309159900/P116, réf. labo.: 23EK074898-041 MA2309159900/P117, réf. labo.: 23EK074898-042 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P115, P116, P117	Idem photo : P115; P116; P117
Discontinue	5	Plafond	Oui Cage 6 4ème étage - Cage d'escalier : Plafond	Identifiant: ZPSO054 Echantillon: MA2309159900/P115, réf. labo.: 23EK074898-040 MA2309159900/P116, réf. labo.: 23EK074898-041 MA2309159900/P117, réf. labo.: 23EK074898-042 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P116 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P115, P116, P117	Identifiant: ZPSO054 Echantillon: MA2309159900/P115, réf. labo.: 23EK074898-040 MA2309159900/P116, réf. labo.: 23EK074898-041 MA2309159900/P117, réf. labo.: 23EK074898-042 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P115, P116, P117	Idem photo : P115; P116; P117
Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P115, P116, P117	Identifiant: ZPSO054 Echantillon: MA2309159900/P115, réf. labo.: 23EK074898-040 MA2309159900/P116, réf. labo.: 23EK074898-041 MA2309159900/P117, réf. labo.: 23EK074898-042 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P115, P116, P117	Idem photo : P115; P116; P117

	Discontinue	8	Plafond	Oui Cage 6 7ème étage - Cage d'escalier : Plafond	Identifiant: ZPSO054 Echantillon: MA2309159900/P115, réf. labo.: 23EK074898-040 MA2309159900/P116, réf. labo.: 23EK074898-041 MA2309159900/P117, réf. labo.: 23EK074898-042 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P117 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO055 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre

Niveau : Cage 6 1er étage, Cage 6 2ème étage, Cage 6 3ème étage, Cage 6 4ème étage, Cage 6 5ème étage, Cage 6 6ème étage, Cage 6 7ème étage, Cage 6 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier	Discontinue	1	Plafond	Oui Cage 6 1er étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO055 Echantillon: MA2309159900/P118, réf. labo.: 23EK074898-043 MA2309159900/P119, réf. labo.: 23EK074898-044 MA2309159900/P120, réf. labo.: 23EK074898-045 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P118 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P118, P119, P120	Identifiant: ZPSO055 Echantillon: MA2309159900/P118, réf. labo.: 23EK074898-043 MA2309159900/P119, réf. labo.: 23EK074898-044 MA2309159900/P120, réf. labo.: 23EK074898-045 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P118, P119, P120	Idem photo : P118; P119; P120
	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P118, P119, P120	Identifiant: ZPSO055 Echantillon: MA2309159900/P118, réf. labo.: 23EK074898-043 MA2309159900/P119, réf. labo.: 23EK074898-044 MA2309159900/P120, réf. labo.: 23EK074898-045 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P118, P119, P120	Idem photo : P118; P119; P120

Discontinue	4	Plafond	Oui Cage 6 4ème étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO055 Echantillon: MA2309159900/P118, réf. labo.: 23EK074898-043 MA2309159900/P119, réf. labo.: 23EK074898-044 MA2309159900/P120, réf. labo.: 23EK074898-045 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P119 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	
Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P118, P119, P120	Identifiant: ZPSO055 Echantillon: MA2309159900/P118, réf. labo.: 23EK074898-043 MA2309159900/P119, réf. labo.: 23EK074898-044 MA2309159900/P120, réf. labo.: 23EK074898-045 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P118, P119, P120	Idem photo : P118; P119; P120
Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P118, P119, P120	Identifiant: ZPSO055 Echantillon: MA2309159900/P118, réf. labo.: 23EK074898-043 MA2309159900/P119, réf. labo.: 23EK074898-044 MA2309159900/P120, réf. labo.: 23EK074898-045 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P118, P119, P120	Idem photo : P118; P119; P120
Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P118, P119, P120	Identifiant: ZPSO055 Echantillon: MA2309159900/P118, réf. labo.: 23EK074898-043 MA2309159900/P119, réf. labo.: 23EK074898-044 MA2309159900/P120, réf. labo.: 23EK074898-045 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P118, P119, P120	Idem photo : P118; P119; P120

	Discontinue	8	Plafond	Oui Cage 6 8ème étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO055 Echantillon: MA2309159900/P118, réf. labo.: 23EK074898-043 MA2309159900/P119, réf. labo.: 23EK074898-044 MA2309159900/P120, réf. labo.: 23EK074898-045 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P120 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO059 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot

Niveau : Cage 7 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Plafond	Oui Cage 7 rez de chaussée - Hall : Plafond	Identifiant: ZPSO059 Réf. échantillon: MA2309159900/P126 Réf. laboratoire: 23EK074898-051 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P126 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	

ZPSO062 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre

Niveau : Cage 7 rez de chaussée, Cage 7 1er étage, Cage 7 2ème étage, Cage 7 3ème étage, Cage 7 4ème étage, Cage 7 5ème étage, Cage 7 6ème étage, Cage 7 7ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	Plafond	Oui Cage 7 rez de chaussée - Cage d'escalier : Plafond	Identifiant: ZPSO062 Echantillon: MA2309159900/P131, réf. labo.: 23EK074898-056 MA2309159900/P132, réf. labo.: 23EK074898-057 MA2309159900/P133, réf. labo.: 23EK074898-058 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P131 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133	Identifiant: ZPSO062 Echantillon: MA2309159900/P131, réf. labo.: 23EK074898-056 MA2309159900/P132, réf. labo.: 23EK074898-057 MA2309159900/P133, réf. labo.: 23EK074898-058 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P131, P132, P133	Idem photo : P131; P132; P133
	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133	Identifiant: ZPSO062 Echantillon: MA2309159900/P131, réf. labo.: 23EK074898-056 MA2309159900/P132, réf. labo.: 23EK074898-057 MA2309159900/P133, réf. labo.: 23EK074898-058 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P131, P132, P133	Idem photo : P131; P132; P133

Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133	Identifiant: ZPSO062 Echantillon: MA2309159900/P131, réf. labo.: 23EK074898-056 MA2309159900/P132, réf. labo.: 23EK074898-057 MA2309159900/P133, réf. labo.: 23EK074898-058 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P131, P132, P133	Idem photo : P131; P132; P133
Discontinue	5	Plafond	Oui Cage 7 4ème étage - Cage d'escalier : Plafond	Identifiant: ZPSO062 Echantillon: MA2309159900/P131, réf. labo.: 23EK074898-056 MA2309159900/P132, réf. labo.: 23EK074898-057 MA2309159900/P133, réf. labo.: 23EK074898-058 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P132 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante	
Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133	Identifiant: ZPSO062 Echantillon: MA2309159900/P131, réf. labo.: 23EK074898-056 MA2309159900/P132, réf. labo.: 23EK074898-057 MA2309159900/P133, réf. labo.: 23EK074898-058 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P131, P132, P133	Idem photo : P131; P132; P133
Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133	Identifiant: ZPSO062 Echantillon: MA2309159900/P131, réf. labo.: 23EK074898-056 MA2309159900/P132, réf. labo.: 23EK074898-057 MA2309159900/P133, réf. labo.: 23EK074898-058 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P131, P132, P133	Idem photo : P131; P132; P133

	Discontinue	8	Plafond	Oui Cage 7 7ème étage - Cage d'escalier : Plafond	Identifiant: ZPSO062 Echantillon: MA2309159900/P131, réf. labo.: 23EK074898-056 MA2309159900/P132, réf. labo.: 23EK074898-057 MA2309159900/P133, réf. labo.: 23EK074898-058 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P133 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	

ZPSO063 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre

Niveau : Cage 7 1er étage, Cage 7 2ème étage, Cage 7 3ème étage, Cage 7 4ème étage, Cage 7 5ème étage, Cage 7 6ème étage, Cage 7 7ème étage, Cage 7 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier	Discontinue	1	Plafond	Oui Cage 7 1er étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO063 Echantillon: MA2309159900/P134, réf. labo.: 23EK074898-059 MA2309159900/P135, réf. labo.: 23EK074898-060 MA2309159900/P136, réf. labo.: 23EK074898-061 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P134 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P134, P135, P136	Identifiant: ZPSO063 Echantillon: MA2309159900/P134, réf. labo.: 23EK074898-059 MA2309159900/P135, réf. labo.: 23EK074898-060 MA2309159900/P136, réf. labo.: 23EK074898-061 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P134, P135, P136	Idem photo : P134; P135; P136
	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P134, P135, P136	Identifiant: ZPSO063 Echantillon: MA2309159900/P134, réf. labo.: 23EK074898-059 MA2309159900/P135, réf. labo.: 23EK074898-060 MA2309159900/P136, réf. labo.: 23EK074898-061 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P134, P135, P136	Idem photo : P134; P135; P136

Discontinue	4	Plafond	Oui Cage 7 4ème étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO063 Echantillon: MA2309159900/P134, réf. labo.: 23EK074898-059 MA2309159900/P135, réf. labo.: 23EK074898-060 MA2309159900/P136, réf. labo.: 23EK074898-061 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P135 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (gris) : Absence d'amiante	
Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P134, P135, P136	Identifiant: ZPSO063 Echantillon: MA2309159900/P134, réf. labo.: 23EK074898-059 MA2309159900/P135, réf. labo.: 23EK074898-060 MA2309159900/P136, réf. labo.: 23EK074898-061 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P134, P135, P136	Idem photo : P134; P135; P136
Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P134, P135, P136	Identifiant: ZPSO063 Echantillon: MA2309159900/P134, réf. labo.: 23EK074898-059 MA2309159900/P135, réf. labo.: 23EK074898-060 MA2309159900/P136, réf. labo.: 23EK074898-061 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P134, P135, P136	Idem photo : P134; P135; P136
Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P134, P135, P136	Identifiant: ZPSO063 Echantillon: MA2309159900/P134, réf. labo.: 23EK074898-059 MA2309159900/P135, réf. labo.: 23EK074898-060 MA2309159900/P136, réf. labo.: 23EK074898-061 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P134, P135, P136	Idem photo : P134; P135; P136

	Discontinue	8	Plafond	Oui Cage 7 8ème étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO063 Echantillon: MA2309159900/P134, réf. labo.: 23EK074898-059 MA2309159900/P135, réf. labo.: 23EK074898-060 MA2309159900/P136, réf. labo.: 23EK074898-061 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P136 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO067 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot

Niveau : Cage 8 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Plafond	Oui Cage 8 rez de chaussée - Hall : Plafond	Identifiant: ZPSO067 Réf. échantillon: MA2309159900/P142 Réf. laboratoire: 23EK074898-067 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P142 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO070 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre

Niveau : Cage 8 rez de chaussée, Cage 8 1er étage, Cage 8 2ème étage, Cage 8 3ème étage, Cage 8 4ème étage, Cage 8 5ème étage, Cage 8 6ème étage, Cage 8 7ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	Plafond	Oui Cage 8 rez de chaussée - Cage d'escalier : Plafond	Identifiant: ZPSO070 Echantillon: MA2309159900/P147, réf. labo.: 23EK074898-072 MA2309159900/P148, réf. labo.: 23EK074898-073 MA2309159900/P149, réf. labo.: 23EK074898-074 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P147 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P147, P148, P149	Identifiant: ZPSO070 Echantillon: MA2309159900/P147, réf. labo.: 23EK074898-072 MA2309159900/P148, réf. labo.: 23EK074898-073 MA2309159900/P149, réf. labo.: 23EK074898-074 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P147, P148, P149	Idem photo : P147; P148; P149
	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P147, P148, P149	Identifiant: ZPSO070 Echantillon: MA2309159900/P147, réf. labo.: 23EK074898-072 MA2309159900/P148, réf. labo.: 23EK074898-073 MA2309159900/P149, réf. labo.: 23EK074898-074 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P147, P148, P149	Idem photo : P147; P148; P149

Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P147, P148, P149	Identifiant: ZPSO070 Echantillon: MA2309159900/P147, réf. labo.: 23EK074898-072 MA2309159900/P148, réf. labo.: 23EK074898-073 MA2309159900/P149, réf. labo.: 23EK074898-074 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P147, P148, P149	Idem photo : P147; P148; P149
Discontinue	5	Plafond	Oui Cage 8 4ème étage - Cage d'escalier : Plafond	Identifiant: ZPSO070 Echantillon: MA2309159900/P147, réf. labo.: 23EK074898-072 MA2309159900/P148, réf. labo.: 23EK074898-073 MA2309159900/P149, réf. labo.: 23EK074898-074 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P148 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P147, P148, P149	Identifiant: ZPSO070 Echantillon: MA2309159900/P147, réf. labo.: 23EK074898-072 MA2309159900/P148, réf. labo.: 23EK074898-073 MA2309159900/P149, réf. labo.: 23EK074898-074 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P147, P148, P149	Idem photo : P147; P148; P149
Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P147, P148, P149	Identifiant: ZPSO070 Echantillon: MA2309159900/P147, réf. labo.: 23EK074898-072 MA2309159900/P148, réf. labo.: 23EK074898-073 MA2309159900/P149, réf. labo.: 23EK074898-074 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P147, P148, P149	Idem photo : P147; P148; P149

	Discontinue	8	Plafond	Oui Cage 8 7ème étage - Cage d'escalier : Plafond	Identifiant: ZPSO070 Echantillon: MA2309159900/P147, réf. labo.: 23EK074898-072 MA2309159900/P148, réf. labo.: 23EK074898-073 MA2309159900/P149, réf. labo.: 23EK074898-074 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P149 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

ZPSO071 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre

Niveau : Cage 8 1er étage, Cage 8 2ème étage, Cage 8 3ème étage, Cage 8 4ème étage, Cage 8 5ème étage, Cage 8 6ème étage, Cage 8 7ème étage, Cage 8 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Palier		1	Plafond	Oui Cage 8 1er étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO071 Echantillon: MA2309159900/P150, réf. labo.: 23EK074898-075 MA2309159900/P151, réf. labo.: 23EK074898-076 MA2309159900/P152, réf. labo.: 23EK074898-077 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P150 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	
		2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P150, P151, P152	Identifiant: ZPSO071 Echantillon: MA2309159900/P150, réf. labo.: 23EK074898-075 MA2309159900/P151, réf. labo.: 23EK074898-076 MA2309159900/P152, réf. labo.: 23EK074898-077 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P150, P151, P152	Idem photo : P150; P151; P152
		3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P150, P151, P152	Identifiant: ZPSO071 Echantillon: MA2309159900/P150, réf. labo.: 23EK074898-075 MA2309159900/P151, réf. labo.: 23EK074898-076 MA2309159900/P152, réf. labo.: 23EK074898-077 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P150, P151, P152	Idem photo : P150; P151; P152

	4	Plafond	Oui Cage 8 4ème étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO071 Echantillon: MA2309159900/P150, réf. labo.: 23EK074898-075 MA2309159900/P151, réf. labo.: 23EK074898-076 MA2309159900/P152, réf. labo.: 23EK074898-077 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P151 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	
	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P150, P151, P152	Identifiant: ZPSO071 Echantillon: MA2309159900/P150, réf. labo.: 23EK074898-075 MA2309159900/P151, réf. labo.: 23EK074898-076 MA2309159900/P152, réf. labo.: 23EK074898-077 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P150, P151, P152	Idem photo : P150; P151; P152
	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P150, P151, P152	Identifiant: ZPSO071 Echantillon: MA2309159900/P150, réf. labo.: 23EK074898-075 MA2309159900/P151, réf. labo.: 23EK074898-076 MA2309159900/P152, réf. labo.: 23EK074898-077 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P150, P151, P152	Idem photo : P150; P151; P152
	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P150, P151, P152	Identifiant: ZPSO071 Echantillon: MA2309159900/P150, réf. labo.: 23EK074898-075 MA2309159900/P151, réf. labo.: 23EK074898-076 MA2309159900/P152, réf. labo.: 23EK074898-077 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P150, P151, P152	Idem photo : P150; P151; P152

		8	Plafond	Oui Cage 8 8ème étage - Palier : Plafond	Identifiant: ZPSO071 Echantillon: MA2309159900/P150, réf. labo.: 23EK074898-075 MA2309159900/P151, réf. labo.: 23EK074898-076 MA2309159900/P152, réf. labo.: 23EK074898-077 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P152 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO011 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage

Niveau : Cage 1 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall		1	Sol	Oui Cage 1 rez de chaussée - Hall : Sol	Identifiant: ZPSO011 Réf. échantillon: MA2309159900/P030 Réf. laboratoire: 23EK073017-030 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P030 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO015 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage

Niveau : Cage 1 rez de chaussée, Cage 1 1er étage, Cage 1 2ème étage, Cage 1 3ème étage, Cage 1 4ème étage, Cage 1 5ème étage, Cage 1 6ème étage, Cage 1 7ème étage, Cage 1 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier		1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P041, P042	Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2309159900/P040, réf. labo.: 23EK073017-040 MA2309159900/P041, réf. labo.: 23EK073017-041 MA2309159900/P042, réf. labo.: 23EK073017-042 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P040, P041, P042	Idem photo : P040; P041; P042
Palier		2	Sol	Oui Cage 1 1er étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2309159900/P040, réf. labo.: 23EK073017-040 MA2309159900/P041, réf. labo.: 23EK073017-041 MA2309159900/P042, réf. labo.: 23EK073017-042 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P040 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier		3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P041, P042	Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2309159900/P040, réf. labo.: 23EK073017-040 MA2309159900/P041, réf. labo.: 23EK073017-041 MA2309159900/P042, réf. labo.: 23EK073017-042 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P040, P041, P042	Idem photo : P040; P041; P042

Palier		4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P041, P042	Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2309159900/P040, réf. labo.: 23EK073017-040 MA2309159900/P041, réf. labo.: 23EK073017-041 MA2309159900/P042, réf. labo.: 23EK073017-042 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P040, P041, P042	Idem photo : P040; P041; P042
Cage d'escalier		5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P041, P042	Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2309159900/P040, réf. labo.: 23EK073017-040 MA2309159900/P041, réf. labo.: 23EK073017-041 MA2309159900/P042, réf. labo.: 23EK073017-042 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P040, P041, P042	Idem photo : P040; P041; P042
Palier		6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P041, P042	Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2309159900/P040, réf. labo.: 23EK073017-040 MA2309159900/P041, réf. labo.: 23EK073017-041 MA2309159900/P042, réf. labo.: 23EK073017-042 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P040, P041, P042	Idem photo : P040; P041; P042
Cage d'escalier		7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P041, P042	Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2309159900/P040, réf. labo.: 23EK073017-040 MA2309159900/P041, réf. labo.: 23EK073017-041 MA2309159900/P042, réf. labo.: 23EK073017-042 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P040, P041, P042	Idem photo : P040; P041; P042

Palier		8	Sol	Oui Cage 1 4ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2309159900/P040, réf. labo.: 23EK073017-040 MA2309159900/P041, réf. labo.: 23EK073017-041 MA2309159900/P042, réf. labo.: 23EK073017-042 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P041 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier		9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P041, P042	Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2309159900/P040, réf. labo.: 23EK073017-040 MA2309159900/P041, réf. labo.: 23EK073017-041 MA2309159900/P042, réf. labo.: 23EK073017-042 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P040, P041, P042	Idem photo : P040; P041; P042
Palier		10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P041, P042	Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2309159900/P040, réf. labo.: 23EK073017-040 MA2309159900/P041, réf. labo.: 23EK073017-041 MA2309159900/P042, réf. labo.: 23EK073017-042 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P040, P041, P042	Idem photo : P040; P041; P042
Cage d'escalier		11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P041, P042	Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2309159900/P040, réf. labo.: 23EK073017-040 MA2309159900/P041, réf. labo.: 23EK073017-041 MA2309159900/P042, réf. labo.: 23EK073017-042 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P040, P041, P042	Idem photo : P040; P041; P042

Palier		12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P041, P042	Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2309159900/P040, réf. labo.: 23EK073017-040 MA2309159900/P041, réf. labo.: 23EK073017-041 MA2309159900/P042, réf. labo.: 23EK073017-042 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P040, P041, P042	Idem photo : P040; P041; P042
Cage d'escalier		13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P041, P042	Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2309159900/P040, réf. labo.: 23EK073017-040 MA2309159900/P041, réf. labo.: 23EK073017-041 MA2309159900/P042, réf. labo.: 23EK073017-042 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P040, P041, P042	Idem photo : P040; P041; P042
Palier		14	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P041, P042	Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2309159900/P040, réf. labo.: 23EK073017-040 MA2309159900/P041, réf. labo.: 23EK073017-041 MA2309159900/P042, réf. labo.: 23EK073017-042 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P040, P041, P042	Idem photo : P040; P041; P042
Cage d'escalier		15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040, P041, P042	Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2309159900/P040, réf. labo.: 23EK073017-040 MA2309159900/P041, réf. labo.: 23EK073017-041 MA2309159900/P042, réf. labo.: 23EK073017-042 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P040, P041, P042	Idem photo : P040; P041; P042

Palier		16	Sol	Oui Cage 1 8ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO015 Echantillon: MA2309159900/P040, réf. labo.: 23EK073017-040 MA2309159900/P041, réf. labo.: 23EK073017-041 MA2309159900/P042, réf. labo.: 23EK073017-042 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P042 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO019 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage

Niveau : Cage 2 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall		1	Sol	Oui Cage 2 rez de chaussée - Hall : Sol	Identifiant: ZPSO019 Réf. échantillon: MA2309159900/P046 Réf. laboratoire: 23EK073017-046 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P046 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO023 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage

Niveau : Cage 2 rez de chaussée, Cage 2 1er étage, Cage 2 2ème étage, Cage 2 3ème étage, Cage 2 4ème étage, Cage 2 5ème étage, Cage 2 6ème étage, Cage 2 7ème étage, Cage 2 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier		1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P056, P057, P058	Identifiant: ZPSO023 Echantillon: MA2309159900/P056, réf. labo.: 23EK074490-010 MA2309159900/P057, réf. labo.: 23EK074490-011 MA2309159900/P058, réf. labo.: 23EK074490-012 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P056, P057, P058	Idem photo : P056; P057; P058
Palier		2	Sol	Oui Cage 2 1er étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO023 Echantillon: MA2309159900/P056, réf. labo.: 23EK074490-010 MA2309159900/P057, réf. labo.: 23EK074490-011 MA2309159900/P058, réf. labo.: 23EK074490-012 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P056 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier		3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P056, P057, P058	Identifiant: ZPSO023 Echantillon: MA2309159900/P056, réf. labo.: 23EK074490-010 MA2309159900/P057, réf. labo.: 23EK074490-011 MA2309159900/P058, réf. labo.: 23EK074490-012 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P056, P057, P058	Idem photo : P056; P057; P058

Palier		4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P056, P057, P058	Identifiant: ZPSO023 Echantillon: MA2309159900/P056, réf. labo.: 23EK074490-010 MA2309159900/P057, réf. labo.: 23EK074490-011 MA2309159900/P058, réf. labo.: 23EK074490-012 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P056, P057, P058	Idem photo : P056; P057; P058
Cage d'escalier		5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P056, P057, P058	Identifiant: ZPSO023 Echantillon: MA2309159900/P056, réf. labo.: 23EK074490-010 MA2309159900/P057, réf. labo.: 23EK074490-011 MA2309159900/P058, réf. labo.: 23EK074490-012 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P056, P057, P058	Idem photo : P056; P057; P058
Palier		6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P056, P057, P058	Identifiant: ZPSO023 Echantillon: MA2309159900/P056, réf. labo.: 23EK074490-010 MA2309159900/P057, réf. labo.: 23EK074490-011 MA2309159900/P058, réf. labo.: 23EK074490-012 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P056, P057, P058	Idem photo : P056; P057; P058
Cage d'escalier		7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P056, P057, P058	Identifiant: ZPSO023 Echantillon: MA2309159900/P056, réf. labo.: 23EK074490-010 MA2309159900/P057, réf. labo.: 23EK074490-011 MA2309159900/P058, réf. labo.: 23EK074490-012 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P056, P057, P058	Idem photo : P056; P057; P058

Palier		8	Sol	Oui Cage 2 4ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO023 Echantillon: MA2309159900/P056, réf. labo.: 23EK074490-010 MA2309159900/P057, réf. labo.: 23EK074490-011 MA2309159900/P058, réf. labo.: 23EK074490-012 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P057 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier		9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P056, P057, P058	Identifiant: ZPSO023 Echantillon: MA2309159900/P056, réf. labo.: 23EK074490-010 MA2309159900/P057, réf. labo.: 23EK074490-011 MA2309159900/P058, réf. labo.: 23EK074490-012 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P056, P057, P058	Idem photo : P056; P057; P058
Palier		10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P056, P057, P058	Identifiant: ZPSO023 Echantillon: MA2309159900/P056, réf. labo.: 23EK074490-010 MA2309159900/P057, réf. labo.: 23EK074490-011 MA2309159900/P058, réf. labo.: 23EK074490-012 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P056, P057, P058	Idem photo : P056; P057; P058
Cage d'escalier		11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P056, P057, P058	Identifiant: ZPSO023 Echantillon: MA2309159900/P056, réf. labo.: 23EK074490-010 MA2309159900/P057, réf. labo.: 23EK074490-011 MA2309159900/P058, réf. labo.: 23EK074490-012 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P056, P057, P058	Idem photo : P056; P057; P058

Palier		12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P056, P057, P058	Identifiant: ZPSO023 Echantillon: MA2309159900/P056, réf. labo.: 23EK074490-010 MA2309159900/P057, réf. labo.: 23EK074490-011 MA2309159900/P058, réf. labo.: 23EK074490-012 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P056, P057, P058	Idem photo : P056; P057; P058
Cage d'escalier		13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P056, P057, P058	Identifiant: ZPSO023 Echantillon: MA2309159900/P056, réf. labo.: 23EK074490-010 MA2309159900/P057, réf. labo.: 23EK074490-011 MA2309159900/P058, réf. labo.: 23EK074490-012 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P056, P057, P058	Idem photo : P056; P057; P058
Palier		14	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P056, P057, P058	Identifiant: ZPSO023 Echantillon: MA2309159900/P056, réf. labo.: 23EK074490-010 MA2309159900/P057, réf. labo.: 23EK074490-011 MA2309159900/P058, réf. labo.: 23EK074490-012 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P056, P057, P058	Idem photo : P056; P057; P058
Cage d'escalier		15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P056, P057, P058	Identifiant: ZPSO023 Echantillon: MA2309159900/P056, réf. labo.: 23EK074490-010 MA2309159900/P057, réf. labo.: 23EK074490-011 MA2309159900/P058, réf. labo.: 23EK074490-012 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P056, P057, P058	Idem photo : P056; P057; P058

Palier		16	Sol	Oui Cage 2 8ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO023 Echantillon: MA2309159900/P056, réf. labo.: 23EK074490-010 MA2309159900/P057, réf. labo.: 23EK074490-011 MA2309159900/P058, réf. labo.: 23EK074490-012 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P058 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO027 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage

Niveau : Cage 3 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Sol	Oui Cage 3 rez de chaussée - Hall : Sol	Identifiant: ZPSO027 Réf. échantillon: MA2309159900/P062 Réf. laboratoire: 23EK074490-016 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P062 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO031 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage

Niveau : Cage 3 rez de chaussée, Cage 3 1er étage, Cage 3 2ème étage, Cage 3 3ème étage, Cage 3 4ème étage, Cage 3 5ème étage, Cage 3 6ème étage, Cage 3 7ème étage, Cage 3 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P072, P073, P074	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2309159900/P072, réf. labo.: 23EK074490-026 MA2309159900/P073, réf. labo.: 23EK074490-027 MA2309159900/P074, réf. labo.: 23EK074490-028 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P072, P073, P074	Idem photo : P072; P073; P074
Palier	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P072, P073, P074	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2309159900/P072, réf. labo.: 23EK074490-026 MA2309159900/P073, réf. labo.: 23EK074490-027 MA2309159900/P074, réf. labo.: 23EK074490-028 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P072, P073, P074	Idem photo : P072; P073; P074
Cage d'escalier	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P072, P073, P074	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2309159900/P072, réf. labo.: 23EK074490-026 MA2309159900/P073, réf. labo.: 23EK074490-027 MA2309159900/P074, réf. labo.: 23EK074490-028 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P072, P073, P074	Idem photo : P072; P073; P074

Palier	Discontinue	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P072, P073, P074	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2309159900/P072, réf. labo.: 23EK074490-026 MA2309159900/P073, réf. labo.: 23EK074490-027 MA2309159900/P074, réf. labo.: 23EK074490-028 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P072, P073, P074	Idem photo : P072; P073; P074
Cage d'escalier	Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P072, P073, P074	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2309159900/P072, réf. labo.: 23EK074490-026 MA2309159900/P073, réf. labo.: 23EK074490-027 MA2309159900/P074, réf. labo.: 23EK074490-028 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P072, P073, P074	Idem photo : P072; P073; P074
Palier	Discontinue	6	Sol	Oui Cage 3 3ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2309159900/P072, réf. labo.: 23EK074490-026 MA2309159900/P073, réf. labo.: 23EK074490-027 MA2309159900/P074, réf. labo.: 23EK074490-028 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P072 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier	Discontinue	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P072, P073, P074	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2309159900/P072, réf. labo.: 23EK074490-026 MA2309159900/P073, réf. labo.: 23EK074490-027 MA2309159900/P074, réf. labo.: 23EK074490-028 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P072, P073, P074	Idem photo : P072; P073; P074

Palier	Discontinue	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P072, P073, P074	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2309159900/P072, réf. labo.: 23EK074490-026 MA2309159900/P073, réf. labo.: 23EK074490-027 MA2309159900/P074, réf. labo.: 23EK074490-028 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P072, P073, P074	Idem photo : P072; P073; P074
Cage d'escalier	Discontinue	9	Sol	Oui Cage 3 4ème étage - Cage d'escalier : Sol	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2309159900/P072, réf. labo.: 23EK074490-026 MA2309159900/P073, réf. labo.: 23EK074490-027 MA2309159900/P074, réf. labo.: 23EK074490-028 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P073 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Palier	Discontinue	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P072, P073, P074	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2309159900/P072, réf. labo.: 23EK074490-026 MA2309159900/P073, réf. labo.: 23EK074490-027 MA2309159900/P074, réf. labo.: 23EK074490-028 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P072, P073, P074	Idem photo : P072; P073; P074
Cage d'escalier	Discontinue	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P072, P073, P074	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2309159900/P072, réf. labo.: 23EK074490-026 MA2309159900/P073, réf. labo.: 23EK074490-027 MA2309159900/P074, réf. labo.: 23EK074490-028 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P072, P073, P074	Idem photo : P072; P073; P074

Palier	Discontinue	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P072, P073, P074	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2309159900/P072, réf. labo.: 23EK074490-026 MA2309159900/P073, réf. labo.: 23EK074490-027 MA2309159900/P074, réf. labo.: 23EK074490-028 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P072, P073, P074	Idem photo : P072; P073; P074
Cage d'escalier	Discontinue	13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P072, P073, P074	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2309159900/P072, réf. labo.: 23EK074490-026 MA2309159900/P073, réf. labo.: 23EK074490-027 MA2309159900/P074, réf. labo.: 23EK074490-028 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P072, P073, P074	Idem photo : P072; P073; P074
Palier	Discontinue	14	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P072, P073, P074	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2309159900/P072, réf. labo.: 23EK074490-026 MA2309159900/P073, réf. labo.: 23EK074490-027 MA2309159900/P074, réf. labo.: 23EK074490-028 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P072, P073, P074	Idem photo : P072; P073; P074
Cage d'escalier	Discontinue	15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P072, P073, P074	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2309159900/P072, réf. labo.: 23EK074490-026 MA2309159900/P073, réf. labo.: 23EK074490-027 MA2309159900/P074, réf. labo.: 23EK074490-028 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P072, P073, P074	Idem photo : P072; P073; P074

Palier	Discontinue	16	Sol	Oui Cage 3 8ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO031 Echantillon: MA2309159900/P072, réf. labo.: 23EK074490-026 MA2309159900/P073, réf. labo.: 23EK074490-027 MA2309159900/P074, réf. labo.: 23EK074490-028 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P074 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO035 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage

Niveau : Cage 4 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall		1	Sol	Oui Cage 4 rez de chaussée - Hall : Sol	Identifiant: ZPSO035 Réf. échantillon: MA2309159900/P078 Réf. laboratoire: 23EK074898-003 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P078 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	

ZPSO037 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre

Niveau : Cage 4 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	Plafond	Oui Cage 4 7ème étage - Cage d'escalier : Sol	Identifiant: ZPSO037 Echantillon: MA2309159900/P082, réf. labo.: 23EK074898-007 MA2309159900/P083, réf. labo.: 23EK074898-008 MA2309159900/P084, réf. labo.: 23EK074898-009 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Couche1: Enduit à base de plâtre Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1 : Colle de carrelage Couche2 : Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P082 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO039 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage

Niveau : Cage 4 rez de chaussée, Cage 4 1er étage, Cage 4 2ème étage, Cage 4 3ème étage, Cage 4 4ème étage, Cage 4 5ème étage, Cage 4 6ème étage, Cage 4 7ème étage, Cage 4 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier		1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P088, P089, P090	Identifiant: ZPSO039 Echantillon: MA2309159900/P088, réf. labo.: 23EK074898-013 MA2309159900/P089, réf. labo.: 23EK074898-014 MA2309159900/P090, réf. labo.: 23EK074898-015 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P088, P089, P090	Idem photo : P088; P089; P090
Palier		2	Sol	Oui Cage 4 1er étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO039 Echantillon: MA2309159900/P088, réf. labo.: 23EK074898-013 MA2309159900/P089, réf. labo.: 23EK074898-014 MA2309159900/P090, réf. labo.: 23EK074898-015 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P088 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	
Cage d'escalier		3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P088, P089, P090	Identifiant: ZPSO039 Echantillon: MA2309159900/P088, réf. labo.: 23EK074898-013 MA2309159900/P089, réf. labo.: 23EK074898-014 MA2309159900/P090, réf. labo.: 23EK074898-015 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P088, P089, P090	Idem photo : P088; P089; P090

Palier		4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P088, P089, P090	Identifiant: ZPSO039 Echantillon: MA2309159900/P088, réf. labo.: 23EK074898-013 MA2309159900/P089, réf. labo.: 23EK074898-014 MA2309159900/P090, réf. labo.: 23EK074898-015 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P088, P089, P090	Idem photo : P088; P089; P090
Cage d'escalier		5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P088, P089, P090	Identifiant: ZPSO039 Echantillon: MA2309159900/P088, réf. labo.: 23EK074898-013 MA2309159900/P089, réf. labo.: 23EK074898-014 MA2309159900/P090, réf. labo.: 23EK074898-015 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P088, P089, P090	Idem photo : P088; P089; P090
Palier		6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P088, P089, P090	Identifiant: ZPSO039 Echantillon: MA2309159900/P088, réf. labo.: 23EK074898-013 MA2309159900/P089, réf. labo.: 23EK074898-014 MA2309159900/P090, réf. labo.: 23EK074898-015 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P088, P089, P090	Idem photo : P088; P089; P090
Cage d'escalier		7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P088, P089, P090	Identifiant: ZPSO039 Echantillon: MA2309159900/P088, réf. labo.: 23EK074898-013 MA2309159900/P089, réf. labo.: 23EK074898-014 MA2309159900/P090, réf. labo.: 23EK074898-015 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P088, P089, P090	Idem photo : P088; P089; P090

Palier		8	Sol	Oui Cage 4 4ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO039 Echantillon: MA2309159900/P088, réf. labo.: 23EK074898-013 MA2309159900/P089, réf. labo.: 23EK074898-014 MA2309159900/P090, réf. labo.: 23EK074898-015 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P089 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur (beige) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier		9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P088, P089, P090	Identifiant: ZPSO039 Echantillon: MA2309159900/P088, réf. labo.: 23EK074898-013 MA2309159900/P089, réf. labo.: 23EK074898-014 MA2309159900/P090, réf. labo.: 23EK074898-015 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P088, P089, P090	Idem photo : P088; P089; P090
Palier		10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P088, P089, P090	Identifiant: ZPSO039 Echantillon: MA2309159900/P088, réf. labo.: 23EK074898-013 MA2309159900/P089, réf. labo.: 23EK074898-014 MA2309159900/P090, réf. labo.: 23EK074898-015 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P088, P089, P090	Idem photo : P088; P089; P090
Cage d'escalier		11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P088, P089, P090	Identifiant: ZPSO039 Echantillon: MA2309159900/P088, réf. labo.: 23EK074898-013 MA2309159900/P089, réf. labo.: 23EK074898-014 MA2309159900/P090, réf. labo.: 23EK074898-015 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P088, P089, P090	Idem photo : P088; P089; P090

Palier		12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P088, P089, P090	Identifiant: ZPSO039 Echantillon: MA2309159900/P088, réf. labo.: 23EK074898-013 MA2309159900/P089, réf. labo.: 23EK074898-014 MA2309159900/P090, réf. labo.: 23EK074898-015 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P088, P089, P090	Idem photo : P088; P089; P090
Cage d'escalier		13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P088, P089, P090	Identifiant: ZPSO039 Echantillon: MA2309159900/P088, réf. labo.: 23EK074898-013 MA2309159900/P089, réf. labo.: 23EK074898-014 MA2309159900/P090, réf. labo.: 23EK074898-015 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P088, P089, P090	Idem photo : P088; P089; P090
Palier		14	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P088, P089, P090	Identifiant: ZPSO039 Echantillon: MA2309159900/P088, réf. labo.: 23EK074898-013 MA2309159900/P089, réf. labo.: 23EK074898-014 MA2309159900/P090, réf. labo.: 23EK074898-015 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P088, P089, P090	Idem photo : P088; P089; P090
Cage d'escalier		15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P088, P089, P090	Identifiant: ZPSO039 Echantillon: MA2309159900/P088, réf. labo.: 23EK074898-013 MA2309159900/P089, réf. labo.: 23EK074898-014 MA2309159900/P090, réf. labo.: 23EK074898-015 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P088, P089, P090	Idem photo : P088; P089; P090

Palier		16	Sol	Oui Cage 4 8ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO039 Echantillon: MA2309159900/P088, réf. labo.: 23EK074898-013 MA2309159900/P089, réf. labo.: 23EK074898-014 MA2309159900/P090, réf. labo.: 23EK074898-015 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P090 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO041 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage

Niveau : Cage 4 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Local poubelle	Unique	1	Mur A,B,C,D	Oui Cage 4 rez de chaussée - Local poubelle : Sol	Identifiant: ZPSO041 Réf. échantillon: MA2309159900/P092 Réf. laboratoire: 23EK074898-017 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P092 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO043 : Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot

Niveau : Cage 5 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Plafond	Oui Cage 5 rez de chaussée - Hall : Sol	Identifiant: ZPSO043 Réf. échantillon: MA2309159900/P094 Réf. laboratoire: 23EK074898-019 Description: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols + 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P094 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

ZPSO048 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage

Niveau : Cage 5 rez de chaussée, Cage 5 1er étage, Cage 5 2ème étage, Cage 5 3ème étage, Cage 5 4ème étage, Cage 5 5ème étage, Cage 5 6ème étage, Cage 5 7ème étage, Cage 5 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P105, P106, P107	Identifiant: ZPSO048 Echantillon: MA2309159900/P105, réf. labo.: 23EK074898-030 MA2309159900/P106, réf. labo.: 23EK074898-031 MA2309159900/P107, réf. labo.: 23EK074898-032 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P105, P106, P107	Idem photo : P105; P106; P107
Palier	Discontinue	2	Sol	Oui Cage 5 1er étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO048 Echantillon: MA2309159900/P105, réf. labo.: 23EK074898-030 MA2309159900/P106, réf. labo.: 23EK074898-031 MA2309159900/P107, réf. labo.: 23EK074898-032 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P105 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P105, P106, P107	Identifiant: ZPSO048 Echantillon: MA2309159900/P105, réf. labo.: 23EK074898-030 MA2309159900/P106, réf. labo.: 23EK074898-031 MA2309159900/P107, réf. labo.: 23EK074898-032 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P105, P106, P107	Idem photo : P105; P106; P107

Palier	Discontinue	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P105, P106, P107	Identifiant: ZPSO048 Echantillon: MA2309159900/P105, réf. labo.: 23EK074898-030 MA2309159900/P106, réf. labo.: 23EK074898-031 MA2309159900/P107, réf. labo.: 23EK074898-032 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P105, P106, P107	Idem photo : P105; P106; P107
Cage d'escalier	Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P105, P106, P107	Identifiant: ZPSO048 Echantillon: MA2309159900/P105, réf. labo.: 23EK074898-030 MA2309159900/P106, réf. labo.: 23EK074898-031 MA2309159900/P107, réf. labo.: 23EK074898-032 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P105, P106, P107	Idem photo : P105; P106; P107
Palier	Discontinue	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P105, P106, P107	Identifiant: ZPSO048 Echantillon: MA2309159900/P105, réf. labo.: 23EK074898-030 MA2309159900/P106, réf. labo.: 23EK074898-031 MA2309159900/P107, réf. labo.: 23EK074898-032 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P105, P106, P107	Idem photo : P105; P106; P107
Cage d'escalier	Discontinue	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P105, P106, P107	Identifiant: ZPSO048 Echantillon: MA2309159900/P105, réf. labo.: 23EK074898-030 MA2309159900/P106, réf. labo.: 23EK074898-031 MA2309159900/P107, réf. labo.: 23EK074898-032 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P105, P106, P107	Idem photo : P105; P106; P107

Palier	Discontinue	8	Sol	Oui Cage 5 4ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO048 Echantillon: MA2309159900/P105, réf. labo.: 23EK074898-030 MA2309159900/P106, réf. labo.: 23EK074898-031 MA2309159900/P107, réf. labo.: 23EK074898-032 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P106 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier	Discontinue	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P105, P106, P107	Identifiant: ZPSO048 Echantillon: MA2309159900/P105, réf. labo.: 23EK074898-030 MA2309159900/P106, réf. labo.: 23EK074898-031 MA2309159900/P107, réf. labo.: 23EK074898-032 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P105, P106, P107	Idem photo : P105; P106; P107
Palier	Discontinue	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P105, P106, P107	Identifiant: ZPSO048 Echantillon: MA2309159900/P105, réf. labo.: 23EK074898-030 MA2309159900/P106, réf. labo.: 23EK074898-031 MA2309159900/P107, réf. labo.: 23EK074898-032 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P105, P106, P107	Idem photo : P105; P106; P107
Cage d'escalier	Discontinue	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P105, P106, P107	Identifiant: ZPSO048 Echantillon: MA2309159900/P105, réf. labo.: 23EK074898-030 MA2309159900/P106, réf. labo.: 23EK074898-031 MA2309159900/P107, réf. labo.: 23EK074898-032 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P105, P106, P107	Idem photo : P105; P106; P107

Palier	Discontinue	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P105, P106, P107	Identifiant: ZPSO048 Echantillon: MA2309159900/P105, réf. labo.: 23EK074898-030 MA2309159900/P106, réf. labo.: 23EK074898-031 MA2309159900/P107, réf. labo.: 23EK074898-032 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P105, P106, P107	Idem photo : P105; P106; P107
Cage d'escalier	Discontinue	13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P105, P106, P107	Identifiant: ZPSO048 Echantillon: MA2309159900/P105, réf. labo.: 23EK074898-030 MA2309159900/P106, réf. labo.: 23EK074898-031 MA2309159900/P107, réf. labo.: 23EK074898-032 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P105, P106, P107	Idem photo : P105; P106; P107
Palier	Discontinue	14	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P105, P106, P107	Identifiant: ZPSO048 Echantillon: MA2309159900/P105, réf. labo.: 23EK074898-030 MA2309159900/P106, réf. labo.: 23EK074898-031 MA2309159900/P107, réf. labo.: 23EK074898-032 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P105, P106, P107	Idem photo : P105; P106; P107
Cage d'escalier	Discontinue	15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P105, P106, P107	Identifiant: ZPSO048 Echantillon: MA2309159900/P105, réf. labo.: 23EK074898-030 MA2309159900/P106, réf. labo.: 23EK074898-031 MA2309159900/P107, réf. labo.: 23EK074898-032 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P105, P106, P107	Idem photo : P105; P106; P107

Palier	Discontinue	16	Sol	Oui Cage 5 8ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO048 Echantillon: MA2309159900/P105, réf. labo.: 23EK074898-030 MA2309159900/P106, réf. labo.: 23EK074898-031 MA2309159900/P107, réf. labo.: 23EK074898-032 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P107 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO052 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage

Niveau : Cage 6 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Sol	Oui Cage 6 rez de chaussée - Hall : Sol	Identifiant: ZPSO052 Réf. échantillon: MA2309159900/P111 Réf. laboratoire: 23EK074898-036 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P111 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur (gris) ; matériau dur (granulaire) (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO056 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage

Niveau : Cage 6 rez de chaussée, Cage 6 1er étage, Cage 6 2ème étage, Cage 6 3ème étage, Cage 6 4ème étage, Cage 6 5ème étage, Cage 6 6ème étage, Cage 6 7ème étage, Cage 6 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P121, P122, P123	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2309159900/P121, réf. labo.: 23EK074898-046 MA2309159900/P122, réf. labo.: 23EK074898-047 MA2309159900/P123, réf. labo.: 23EK074898-048 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P121, P122, P123	Idem photo : P121; P122; P123
Palier	Discontinue	2	Sol	Oui Cage 6 1er étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2309159900/P121, réf. labo.: 23EK074898-046 MA2309159900/P122, réf. labo.: 23EK074898-047 MA2309159900/P123, réf. labo.: 23EK074898-048 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P121 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P121, P122, P123	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2309159900/P121, réf. labo.: 23EK074898-046 MA2309159900/P122, réf. labo.: 23EK074898-047 MA2309159900/P123, réf. labo.: 23EK074898-048 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P121, P122, P123	Idem photo : P121; P122; P123

Palier	Discontinue	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P121, P122, P123	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2309159900/P121, réf. labo.: 23EK074898-046 MA2309159900/P122, réf. labo.: 23EK074898-047 MA2309159900/P123, réf. labo.: 23EK074898-048 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P121, P122, P123	Idem photo : P121; P122; P123
Cage d'escalier	Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P121, P122, P123	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2309159900/P121, réf. labo.: 23EK074898-046 MA2309159900/P122, réf. labo.: 23EK074898-047 MA2309159900/P123, réf. labo.: 23EK074898-048 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P121, P122, P123	Idem photo : P121; P122; P123
Palier	Discontinue	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P121, P122, P123	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2309159900/P121, réf. labo.: 23EK074898-046 MA2309159900/P122, réf. labo.: 23EK074898-047 MA2309159900/P123, réf. labo.: 23EK074898-048 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P121, P122, P123	Idem photo : P121; P122; P123
Cage d'escalier	Discontinue	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P121, P122, P123	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2309159900/P121, réf. labo.: 23EK074898-046 MA2309159900/P122, réf. labo.: 23EK074898-047 MA2309159900/P123, réf. labo.: 23EK074898-048 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P121, P122, P123	Idem photo : P121; P122; P123

Palier	Discontinue	8	Sol	Oui Cage 6 4ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2309159900/P121, réf. labo.: 23EK074898-046 MA2309159900/P122, réf. labo.: 23EK074898-047 MA2309159900/P123, réf. labo.: 23EK074898-048 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P122 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur (gris) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier	Discontinue	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P121, P122, P123	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2309159900/P121, réf. labo.: 23EK074898-046 MA2309159900/P122, réf. labo.: 23EK074898-047 MA2309159900/P123, réf. labo.: 23EK074898-048 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P121, P122, P123	Idem photo : P121; P122; P123
Palier	Discontinue	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P121, P122, P123	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2309159900/P121, réf. labo.: 23EK074898-046 MA2309159900/P122, réf. labo.: 23EK074898-047 MA2309159900/P123, réf. labo.: 23EK074898-048 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P121, P122, P123	Idem photo : P121; P122; P123
Cage d'escalier	Discontinue	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P121, P122, P123	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2309159900/P121, réf. labo.: 23EK074898-046 MA2309159900/P122, réf. labo.: 23EK074898-047 MA2309159900/P123, réf. labo.: 23EK074898-048 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P121, P122, P123	Idem photo : P121; P122; P123

Palier	Discontinue	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P121, P122, P123	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2309159900/P121, réf. labo.: 23EK074898-046 MA2309159900/P122, réf. labo.: 23EK074898-047 MA2309159900/P123, réf. labo.: 23EK074898-048 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P121, P122, P123	Idem photo : P121; P122; P123
Cage d'escalier	Discontinue	13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P121, P122, P123	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2309159900/P121, réf. labo.: 23EK074898-046 MA2309159900/P122, réf. labo.: 23EK074898-047 MA2309159900/P123, réf. labo.: 23EK074898-048 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P121, P122, P123	Idem photo : P121; P122; P123
Palier	Discontinue	14	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P121, P122, P123	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2309159900/P121, réf. labo.: 23EK074898-046 MA2309159900/P122, réf. labo.: 23EK074898-047 MA2309159900/P123, réf. labo.: 23EK074898-048 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P121, P122, P123	Idem photo : P121; P122; P123
Cage d'escalier	Discontinue	15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P121, P122, P123	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2309159900/P121, réf. labo.: 23EK074898-046 MA2309159900/P122, réf. labo.: 23EK074898-047 MA2309159900/P123, réf. labo.: 23EK074898-048 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P121, P122, P123	Idem photo : P121; P122; P123

Palier	Discontinue	16	Sol	Oui Cage 6 8ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO056 Echantillon: MA2309159900/P121, réf. labo.: 23EK074898-046 MA2309159900/P122, réf. labo.: 23EK074898-047 MA2309159900/P123, réf. labo.: 23EK074898-048 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P123 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO060 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage

Niveau : Cage 7 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Sol	Oui Cage 7 rez de chaussée - Hall : Sol	Identifiant: ZPSO060 Réf. échantillon: MA2309159900/P127 Réf. laboratoire: 23EK074898-052 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P127 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Absence d'amiante	

ZPSO064 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage

Niveau : Cage 7 rez de chaussée, Cage 7 1er étage, Cage 7 2ème étage, Cage 7 3ème étage, Cage 7 4ème étage, Cage 7 5ème étage, Cage 7 6ème étage, Cage 7 7ème étage, Cage 7 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P137, P138, P139	Identifiant: ZPSO064 Echantillon: MA2309159900/P137, réf. labo.: 23EK074898-062 MA2309159900/P138, réf. labo.: 23EK074898-063 MA2309159900/P139, réf. labo.: 23EK074898-064 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P137, P138, P139	Idem photo : P137; P138; P139
Palier	Discontinue	2	Sol	Oui Cage 7 1er étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO064 Echantillon: MA2309159900/P137, réf. labo.: 23EK074898-062 MA2309159900/P138, réf. labo.: 23EK074898-063 MA2309159900/P139, réf. labo.: 23EK074898-064 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P137 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P137, P138, P139	Identifiant: ZPSO064 Echantillon: MA2309159900/P137, réf. labo.: 23EK074898-062 MA2309159900/P138, réf. labo.: 23EK074898-063 MA2309159900/P139, réf. labo.: 23EK074898-064 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P137, P138, P139	Idem photo : P137; P138; P139

Palier	Discontinue	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P137, P138, P139	Identifiant: ZPSO064 Echantillon: MA2309159900/P137, réf. labo.: 23EK074898-062 MA2309159900/P138, réf. labo.: 23EK074898-063 MA2309159900/P139, réf. labo.: 23EK074898-064 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P137, P138, P139	Idem photo : P137; P138; P139
Cage d'escalier	Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P137, P138, P139	Identifiant: ZPSO064 Echantillon: MA2309159900/P137, réf. labo.: 23EK074898-062 MA2309159900/P138, réf. labo.: 23EK074898-063 MA2309159900/P139, réf. labo.: 23EK074898-064 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P137, P138, P139	Idem photo : P137; P138; P139
Palier	Discontinue	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P137, P138, P139	Identifiant: ZPSO064 Echantillon: MA2309159900/P137, réf. labo.: 23EK074898-062 MA2309159900/P138, réf. labo.: 23EK074898-063 MA2309159900/P139, réf. labo.: 23EK074898-064 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P137, P138, P139	Idem photo : P137; P138; P139
Cage d'escalier	Discontinue	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P137, P138, P139	Identifiant: ZPSO064 Echantillon: MA2309159900/P137, réf. labo.: 23EK074898-062 MA2309159900/P138, réf. labo.: 23EK074898-063 MA2309159900/P139, réf. labo.: 23EK074898-064 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P137, P138, P139	Idem photo : P137; P138; P139

Palier	Discontinue	8	Sol	Oui Cage 7 4ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO064 Echantillon: MA2309159900/P137, réf. labo.: 23EK074898-062 MA2309159900/P138, réf. labo.: 23EK074898-063 MA2309159900/P139, réf. labo.: 23EK074898-064 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P138 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier	Discontinue	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P137, P138, P139	Identifiant: ZPSO064 Echantillon: MA2309159900/P137, réf. labo.: 23EK074898-062 MA2309159900/P138, réf. labo.: 23EK074898-063 MA2309159900/P139, réf. labo.: 23EK074898-064 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P137, P138, P139	Idem photo : P137; P138; P139
Palier	Discontinue	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P137, P138, P139	Identifiant: ZPSO064 Echantillon: MA2309159900/P137, réf. labo.: 23EK074898-062 MA2309159900/P138, réf. labo.: 23EK074898-063 MA2309159900/P139, réf. labo.: 23EK074898-064 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P137, P138, P139	Idem photo : P137; P138; P139
Cage d'escalier	Discontinue	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P137, P138, P139	Identifiant: ZPSO064 Echantillon: MA2309159900/P137, réf. labo.: 23EK074898-062 MA2309159900/P138, réf. labo.: 23EK074898-063 MA2309159900/P139, réf. labo.: 23EK074898-064 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P137, P138, P139	Idem photo : P137; P138; P139

Palier	Discontinue	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P137, P138, P139	Identifiant: ZPSO064 Echantillon: MA2309159900/P137, réf. labo.: 23EK074898-062 MA2309159900/P138, réf. labo.: 23EK074898-063 MA2309159900/P139, réf. labo.: 23EK074898-064 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P137, P138, P139	Idem photo : P137; P138; P139
Cage d'escalier	Discontinue	13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P137, P138, P139	Identifiant: ZPSO064 Echantillon: MA2309159900/P137, réf. labo.: 23EK074898-062 MA2309159900/P138, réf. labo.: 23EK074898-063 MA2309159900/P139, réf. labo.: 23EK074898-064 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P137, P138, P139	Idem photo : P137; P138; P139
Palier	Discontinue	14	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P137, P138, P139	Identifiant: ZPSO064 Echantillon: MA2309159900/P137, réf. labo.: 23EK074898-062 MA2309159900/P138, réf. labo.: 23EK074898-063 MA2309159900/P139, réf. labo.: 23EK074898-064 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P137, P138, P139	Idem photo : P137; P138; P139
Cage d'escalier	Discontinue	15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P137, P138, P139	Identifiant: ZPSO064 Echantillon: MA2309159900/P137, réf. labo.: 23EK074898-062 MA2309159900/P138, réf. labo.: 23EK074898-063 MA2309159900/P139, réf. labo.: 23EK074898-064 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P137, P138, P139	Idem photo : P137; P138; P139

Palier	Discontinue	16	Sol	Oui Cage 7 8ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO064 Echantillon: MA2309159900/P137, réf. labo.: 23EK074898-062 MA2309159900/P138, réf. labo.: 23EK074898-063 MA2309159900/P139, réf. labo.: 23EK074898-064 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P139 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO068 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage

Niveau : Cage 8 rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Hall	Unique	1	Sol	Oui Cage 8 rez de chaussée - Hall : Sol	Identifiant: ZPSO068 Réf. échantillon: MA2309159900/P143 Réf. laboratoire: 23EK074898-068 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P143 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO072 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage

Niveau : Cage 8 rez de chaussée, Cage 8 1er étage, Cage 8 2ème étage, Cage 8 3ème étage, Cage 8 4ème étage, Cage 8 5ème étage, Cage 8 6ème étage, Cage 8 7ème étage, Cage 8 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cage d'escalier	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P153, P154, P155	Identifiant: ZPSO072 Echantillon: MA2309159900/P153, réf. labo.: 23EK074898-078 MA2309159900/P154, réf. labo.: 23EK074898-079 MA2309159900/P155, réf. labo.: 23EK074898-080 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P153, P154, P155	Idem photo : P153; P154; P155
Palier	Discontinue	2	Sol	Oui Cage 8 1er étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO072 Echantillon: MA2309159900/P153, réf. labo.: 23EK074898-078 MA2309159900/P154, réf. labo.: 23EK074898-079 MA2309159900/P155, réf. labo.: 23EK074898-080 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P153 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P153, P154, P155	Identifiant: ZPSO072 Echantillon: MA2309159900/P153, réf. labo.: 23EK074898-078 MA2309159900/P154, réf. labo.: 23EK074898-079 MA2309159900/P155, réf. labo.: 23EK074898-080 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P153, P154, P155	Idem photo : P153; P154; P155

Palier	Discontinue	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P153, P154, P155	Identifiant: ZPSO072 Echantillon: MA2309159900/P153, réf. labo.: 23EK074898-078 MA2309159900/P154, réf. labo.: 23EK074898-079 MA2309159900/P155, réf. labo.: 23EK074898-080 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P153, P154, P155	Idem photo : P153; P154; P155
Cage d'escalier	Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P153, P154, P155	Identifiant: ZPSO072 Echantillon: MA2309159900/P153, réf. labo.: 23EK074898-078 MA2309159900/P154, réf. labo.: 23EK074898-079 MA2309159900/P155, réf. labo.: 23EK074898-080 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P153, P154, P155	Idem photo : P153; P154; P155
Palier	Discontinue	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P153, P154, P155	Identifiant: ZPSO072 Echantillon: MA2309159900/P153, réf. labo.: 23EK074898-078 MA2309159900/P154, réf. labo.: 23EK074898-079 MA2309159900/P155, réf. labo.: 23EK074898-080 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P153, P154, P155	Idem photo : P153; P154; P155
Cage d'escalier	Discontinue	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P153, P154, P155	Identifiant: ZPSO072 Echantillon: MA2309159900/P153, réf. labo.: 23EK074898-078 MA2309159900/P154, réf. labo.: 23EK074898-079 MA2309159900/P155, réf. labo.: 23EK074898-080 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P153, P154, P155	Idem photo : P153; P154; P155

Palier	Discontinue	8	Sol	Oui Cage 8 4ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO072 Echantillon: MA2309159900/P153, réf. labo.: 23EK074898-078 MA2309159900/P154, réf. labo.: 23EK074898-079 MA2309159900/P155, réf. labo.: 23EK074898-080 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P154 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Cage d'escalier	Discontinue	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P153, P154, P155	Identifiant: ZPSO072 Echantillon: MA2309159900/P153, réf. labo.: 23EK074898-078 MA2309159900/P154, réf. labo.: 23EK074898-079 MA2309159900/P155, réf. labo.: 23EK074898-080 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P153, P154, P155	Idem photo : P153; P154; P155
Palier	Discontinue	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P153, P154, P155	Identifiant: ZPSO072 Echantillon: MA2309159900/P153, réf. labo.: 23EK074898-078 MA2309159900/P154, réf. labo.: 23EK074898-079 MA2309159900/P155, réf. labo.: 23EK074898-080 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P153, P154, P155	Idem photo : P153; P154; P155
Cage d'escalier	Discontinue	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P153, P154, P155	Identifiant: ZPSO072 Echantillon: MA2309159900/P153, réf. labo.: 23EK074898-078 MA2309159900/P154, réf. labo.: 23EK074898-079 MA2309159900/P155, réf. labo.: 23EK074898-080 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P153, P154, P155	Idem photo : P153; P154; P155

Palier	Discontinue	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P153, P154, P155	Identifiant: ZPSO072 Echantillon: MA2309159900/P153, réf. labo.: 23EK074898-078 MA2309159900/P154, réf. labo.: 23EK074898-079 MA2309159900/P155, réf. labo.: 23EK074898-080 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P153, P154, P155	Idem photo : P153; P154; P155
Cage d'escalier	Discontinue	13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P153, P154, P155	Identifiant: ZPSO072 Echantillon: MA2309159900/P153, réf. labo.: 23EK074898-078 MA2309159900/P154, réf. labo.: 23EK074898-079 MA2309159900/P155, réf. labo.: 23EK074898-080 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P153, P154, P155	Idem photo : P153; P154; P155
Palier	Discontinue	14	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P153, P154, P155	Identifiant: ZPSO072 Echantillon: MA2309159900/P153, réf. labo.: 23EK074898-078 MA2309159900/P154, réf. labo.: 23EK074898-079 MA2309159900/P155, réf. labo.: 23EK074898-080 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P153, P154, P155	Idem photo : P153; P154; P155
Cage d'escalier	Discontinue	15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P153, P154, P155	Identifiant: ZPSO072 Echantillon: MA2309159900/P153, réf. labo.: 23EK074898-078 MA2309159900/P154, réf. labo.: 23EK074898-079 MA2309159900/P155, réf. labo.: 23EK074898-080 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P153, P154, P155	Idem photo : P153; P154; P155

Palier	Discontinue	16	Sol	Oui Cage 8 8ème étage - Palier : Sol	Identifiant: ZPSO072 Echantillon: MA2309159900/P153, réf. labo.: 23EK074898-078 MA2309159900/P154, réf. labo.: 23EK074898-079 MA2309159900/P155, réf. labo.: 23EK074898-080 Description: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P155 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO016 : Conduit en fibres-ciment

Niveau : Cage 1 1er étage, Cage 1 2ème étage, Cage 1 3ème étage, Cage 1 4ème étage, Cage 1 5ème étage, Cage 1 6ème étage, Cage 1 7ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Gaine technique		1	Sol; Plafond	Oui Cage 1 1er étage - Gaine technique : Sol; Plafond	Identifiant: ZPSO016 Réf. échantillon: MA2309159900/P043 Réf. laboratoire: 23EK073017-043 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Quantité estimée: 20 ml Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P043 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
		2	Sol; Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P043	Identifiant: ZPSO016 Réf. échantillon: MA2309159900/P043 Réf. laboratoire: 23EK073017-043 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P043	Idem photo : P043

	3	Sol; Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P043	Identifiant: ZPSO016 Réf. échantillon: MA2309159900/P043 Réf. laboratoire: 23EK073017-043 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P043	Idem photo : P043
	4	Sol; Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P043	Identifiant: ZPSO016 Réf. échantillon: MA2309159900/P043 Réf. laboratoire: 23EK073017-043 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P043	Idem photo : P043
	5	Sol; Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P043	Identifiant: ZPSO016 Réf. échantillon: MA2309159900/P043 Réf. laboratoire: 23EK073017-043 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P043	Idem photo : P043
	6	Sol; Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P043	Identifiant: ZPSO016 Réf. échantillon: MA2309159900/P043 Réf. laboratoire: 23EK073017-043 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P043	Idem photo : P043
	7	Sol; Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P043	Identifiant: ZPSO016 Réf. échantillon: MA2309159900/P043 Réf. laboratoire: 23EK073017-043 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P043	Idem photo : P043

ZPSO024 : Conduit en fibres-ciment

Niveau : Cage 2 1er étage, Cage 2 2ème étage, Cage 2 3ème étage, Cage 2 4ème étage, Cage 2 5ème étage, Cage 2 6ème étage, Cage 2 7ème étage, Cage 2 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Gaine technique		1	vide ordure	Oui Cage 3 rez de chaussée - Hall : vide ordure	Identifiant: ZPSO024 Réf. échantillon: MA2309159900/P059 Réf. laboratoire: 23EK074490-013 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Quantité estimée: 20 ml Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P059 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
		2	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059	Identifiant: ZPSO024 Réf. échantillon: MA2309159900/P059 Réf. laboratoire: 23EK074490-013 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P059	Idem photo : P059
		3	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059	Identifiant: ZPSO024 Réf. échantillon: MA2309159900/P059 Réf. laboratoire: 23EK074490-013 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P059	Idem photo : P059
		4	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059	Identifiant: ZPSO024 Réf. échantillon: MA2309159900/P059 Réf. laboratoire: 23EK074490-013 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P059	Idem photo : P059

	5	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059	Identifiant: ZPSO024 Réf. échantillon: MA2309159900/P059 Réf. laboratoire: 23EK074490-013 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P059	Idem photo : P059
	6	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059	Identifiant: ZPSO024 Réf. échantillon: MA2309159900/P059 Réf. laboratoire: 23EK074490-013 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P059	Idem photo : P059
	7	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059	Identifiant: ZPSO024 Réf. échantillon: MA2309159900/P059 Réf. laboratoire: 23EK074490-013 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P059	Idem photo : P059
	8	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P059	Identifiant: ZPSO024 Réf. échantillon: MA2309159900/P059 Réf. laboratoire: 23EK074490-013 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P059	Idem photo : P059

ZPSO032 : Conduit en fibres-ciment

Niveau : Cage 3 1er étage, Cage 3 2ème étage, Cage 3 3ème étage, Cage 3 4ème étage, Cage 3 5ème étage, Cage 3 6ème étage, Cage 3 7ème étage, Cage 3 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Gaine technique	Discontinue	1	Vide ordure	Oui Cage 3 1er étage - Gaine technique : Vide ordure	Identifiant: ZPSO032 Réf. échantillon: MA2309159900/P075 Réf. laboratoire: 23EK074490-029 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Quantité estimée: 20 ml Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P075 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
	Discontinue	2	Vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P075	Identifiant: ZPSO032 Réf. échantillon: MA2309159900/P075 Réf. laboratoire: 23EK074490-029 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P075	Idem photo : P075
	Discontinue	3	Vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P075	Identifiant: ZPSO032 Réf. échantillon: MA2309159900/P075 Réf. laboratoire: 23EK074490-029 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P075	Idem photo : P075
	Discontinue	4	Vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P075	Identifiant: ZPSO032 Réf. échantillon: MA2309159900/P075 Réf. laboratoire: 23EK074490-029 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P075	Idem photo : P075

	Discontinue	5	Vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P075	Identifiant: ZPSO032 Réf. échantillon: MA2309159900/P075 Réf. laboratoire: 23EK074490-029 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P075	Idem photo : P075
	Discontinue	6	Vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P075	Identifiant: ZPSO032 Réf. échantillon: MA2309159900/P075 Réf. laboratoire: 23EK074490-029 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P075	Idem photo : P075
	Discontinue	7	Vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P075	Identifiant: ZPSO032 Réf. échantillon: MA2309159900/P075 Réf. laboratoire: 23EK074490-029 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P075	Idem photo : P075
Gaine Technique	Discontinue	8	Vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P075	Identifiant: ZPSO032 Réf. échantillon: MA2309159900/P075 Réf. laboratoire: 23EK074490-029 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P075	Idem photo : P075

ZPSO040 : Conduit en fibres-ciment

Niveau : Cage 4 1er étage, Cage 4 2ème étage, Cage 4 3ème étage, Cage 4 4ème étage, Cage 4 5ème étage, Cage 4 6ème étage, Cage 4 7ème étage, Cage 4 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Gaine technique	Continue	1	vide ordure	Oui Cage 4 1er étage - Palier : vide ordure	Identifiant: ZPSO040 Réf. échantillon: MA2309159900/P091 Réf. laboratoire: 23EK074898-016 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Quantité estimée: 20 ml Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P091 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
	Continue	2		Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P091	Identifiant: ZPSO040 Réf. échantillon: MA2309159900/P091 Réf. laboratoire: 23EK074898-016 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P091	Idem photo : P091
	Continue	3	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P091	Identifiant: ZPSO040 Réf. échantillon: MA2309159900/P091 Réf. laboratoire: 23EK074898-016 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P091	Idem photo : P091
	Continue	4	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P091	Identifiant: ZPSO040 Réf. échantillon: MA2309159900/P091 Réf. laboratoire: 23EK074898-016 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P091	Idem photo : P091

	Continue	5	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P091	Identifiant: ZPSO040 Réf. échantillon: MA2309159900/P091 Réf. laboratoire: 23EK074898-016 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P091	Idem photo : P091
	Continue	6	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P091	Identifiant: ZPSO040 Réf. échantillon: MA2309159900/P091 Réf. laboratoire: 23EK074898-016 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P091	Idem photo : P091
	Continue	7	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P091	Identifiant: ZPSO040 Réf. échantillon: MA2309159900/P091 Réf. laboratoire: 23EK074898-016 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P091	Idem photo : P091
Palier; Cage 4 8ème étage - Gaine Technique	Continue	8	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P091	Identifiant: ZPSO040 Réf. échantillon: MA2309159900/P091 Réf. laboratoire: 23EK074898-016 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P091	Idem photo : P091

ZPSO049 : Conduit en fibres-ciment

Niveau : Cage 5 1er étage, Cage 5 2ème étage, Cage 5 3ème étage, Cage 5 4ème étage, Cage 5 5ème étage, Cage 5 6ème étage, Cage 5 7ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Gaine technique		1	Vide ordure	Oui Cage 5 1er étage - Gaine technique : Vide ordure	Identifiant: ZPSO049 Réf. échantillon: MA2309159900/P108 Réf. laboratoire: 23EK074898-033 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Quantité estimée: 20 ml Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P108 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
		2	Vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P108	Identifiant: ZPSO049 Réf. échantillon: MA2309159900/P108 Réf. laboratoire: 23EK074898-033 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P108	Idem photo : P108
		3	Vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P108	Identifiant: ZPSO049 Réf. échantillon: MA2309159900/P108 Réf. laboratoire: 23EK074898-033 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P108	Idem photo : P108
		4	Vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P108	Identifiant: ZPSO049 Réf. échantillon: MA2309159900/P108 Réf. laboratoire: 23EK074898-033 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P108	Idem photo : P108

		5	Vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P108	Identifiant: ZPSO049 Réf. échantillon: MA2309159900/P108 Réf. laboratoire: 23EK074898-033 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P108	Idem photo : P108
		6	Vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P108	Identifiant: ZPSO049 Réf. échantillon: MA2309159900/P108 Réf. laboratoire: 23EK074898-033 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P108	Idem photo : P108
		7	Vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P108	Identifiant: ZPSO049 Réf. échantillon: MA2309159900/P108 Réf. laboratoire: 23EK074898-033 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P108	Idem photo : P108

ZPSO057 : Conduit en fibres-ciment

Niveau : Cage 6 1er étage, Cage 6 2ème étage, Cage 6 3ème étage, Cage 6 4ème étage, Cage 6 5ème étage, Cage 6 6ème étage, Cage 6 7ème étage, Cage 6 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Gaine technique		1	Doublage cloison; vide ordure	Oui Cage 6 1er étage - Gaine technique : Doublage cloison; vide ordure	Identifiant: ZPSO057 Réf. échantillon: MA2309159900/P124 Réf. laboratoire: 23EK074898-049 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Quantité estimée: 20 ml Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P124 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
		2	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124	Identifiant: ZPSO057 Réf. échantillon: MA2309159900/P124 Réf. laboratoire: 23EK074898-049 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P124	Idem photo : P124
		3	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124	Identifiant: ZPSO057 Réf. échantillon: MA2309159900/P124 Réf. laboratoire: 23EK074898-049 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P124	Idem photo : P124
		4	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124	Identifiant: ZPSO057 Réf. échantillon: MA2309159900/P124 Réf. laboratoire: 23EK074898-049 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P124	Idem photo : P124

		5	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124	Identifiant: ZPSO057 Réf. échantillon: MA2309159900/P124 Réf. laboratoire: 23EK074898-049 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P124	Idem photo : P124
		6	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124	Identifiant: ZPSO057 Réf. échantillon: MA2309159900/P124 Réf. laboratoire: 23EK074898-049 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P124	Idem photo : P124
		7	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124	Identifiant: ZPSO057 Réf. échantillon: MA2309159900/P124 Réf. laboratoire: 23EK074898-049 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P124	Idem photo : P124
Gaine Technique		8	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124	Identifiant: ZPSO057 Réf. échantillon: MA2309159900/P124 Réf. laboratoire: 23EK074898-049 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P124	Idem photo : P124

ZPSO065 : Conduit en fibres-ciment

Niveau : Cage 7 1er étage, Cage 7 2ème étage, Cage 7 3ème étage, Cage 7 4ème étage, Cage 7 5ème étage, Cage 7 6ème étage, Cage 7 7ème étage, Cage 7 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Gaine technique		1	vide ordure	Oui Cage 7 1er étage - Gaine technique : vide ordure	Identifiant: ZPSO065 Réf. échantillon: MA2309159900/P140 Réf. laboratoire: 23EK074898-065 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Quantité estimée: 20 ml Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P140 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
		2	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P140	Identifiant: ZPSO065 Réf. échantillon: MA2309159900/P140 Réf. laboratoire: 23EK074898-065 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P140	Idem photo : P140
		3	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P140	Identifiant: ZPSO065 Réf. échantillon: MA2309159900/P140 Réf. laboratoire: 23EK074898-065 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P140	Idem photo : P140
		4	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P140	Identifiant: ZPSO065 Réf. échantillon: MA2309159900/P140 Réf. laboratoire: 23EK074898-065 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P140	Idem photo : P140

		5	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P140	Identifiant: ZPSO065 Réf. échantillon: MA2309159900/P140 Réf. laboratoire: 23EK074898-065 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P140	Idem photo : P140
		6	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P140	Identifiant: ZPSO065 Réf. échantillon: MA2309159900/P140 Réf. laboratoire: 23EK074898-065 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P140	Idem photo : P140
		7	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P140	Identifiant: ZPSO065 Réf. échantillon: MA2309159900/P140 Réf. laboratoire: 23EK074898-065 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P140	Idem photo : P140
Gaine Technique		8	vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P140	Identifiant: ZPSO065 Réf. échantillon: MA2309159900/P140 Réf. laboratoire: 23EK074898-065 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P140	Idem photo : P140

ZPSO073 : Conduit en fibres-ciment

Niveau : Cage 8 1er étage, Cage 8 2ème étage, Cage 8 3ème étage, Cage 8 4ème étage, Cage 8 5ème étage, Cage 8 6ème étage, Cage 8 7ème étage, Cage 8 8ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Gaine technique		1	Vide ordure	Oui Cage 8 1er étage - Gaine technique : Vide ordure	Identifiant: ZPSO073 Réf. échantillon: MA2309159900/P156 Réf. laboratoire: 23EK074898-081 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Quantité estimée: 20 ml Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P156 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
		2	Vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P156	Identifiant: ZPSO073 Réf. échantillon: MA2309159900/P156 Réf. laboratoire: 23EK074898-081 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P156	Idem photo : P156
		3	Vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P156	Identifiant: ZPSO073 Réf. échantillon: MA2309159900/P156 Réf. laboratoire: 23EK074898-081 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P156	Idem photo : P156
		4	Vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P156	Identifiant: ZPSO073 Réf. échantillon: MA2309159900/P156 Réf. laboratoire: 23EK074898-081 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P156	Idem photo : P156

		5	Vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P156	Identifiant: ZPSO073 Réf. échantillon: MA2309159900/P156 Réf. laboratoire: 23EK074898-081 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P156	Idem photo : P156
		6	Vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P156	Identifiant: ZPSO073 Réf. échantillon: MA2309159900/P156 Réf. laboratoire: 23EK074898-081 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P156	Idem photo : P156
		7	Vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P156	Identifiant: ZPSO073 Réf. échantillon: MA2309159900/P156 Réf. laboratoire: 23EK074898-081 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P156	Idem photo : P156
Gaine Technique		8	Vide ordure	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P156	Identifiant: ZPSO073 Réf. échantillon: MA2309159900/P156 Réf. laboratoire: 23EK074898-081 Description: Conduit en fibres-ciment Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P156	Idem photo : P156

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

7. RAPPORTS D'ANALYSES

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

ADX GROUPE
Frédéric SAGET
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-082278-01
Date d'émission de rapport : 03/10/2023 13:25

Référence dossier Client:65155966cc355Dossier: MA2309159900
Référence dossier N° : 23UV078858
Référence laboratoire N° : 23EK073017

Reçu par MyEasyLab le : 29/09/2023 18:22
Reçu par le laboratoire le : 29/09/2023
Date d'analyse : 02/10/2023

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Cage 1 rez de chaussee - Avent avant	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur (granulaire) (noir)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P002 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Cage 4 rez de chaussee - Avent avant	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur (granulaire) (noir)	MOLP / TF5L	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
002-02	P002 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Cage 4 rez de chaussee - Avent avant	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur (granulaire) (noir)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/13

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-082278-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P003 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Cage 1 rez de chaussee - Avent arriere	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur (granulaire) (jaune)	MOLP / TF5L	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
003-02	P003 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Cage 1 rez de chaussee - Avent arriere	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur (granulaire) (jaune)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P004 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Partie plane : revetement bitumineux (bandes, les) - Cage 5 rez de chaussee - Avent arriere	Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur (granulaire) (noir)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P005 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades legeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Joint de dilatation - Joint de dilatation - Facade avant	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau souple de type joint (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-01	P006 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades legeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Joint de dilatation - Joint de dilatation - Facade gauche	Matériau semi-dur (jaune) en traces ; matériau souple de type joint (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P007 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades legeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Joint de dilatation - Joint de dilatation - Facade arriere	Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau souple de type joint (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-082278-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008-01	P008 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades legeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - Joint de dilatation - Joint de dilatation - Facade droite	Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau souple de type joint (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P009 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades legeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - crepi - crepi - Facade gauche	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris)	MOLP / TF5L	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
009-02	P009 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades legeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich - crepi - crepi - Facade gauche	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01	P010 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Peinture sur beton - Peinture sur beton - Cage 1 rez de chaussee - Avent avant	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-02	P010 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Peinture sur beton - Peinture sur beton - Cage 1 rez de chaussee - Avent avant	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01	P011 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Peinture sur beton - Peinture sur beton - Cage 2 rez de chaussee - Avent arriere	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-01	P012 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Peinture sur beton - Peinture sur beton - Cage 5 rez de chaussee - Avent avant	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-082278-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013-01	P013 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Peinture sur beton - Peinture sur beton - Cage 8 rez de chaussee - Avent arriere	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET** / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-01	P014 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Peinture sur beton - Peinture sur beton - Facade avant	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-01	P015 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Peinture sur beton - Peinture sur beton - Facade gauche	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MOLP** / TF5L	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
015-02	P015 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Peinture sur beton - Peinture sur beton - Facade gauche	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-01	P016 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Peinture sur beton - Peinture sur beton - Facade arriere	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau (bitumineux) (noir) ; matériau dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET** / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-082278-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-01	P017 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Peinture sur beton - Peinture sur beton - Facade droite	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MOLP / W6PU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
017-02	P017 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Peinture sur beton - Peinture sur beton - Facade droite	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau dur (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-03	P017 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Peinture sur beton - Peinture sur beton - Facade droite	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-01	P018 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Facade avant	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-01	P019 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Facade gauche	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-01	P020 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Facade arriere	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-082278-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021-01	P021 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Facade droite	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-01	P022 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 8 5eme etage - loggia	Matériau de type système d'enduit peinture (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-02	P022 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 8 5eme etage - loggia	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-01	P023 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 4 4eme etage - loggia	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-02	P023 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 4 4eme etage - loggia	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-082278-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024-01	P024 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 2 1er etage - loggia	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-02	P024 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Cage 2 1er etage - loggia	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-01	P025 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Cage 8 5eme etage - loggia	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (noir)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026-01	P026 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Cage 4 4eme etage - loggia	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-01	P027 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Cage 2 1er etage - loggia	Matériau souple (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-01	P028 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Cage 1 rez de chaussee - Hall	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-082278-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029-01	P029 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Cage 1 rez de chaussee - Hall	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-02	P029 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Cage 1 rez de chaussee - Hall	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
029-03	P029 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Cage 1 rez de chaussee - Hall	Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
029-04	P029 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Cage 1 rez de chaussee - Hall	Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-082278-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030-01	P030 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 1 rez de chaussee - Hall	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031-01	P031 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 1 rez de chaussee - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032-01	P032 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 1 5eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033-01	P033 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 1 8eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-082278-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034-01	P034 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 1 rez de chaussee - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035-01	P035 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 1 4eme etage - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036-01	P036 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 1 7eme etage - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037-01	P037 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 1 1er etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (rose)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038-01	P038 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 1 4eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-082278-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039-01	P039 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 1 8eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040-01	P040 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 1 1er etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041-01	P041 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 1 4eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042-01	P042 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 1 8eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043-01	P043 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - Cage 1 1er etage - Gaine technique	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / Y9NI	4 / 4	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-082278-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044-01	P044 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Cage 2 rez de chaussee - Hall	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045-01	P045 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Cage 2 rez de chaussee - Hall	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
045-02	P045 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Cage 2 rez de chaussee - Hall	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045-03	P045 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Cage 2 rez de chaussee - Hall	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-082278-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046-01	P046 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 2 rez de chaussee - Hall	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET / RIG6**	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
61 analyses au laboratoire dont 51 par la technique identifiée sous le terme MET et 10 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

***MOLP**: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2*

***MET**: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8*

Notes :
1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Margarida Barbosa

Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

ADX GROUPE
Frédéric SAGET
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-083776-01
Date d'émission de rapport : 10/10/2023 15:58

Référence dossier Client:651bc99e9b6e5Dossier: MA2309159900
Référence dossier N° : 23UV080762
Référence laboratoire N° : 23EK074490

Reçu par MyEasyLab le : 06/10/2023 18:11
Reçu par le laboratoire le : 06/10/2023
Date d'analyse : 09/10/2023

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P047 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 2 rez de chaussee - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P048 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 2 4eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-083776-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P049 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 2 8eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P050 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 2 rez de chaussee - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P051 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 2 4eme etage - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-01	P052 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 2 7eme etage - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P053 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 2 1er etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-083776-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008-01	P054 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 2 4eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P055 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 2 6eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01 (1) (2)	P056 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 2 1er etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01	P057 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 2 4eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-01	P058 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 2 8eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-01	P059 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - Cage 3 rez de chaussee - Hall	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / H43E	4 / 4	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-083776-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-01	P060 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Cage 3 rez de chaussee - Hall	Matériau dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-01	P061 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Cage 3 rez de chaussee - Hall	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / H43E	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
015-02	P061 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Cage 3 rez de chaussee - Hall	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / TC2Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-03	P061 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Cage 3 rez de chaussee - Hall	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / H43E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-083776-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-01	P062 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 3 rez de chaussee - Hall	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-01	P063 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 3 1er etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-01	P064 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 3 4eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-01	P065 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 3 8eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-083776-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020-01	P066 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 3 1er etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-01	P067 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 3 4eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-01	P068 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 3 8eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-01	P069 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 3 rez de chaussee - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-01	P070 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 3 4eme etage - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-083776-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025-01	P071 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 3 7eme etage - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / RIG6	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026-01	P072 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 3 3eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-01	P073 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 3 4eme etage - Cage d''escalier	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-01	P074 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 3 8eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-01	P075 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - Cage 3 1er etage - Gaine technique	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / H43E	4 / 4	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
31 analyses au laboratoire dont 27 par la technique identifiée sous le terme MET et 4 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-083776-01

	Observation(s) échantillon(s)
(1)	L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
(2)	Un matériau semi-dur (marron) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

***MOLP**: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2*

***MET**: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8*

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Margarida Barbosa

Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

ADX GROUPE
Frédéric SAGET
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-084013-01
Date d'émission de rapport : 11/10/2023 5:25

Référence dossier Client:651c465cf4015Dossier: MA2309159900
Référence dossier N° : 23UV081131
Référence laboratoire N° : 23EK074898

Reçu par MyEasyLab le : 09/10/2023 18:24
Reçu par le laboratoire le : 09/10/2023
Date d'analyse : 10/10/2023

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P076 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Cage 4 rez de chaussee - Hall	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P077 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Cage 4 rez de chaussee - Hall	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / M7EZ	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
002-02	P077 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Cage 4 rez de chaussee - Hall	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-084013-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P078 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 4 rez de chaussee - Hall	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-02	P078 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 4 rez de chaussee - Hall	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P079 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 4 1er etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P080 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 4 4eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-084013-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01	P081 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 4 8eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P082 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1 : Colle de carrelage Couche2 : Joint de carrelage - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 4 7eme etage - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (gris)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01	P083 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 4 4eme etage - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P084 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 4 7eme etage - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (gris)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01	P085 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 4 1er etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau (gris)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-084013-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-01	P086 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 4 4eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-01	P087 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 4 8eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-01	P088 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 4 1er etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-02	P088 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 4 1er etage - Palier	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-01	P089 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 4 4eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur (beige)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-01	P090 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 4 8eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / DSNW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-084013-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-01	P091 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - Cage 4 1er etage - Palier	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / M7EZ	4 / 4	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
017-01	P092 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 4 rez de chaussee - Local poubelle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-01	P093 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds + 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Cage 5 rez de chaussee - Hall	Matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-02	P093 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds + 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Cage 5 rez de chaussee - Hall	Matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-084013-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019-01	P094 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols + 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Cage 5 rez de chaussee - Hall	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	**MOLP** / AR5A	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
019-02	P094 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols + 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Cage 5 rez de chaussee - Hall	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	**MET** / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-01	P095 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1:Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 5 rez de chaussee - Cage d''escalier	Matériau dur (beige) ; matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-084013-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021-01	P096 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 5 1er etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-01	P097 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 5 4eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-01	P098 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 5 8eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-01	P099 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 5 rez de chaussee - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-084013-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025-01	P100 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 5 4eme etage - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026-01	P101 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 5 7eme etage - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-01	P102 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 5 1er etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-01	P103 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 5 4eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-01	P104 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 5 8eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris) en traces	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-084013-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030-01	P105 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 5 1er etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031-01	P106 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 5 4eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032-01	P107 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 5 8eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033-01	P108 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - Cage 5 1er etage - Gaine technique	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / AR5A	4 / 4	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
034-01	P109 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Cage 6 rez de chaussee - Hall	Matériau dur (beige)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-084013-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035-01	P110 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Cage 6 rez de chaussee - Hall	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / AR5A	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
035-02	P110 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Cage 6 rez de chaussee - Hall	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036-01	P111 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 6 rez de chaussee - Hall	Matériau dur (gris) ; matériau dur (granulaire) (beige)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037-01 (1)	P112 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 6 1er etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-084013-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038-01	P113 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 6 4eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039-01	P114 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 6 8eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040-01	P115 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 6 rez de chaussee - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (gris) en traces	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041-01	P116 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 6 4eme etage - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-084013-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042-01	P117 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 6 7eme etage - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043-01	P118 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 6 1er etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044-01	P119 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 6 4eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045-01	P120 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 6 8eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046-01	P121 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 6 1er etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-084013-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047-01	P122 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 6 4eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur (gris)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048-01	P123 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 6 8eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049-01	P124 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - Cage 6 1er etage - Gaine technique	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / TA2A	4 / 4	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
050-01	P125 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Cage 7 rez de chaussee - Hall	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-084013-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051-01	P126 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Cage 7 rez de chaussee - Hall	Matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051-02	P126 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Cage 7 rez de chaussee - Hall	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
052-01	P127 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 7 rez de chaussee - Hall	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052-02	P127 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 7 rez de chaussee - Hall	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-084013-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
053-01	P128 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 7 1er etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054-01	P129 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 7 4eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055-01	P130 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 7 8eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056-01	P131 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 7 rez de chaussee - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-084013-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
057-01	P132 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 7 4eme etage - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058-01	P133 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 7 7eme etage - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059-01	P134 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 7 1er etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060-01	P135 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 7 4eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061-01	P136 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 7 8eme etage - Palier	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-084013-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062-01	P137 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 7 1er etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063-01	P138 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 7 4eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064-01	P139 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 7 8eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065-01	P140 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - Cage 7 1er etage - Gaine technique	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / TA2A	4 / 4	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
066-01	P141 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Couche1: Colle de faience + Couche2: joint de faience - Cage 8 rez de chaussee - Hall	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-084013-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067-01	P142 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Cage 8 rez de chaussee - Hall	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
067-02	P142 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Cage 8 rez de chaussee - Hall	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067-03	P142 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot - Cage 8 rez de chaussee - Hall	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / TA2A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
068-01	P143 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 8 rez de chaussee - Hall	Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-084013-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069-01	P144 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 8 1er etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070-01	P145 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 8 4eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071-01	P146 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Enduit a base de platre + Couche3: Enduit a base de ciment - Cage 8 8eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072-01	P147 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 8 rez de chaussee - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-084013-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
073-01	P148 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 8 4eme etage - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074-01	P149 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 8 7eme etage - Cage d''escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075-01	P150 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 8 1er etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076-01	P151 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 8 4eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077-01	P152 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Couche1: Peinture decorative + Couche2: Couche1: Enduit a base de platre - Cage 8 8eme etage - Palier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

a reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-084013-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
078-01	P153 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 8 1er etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079-01	P154 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 8 4eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080-01	P155 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revetements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage - Cage 8 8eme etage - Palier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081-01	P156 - 6 - Conduits et accessoires interieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumee, echappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - Cage 8 1er etage - Gaine technique	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / K8PF	4 / 4	-	⚠ Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
91 analyses au laboratoire dont 80 par la technique identifiée sous le terme MET et 11 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)	
(1)	Echantillon mouillé.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

***MOLP**: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2*

***MET**: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8*

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-084013-01

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Ricardo Gonçalves
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

22/22

8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION

Votre Assurance

▸ RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

ATTESTATION

COURTIER

CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Tél : 01 40 68 02 02
Fax : 01 40 68 05 00
Email : CONTACT@CNASSUR.COM
Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604
Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE (Marque Allo Diagnostic) et ADX Formation
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1ère ligne n°3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2ème ligne n°3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR

Repérage de polluants:
AMIANTE :

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante

• Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
• Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
• Sapiteur Amiante
• Mesures d'empoussièrement amiante
• Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:
• Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les males matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
• Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:
• Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
• Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
• Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
• Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
• Recherche des métaux lourds
• Diagnostic de pollution des sols
• L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
• Recherche de Radon N1 et N2

Contrôle du bâti:
• Diagnostique Technique Globale (DTG)
• Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
• Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
• Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
• Plan pluriannuel de travaux (PPT)
• Diagnostic accessibilité handicapés
• Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
• Audit de la partie privative en assainissement collectif
• Diagnostic sécurité piscine

Energetique:
• Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment.
Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
• Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
• Vérification de la VMC
• Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)

Eau:

• Actes de prélèvement légionnelle

• Portabilité de l'eau

Mesurage:

• Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.

• Mesurages en extérieurs et intérieurs

• Mission de topographie et numérisation 3D

• Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

• Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice

• Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels

• Pose de détecteurs incendie

• Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

• Formation aux métiers du diagnostic

• Formation aux risques amiante, plomb

• Formation aux risques électrique

• Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

• Etat des lieux locatifs

• Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier

• Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)

• Audit de pré acquisition

• Dossier de mutation

Garanties au contrat 1ère Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2ème Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	**9.000.000** € par année d'assurance et par sinistre
Dont : **Dommages corporels** **Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus**	**9.000.000** € par année d'assurance et par sinistre **1.200.000** € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus	**750.000** € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle **(tous dommages confondus)**	**par expert** **300.000 €** par sinistre et **500.000** € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	**150.000** € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	**30.000** € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance
Dont :
- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Les garanties s'exercent à concurrence des montants figurants ci-dessous de la présente.
Sa validité cesse pour les risques situés à l'Etranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2023 au 01/01/2024 inclus,** sous réserve du paiement des primes 2021 et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à NANTERRE, le 28 Février 2023
Pour la Société :

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3492 Version 007

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur SAGET Frédéric

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 28/04/2022 - Date d'expiration : 27/04/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 28/04/2022 - Date d'expiration : 27/04/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 08/09/2022 - Date d'expiration : 07/09/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 30/03/2023 - Date d'expiration : 29/03/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 30/03/2023 - Date d'expiration : 29/03/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 04/04/2023.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

cofrac CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire
